



路線計画図

駅舎イメージ図




松生町駅



瓜生堂駅

工事発注状況

R6.10.1現在

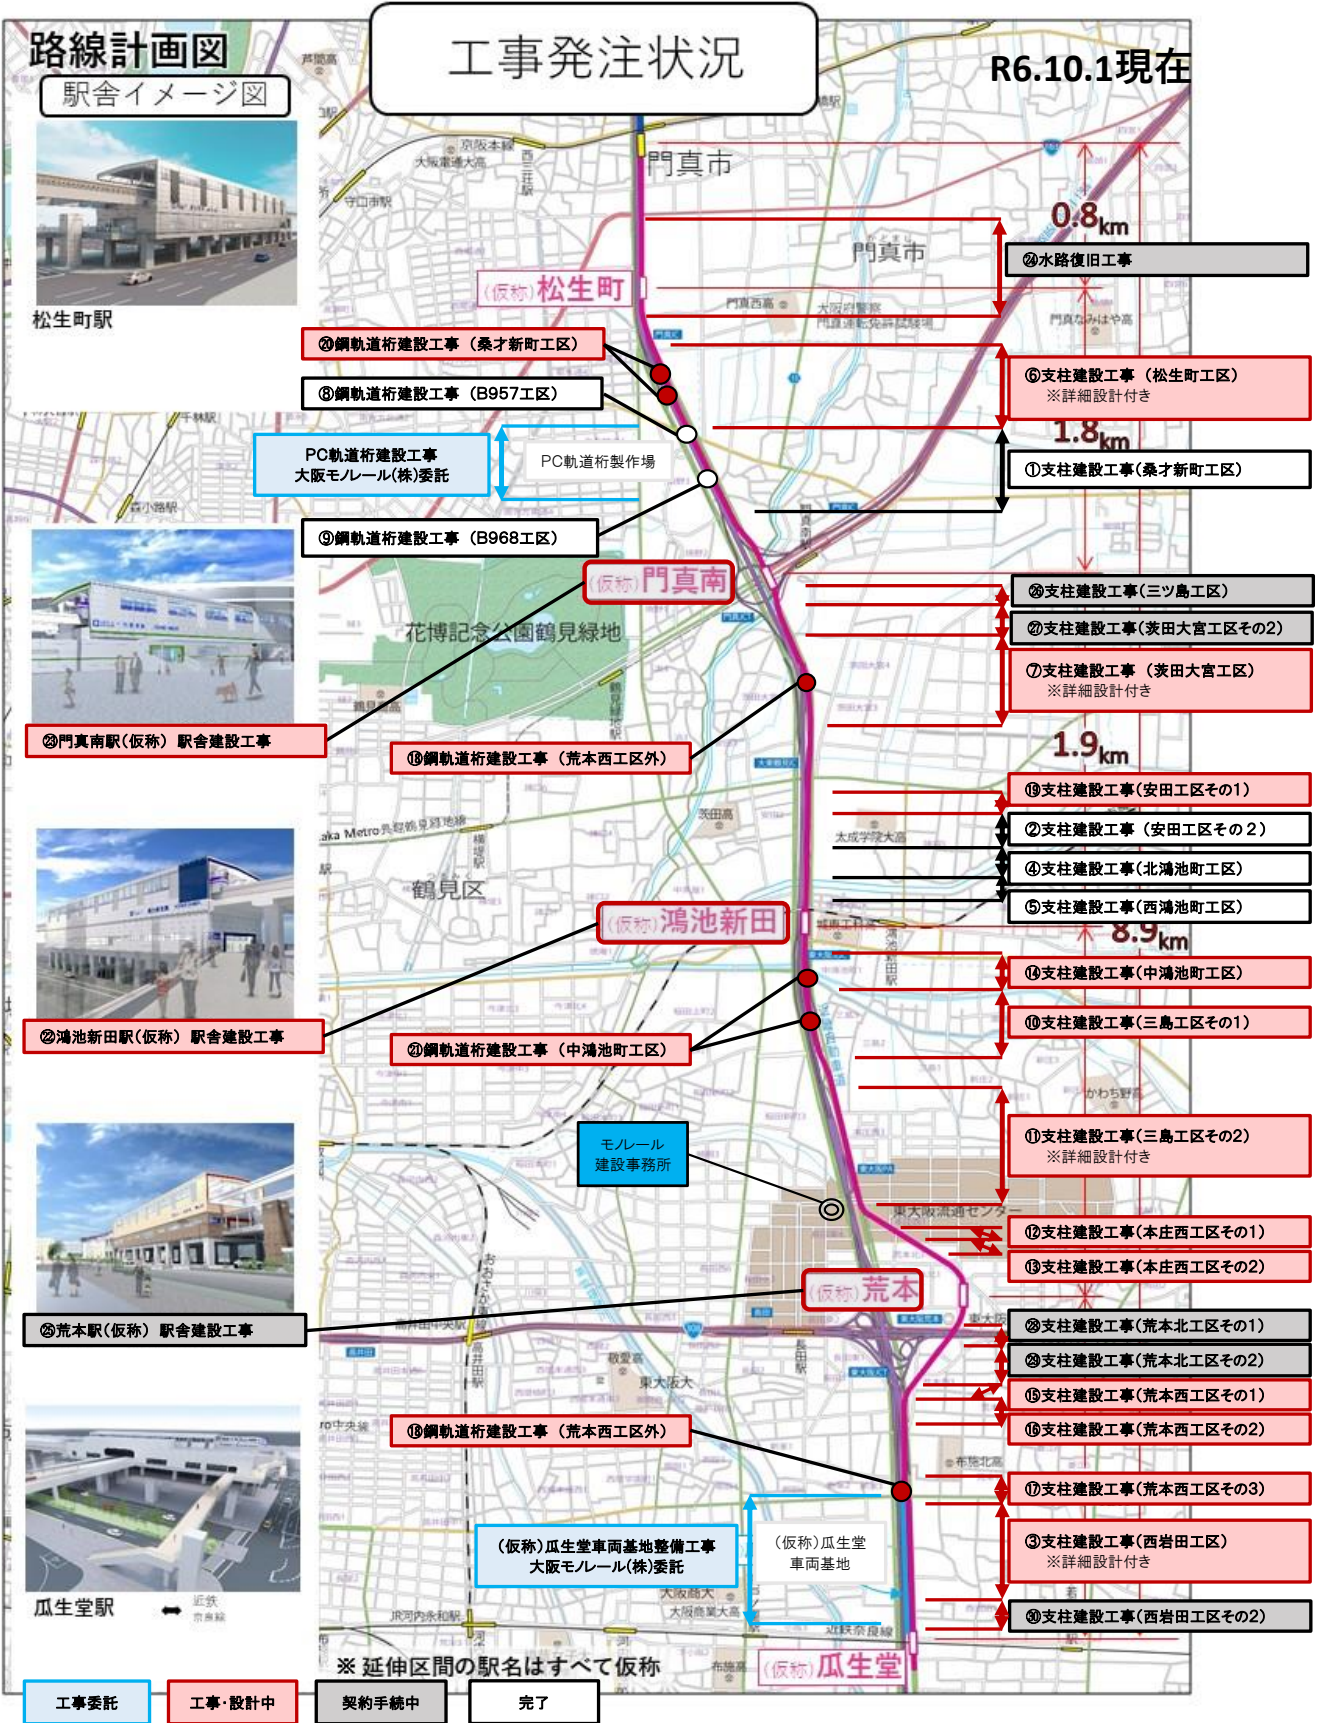

- 工事委託
- 工事・設計中
- 契約手続中
- 完了

工事中

- ③ 青木あすなろ・協和興業種間特定JV R3.3.25~R8.12.15
- ⑥ 森本組・新土木開発JV R3.10.12~R8.2.27
- ⑦ 大日本土木・全日本コンサルタントJV R3.10.12~R7.1.31
- ⑩ (株)森組大阪本店 R4.12.21~R7.11.28
- ⑪ 東洋建設・修成建設コンサルタントJV R4.12.21~R8.1.20
- ⑫ (株)岸本建設大阪営業所 R4.12.21~R7.1.31

- ⑬ ヤマト工業(株) R4.12.21~R6.11.29
- ⑭ (株)森組大阪本店 R5.3.20~R7.10.31
- ⑮ 鉄建建設(株)大阪支店 R5.3.20~R8.1.30
- ⑯ (株)森組大阪本店 R5.3.20~R8.2.27
- ⑰ (株)ハンソン建設 R5.3.20~R7.2.28
- ⑱ (株)駒井ハルテック R5.3.20~R7.9.30

- ⑲ 中林建設(株) R5.12.18~R7.8.29
- ⑳ 宮地エンジニアリング(株)大阪支社 R6.3.25~R8.9.30
- ㉑ 川田工業(株)大阪支社 R6.3.25~R8.9.30
- ㉒ 鉄建・岩田地崎共同企業体 R6.3.25~R10.2.29
- ㉓ (株)大林組 R6.6.17~R10.6.30

工事完了

- ① 奥村組土木興業(株) R2.12~R6.4
- ② (株)ハンソン建設 R2.12~R4.10
- ④ (株)五大コーポレーション大阪支店 R3.7~R5.2
- ⑤ 中林建設(株) R3.7~R5.12
- ⑧ 川田工業(株) R3.12~R6.6
- ⑨ 瀬上工業(株) R3.12~R6.2

※ 延伸区間の駅名はすべて仮称

路線計画図

詳細設計発注状況

R6.10.1現在

- 完了**
- ② 八千代エンジニアリング㈱
R2.9.9 ~ R5.2.28
 - ③ ㈱一ニチコンサルタント
R1.6.5 ~ R2.11.30
 - ⑤ パシフィックコンサルタンツ㈱
R3.3.12 ~ R5.3.15
 - ⑥ ㈱エイト日本技術開発
R3.6.14 ~ R6.2.28
 - ④ ㈱復建技術コンサルタント
R2.9.17 ~ R6.2.28
 - ⑧ 復建調査設計㈱
R1.11.6 ~ R3.2.26
 - ⑨ 中央復建コンサルタント㈱
R3.3.22 ~ R5.3.15
 - ⑩ 中央復建コンサルタント㈱
R2.9.15 ~ R4.8.16
 - ⑪ セントラルコンサルタント㈱
R2.9.14 ~ R4.2.28
 - ⑫ ㈱一ニチコンサルタント
R3.6.11 ~ R5.2.28
 - ⑬ 復建調査設計㈱
R3.6.8 ~ R5.2.28
 - ⑭ ㈱一ニチコンサルタント
R1.11.12 ~ R4.2.28
 - ⑮ ㈱エイト日本技術開発
R2.9.23 ~ R5.2.28
 - ⑯ セントラルコンサルタント㈱
R2.9.14 ~ R4.2.28
 - ⑰ ㈱復建技術コンサルタント
R2.7.27 ~ R5.2.28
 - ⑱ 協和設計㈱
R2.7.28 ~ R5.2.28
 - ⑲ セントラルコンサルタント㈱
R3.6.11 ~ R5.2.28
 - ⑳ 復建調査設計㈱
R2.7.29 ~ R4.2.28
 - ㉑ パシフィックコンサルタンツ㈱
R2.7.27 ~ R4.2.28
 - ㉒ ㈱復建技術コンサルタント
R3.6.7 ~ R5.2.28
 - ㉓ 中央復建コンサルタント㈱
R3.8.6 ~ R5.2.28

- 設計中**
- ① ㈱一ニチコンサルタント
R2.8.4 ~ R7.2.26
 - ⑦ ㈱復建技術コンサルタント
R2.9.17 ~ R7.2.26
 - ⑮ ㈱建設技術研究所
R3.3.22 ~ R6.12.11
 - ⑳ ジェアール西日本コンサルタンツ㈱
R4.6.24 ~ R7.2.26
 - ㉑ 中央復建コンサルタント㈱
R4.6.17 ~ R7.2.26
 - ㉒ ㈱復建技術コンサルタント
R4.6.27 ~ R7.1.29
 - ㉓ パシフィックコンサルタンツ㈱
R4.10.12 ~ R7.2.26
 - ㉔ 八千代エンジニアリング㈱
R4.10.20 ~ R7.2.26

完了 設計中 OMC委託中

