


【工区割図】

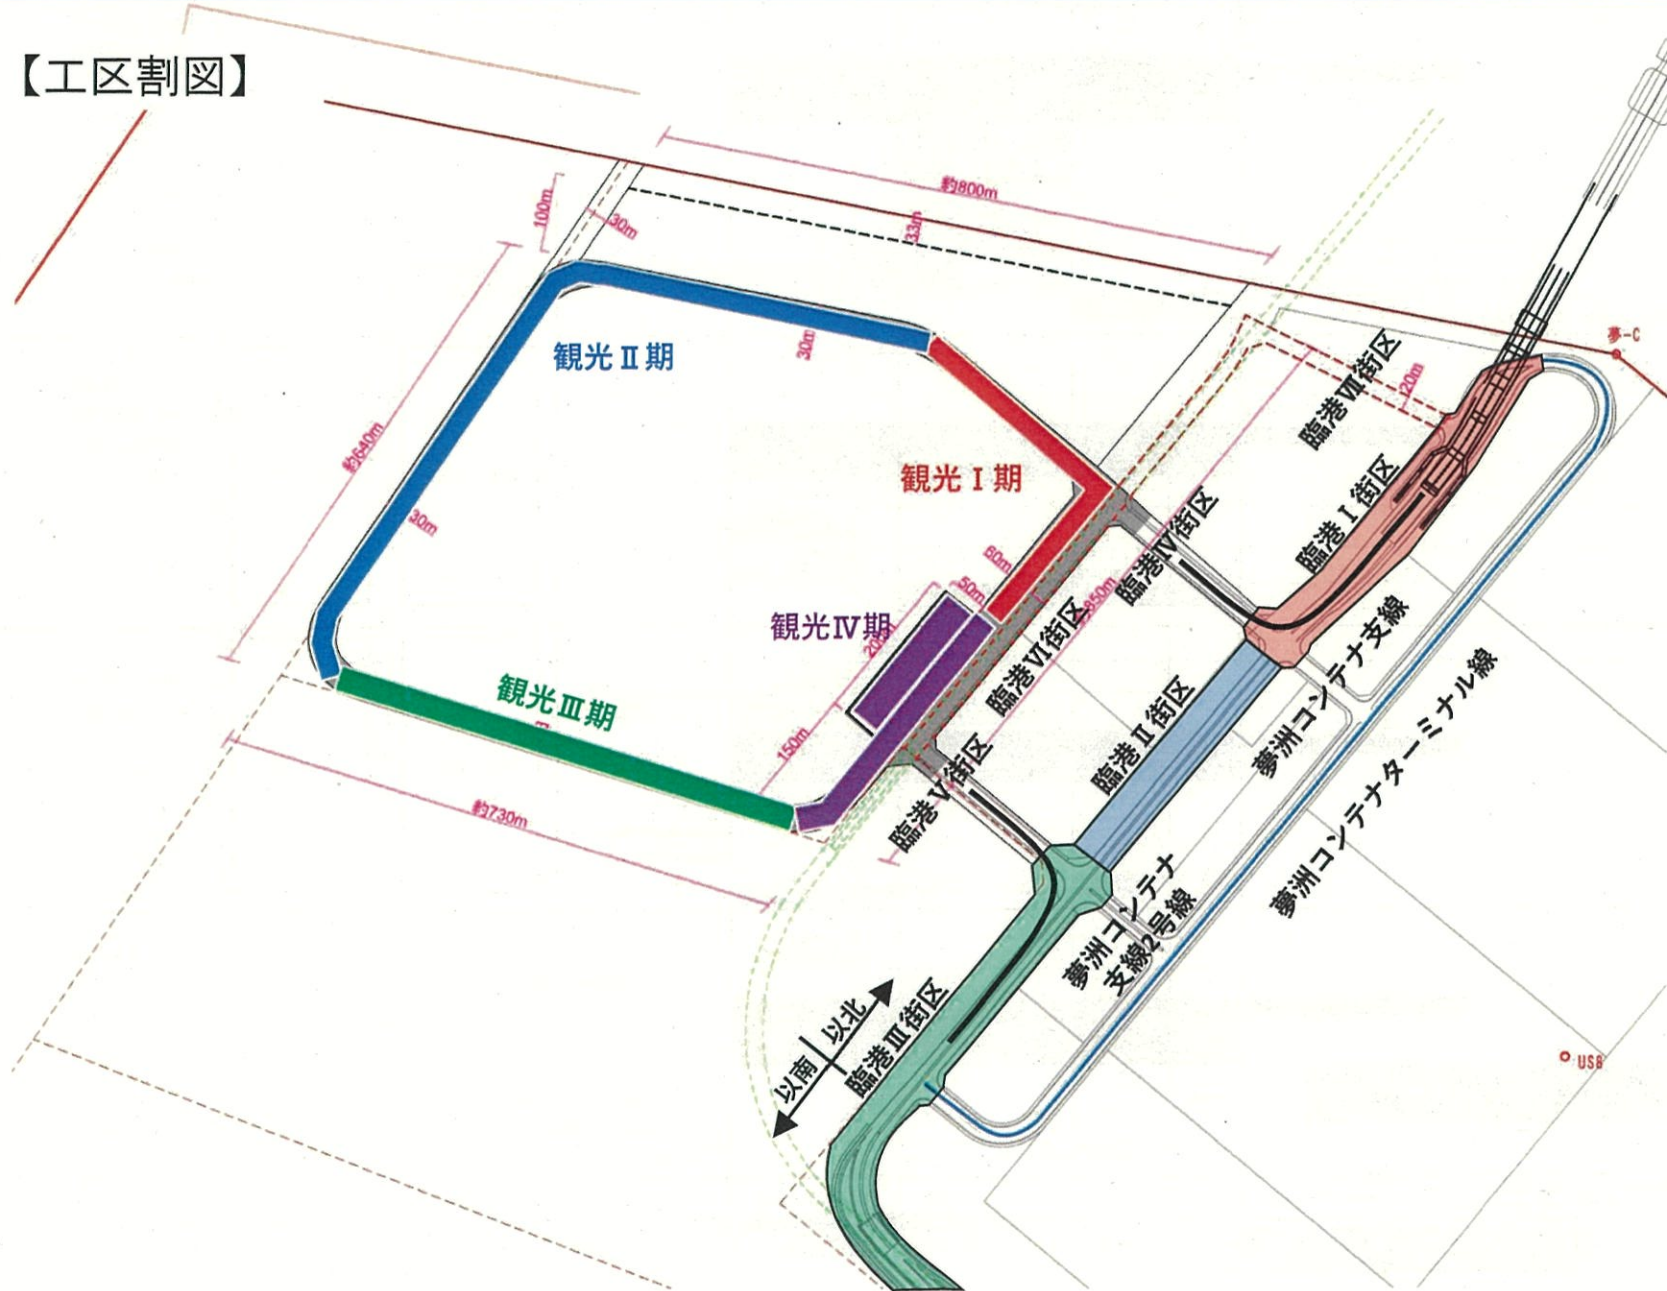

夢洲関連インフラ整備事業の計画変更について

Confidential
事業調整会議関係者限り

凡例：歩道部 自転車道部 車道部 万博会場等への引込工事

工区		年度		2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
観光Ⅰ期 (北・東)	道路					基層まで施工			表層	; 破線：変更前(第6回)夢洲等まちづくり事業調整会議 実線：変更後(第7回)夢洲等まちづくり事業調整会議
	下水(汚水)								歩道舗装・道路付属物等	
	下水(雨水)									
	水道									
	NTT (MH)									
	NTT (HH)									
	関電送配電(特高)									
	関電送配電(高低)									
	ガス									
観光Ⅱ期 (北・西)	道路						基層まで施工		歩道舗装・道路付属物等	; 破線：変更前(第6回)夢洲等まちづくり事業調整会議 実線：変更後(第7回)夢洲等まちづくり事業調整会議
	下水(汚水)									
	下水(雨水)									
	水道									
	NTT (MH)									
	NTT (HH)									
	関電送配電(特高)									
	関電送配電(高低)									
	ガス									
観光Ⅲ期 (南) (万博敷地側)	道路									; 破線：変更前(第6回)夢洲等まちづくり事業調整会議 実線：変更後(第7回)夢洲等まちづくり事業調整会議
	下水(汚水)								車道・歩道・道路付属物等	
	下水(雨水)									
	水道									
	NTT (MH)									
	NTT (HH)									
	関電送配電(特高)									
	関電送配電(高低)									
	ガス									
観光Ⅳ期 (東) (駅前交通広場前)	道路									; 破線：変更前(第6回)夢洲等まちづくり事業調整会議 実線：変更後(第7回)夢洲等まちづくり事業調整会議
	駅舎部									
	地下横断道路									
	下水(汚水)									
	下水(雨水)									
	水道									
	NTT (MH)									
	NTT (HH)									
	関電送配電(特高)									
関電送配電(高低)										
ガス										

※埋設工事完了後、道路工事を着手していく予定(令和5年度含む)

本体躯体：令和6年3月完了予定(道路内は、7月末予定)
北西出入口：令和5年11月末完了予定
南西出入口(本体構造と一体部)：令和5年7月末完了予定

整備計画なし

整備計画なし

夢洲関連インフラ整備事業の計画変更について

Confidential
事業調整会議関係者限り

凡例：歩道部 ■■■■■ 自転車道部 ■■■■■ 車道部 ■■■■■ 万博会場等への引込工事 ◀-----▶

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
臨港I街区 夢洲中央幹線:北側(夢舞大橋側)	道路						本復旧	
	高架橋							
	下水(汚水)					下部工事		
	下水(雨水)					上部工事		
	水道							
	NTT (MH)							
	NTT (HH)							
	関電送配電(特高)							
	関電送配電(高低)							
	ガス							支障移設
自治体管路								
電柱撤去・移設								
臨港II街区 夢洲中央幹線:中央	道路						歩道舗装 本復旧	歩道は基本西側のみ施工
	下水(汚水)							
	下水(雨水)							
	水道							
	NTT (MH)							
	NTT (HH)							
	関電送配電(特高)							
	関電送配電(高低)							
	ガス							
	自治体管路							
電柱撤去・移設								
臨港III街区 以北 夢洲中央幹線:南側 夢咲トンネル側	道路						歩道舗装 本復旧	歩道は、基本西側のみ施工
	高架橋							
	下水(汚水)							
	下水(雨水)							大阪港湾局施工
	水道							
	NTT (MH)							
	関電送配電(特高)							
自治体管路								
電柱撤去・移設								
臨港III街区 以南 夢洲中央幹線:南側 夢咲トンネル側	道路							
	下水(汚水)							
	下水(雨水)							大阪港湾局施工
	水道							
	NTT (MH)							
	関電送配電(特高)							
	自治体管路							
電柱撤去・移設								

夢洲関連インフラ整備事業の計画変更について

Confidential
事業調整会議関係者限り

凡例：歩道部 自転車道部 車道部 万博会場等への引込工事

工区	年度	2019年度 (R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)	2024年度 (R6)	備考
臨港IV街区 夢洲2号線 山九・上組 北側 夢洲北高架道路下	道路				下部工事		歩道舗装 本復旧	待機場整備し、物流対策が完了後着手
	高架橋							
	下水(汚水)							
	下水(雨水)							下部工(擁壁含む)に近接する為、下部工完了後、工事着手：大阪港湾局施工
	水道							
	NTT (MH)							
	NTT (HH)							
	関電送配電(特高)							
	関電送配電(高低)							
	ガス							
	自治体管路							
	港湾局(切土工事)							
	電柱撤去・移設							
臨港V街区 夢洲1号線 山九・上組 南側 夢洲南高架道路下	道路				下部工事		歩道舗装 本復旧	待機場整備し、物流対策が完了後着手
	高架橋							
	下水(汚水)							
	下水(雨水)							下部工(擁壁含む)に近接する為、下部工完了後、工事着手：大阪港湾局施工
	水道(既設移設)							支障移設
	水道(新設)							
	NTT (MH)							
	NTT (HH)							
	関電送配電(特高)							
	関電送配電(高低)							
	自治体管路							
	ガス							
	港湾局(切土工事)							
電柱撤去・移設								
臨港VI街区 夢洲中央線 山九・上組 西側 観光外周道路側	道路							
	鉄道							
	下水(汚水)							
	下水(雨水)							鉄道事業者：現状復旧
	水道							
	NTT (MH)							
	NTT (HH)							
	関電送配電(特高)							整備計画なし
	関電送配電(高低)							
	自治体管路							鉄道工事に影響のない区間 鉄道工事と並行して整備予定
ガス							整備計画なし	
電柱撤去・移設								
