

令和 7 年度森林等環境整備事業（府民も利用する 森林管理施設の安全対策事業）の実施状況及び令和 7 年度実績に係る評価について

令和 8 年 7 月

大阪府 環境農林水産部 みどり推進室

府民も利用する森林管理施設の安全対策事業

【目的】

府民も利用する自然公園内の管理道等の森林管理施設を改修し、安全性を確保する。

【事業概要】

- ・事業対象 : 崩壊等の危険性の高い歩道・管理道や構造上の損傷・著しく劣化しているトイレ
- ・事業箇所数 : 40箇所
※ 選定にあたっては、施設の一斉点検の結果から、森林管理上必要で崩壊の可能性があるなど危険性の高い箇所をリストアップ
- ・事業内容 : 歩道等の改良 : 降雨等による路面洗堀や路肩崩壊により、土砂流出が顕在化し被害拡大の恐れがある箇所

落石対策 : 歩道・管理道沿いの斜面において、亀裂の入った不安定な巨石や浮石等、落石の恐れのある箇所

トイレ等改修 : 梁柱にひび割れが発生するなど構造上の損傷があり、また浄化槽等の設備機能が著しく低下した施設
- ・事業の工程 : 初年度～ 現地踏査、地権者調査・施工同意、設計委託
一部工事着手



落石防止対策



歩道の安全対策

【事業計画】

(単位：千円)

	全体計画		R6		R7		R8		R9～	
	箇所数	事業費	箇所数	事業費	箇所数	事業費	箇所数	事業費	箇所数	事業費
	40	1,540,400	13	231,400	16	271,300	18	369,500	30	668,200
(新規着手数)			(13)		(7)		(10)		(10)	

【歩道改良 予定箇所】



歩道の路肩が崩壊して通行が危険な状況

【落石対策 予定箇所】



歩道斜面沿いに落石の恐れがある危険な状況


【トイレ改修 予定箇所】



トイレの柱下部が老朽化により腐朽しており、構造上に損傷がある状況

【 全体計画及び実績 】


番号	地区名	施設名	工種	スケジュール 当初 R8.5現在					備考
				R6	R7	R8	R9	R10	
①	箕面市鉢伏山地区	管理棟トイレ	トイレ						R7実施設計
②	箕面市箕面地区ほか	環状自然歩道	歩道						完了
③	茨木市車作地区ほか	環状自然歩道	歩道						
④	高槻市原地区ほか	環状自然歩道	歩道						完了
⑤	島本町広瀬地区ほか	東海自然歩道	歩道						
⑥	島本町大沢地区	大沢トイレ	トイレ						
⑦	交野市私部地区ほか	案内所横トイレ	トイレ						
⑧		キャンプ場横トイレ	トイレ						R7実施設計
⑨		環状自然歩道	歩道						
⑩	交野市星田地区	ほしだ園地	歩道						
⑪		環状自然歩道	落石						
⑫		環状自然歩道	歩道						
⑬	四條畷市逢阪地区	水辺自然園入口トイレ	トイレ						R7実施設計
⑭		むろいけ園地	歩道						
⑮		むろいけ園地	落石						完了
⑯		環状自然歩道	歩道						
⑰	東大阪市上四条町地区	ぼくらの広場トイレ	トイレ						完了（R7→R8繰越）
⑱	東大阪市客坊町地区	らくらくセンターハウストイレ	トイレ						
⑲	八尾市神立地区	みずのみトイレ	トイレ						
⑳	東大阪市山手町地区ほか	環状自然歩道	落石						
㉑		ぬかた園地	歩道						
㉒		くさか園地	歩道						
㉓	河内長野市加賀田地区	岩湧の森	歩道・落石						
㉔		四季彩館トイレ	トイレ						完了（R7→R8繰越）
㉕	千早赤阪村水分地区	ダイヤモンドトレール支線	歩道・落石						
㉖	河内長野市天見地区ほか	ダイヤモンドトレール	歩道						完了
㉗	河内長野市滝畑地区ほか	ダイヤモンドトレール	歩道						
㉘	河南町上河内地区	青崩トイレ	トイレ						R7実施設計
㉙	太子町山田地区	二上山万葉の森駐車場トイレ	トイレ						
㉚	泉佐野市犬鳴地区ほか	犬鳴トイレ	トイレ						完了（R7→R8繰越）
㉛		近畿自然歩道	歩道						
㉜	貝塚市蕎原地区ほか	蕎原トイレ	トイレ						R7実施設計
㉝		近畿自然歩道	歩道						
㉞	泉南市信達楠畑地区ほか	近畿自然歩道	歩道						
㉟	和泉葛城山地区	森林管理作業小屋	トイレ						
㊱		近畿自然歩道	歩道						
㊲	泉佐野市日根野地区ほか	近畿自然歩道	歩道						完了
㊳	阪南市桑畑地区ほか	近畿自然歩道	歩道						
㊴	和泉市槇尾山地区ほか	槇尾山トイレ	トイレ						
㊵		近畿自然歩道	歩道						完了

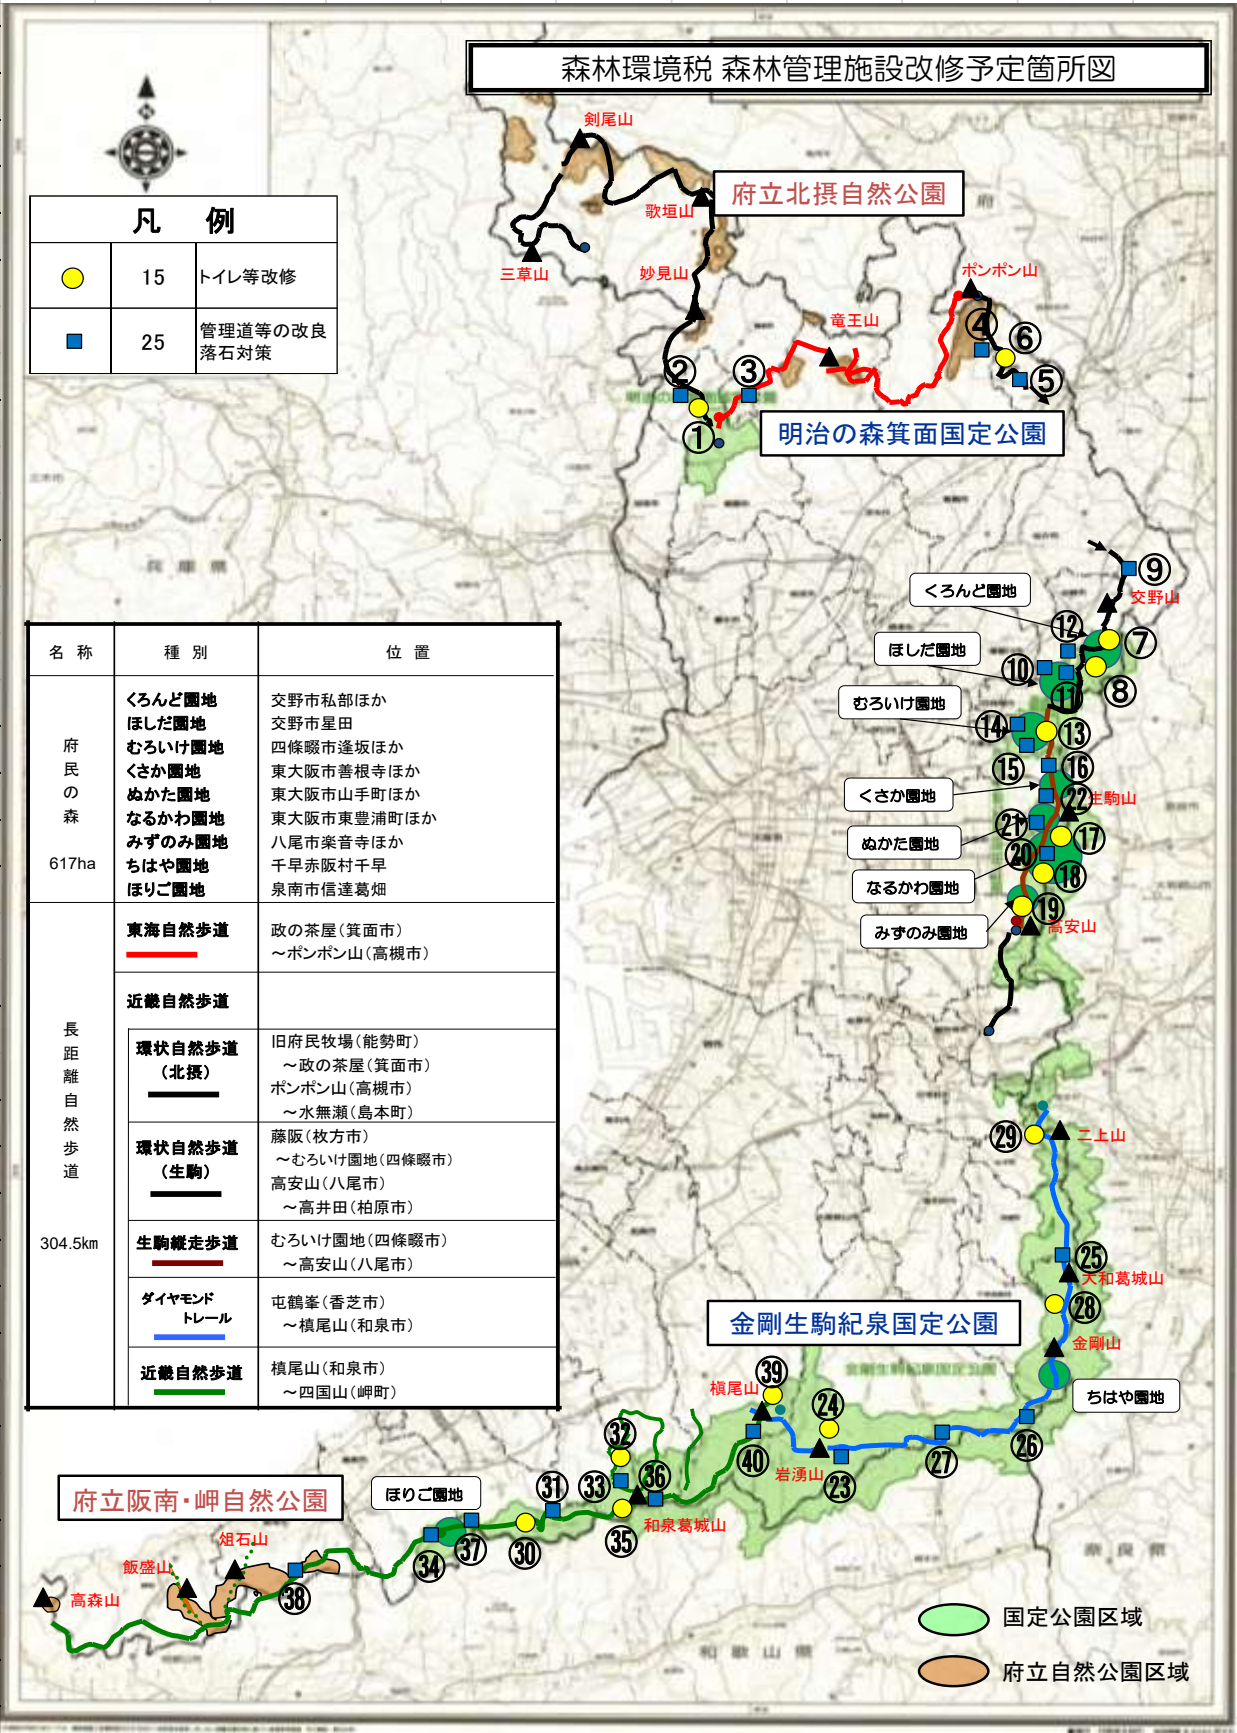

【 令和 7 年度事業 実施箇所 】

計画 実施

番号	地区名	施設名	工種	スケジュール		備考
				R6	R7	
①	箕面市鉢伏山地区	管理棟トイレ	トイレ			R7実施設計
②	箕面市箕面地区ほか	環状自然歩道	歩道			完了
⑧	交野市私部地区ほか	キャンプ場横トイレ	トイレ			R7実施設計
⑪	交野市星田地区	環状自然歩道	落石			
⑬	四條畷市逢阪地区	水辺自然園入口トイレ	トイレ			R7実施設計
⑮	四條畷市逢阪地区	むろいけ園地	落石			完了
⑰	東大阪市上四条町地区	ぼくらの広場トイレ	トイレ			完了（R7→R8繰越）
⑳	河内長野市加賀田地区	四季彩館トイレ	トイレ			完了（R7→R8繰越）
㉒	河内長野市天見地区ほか	ダイヤモンドトレール	歩道			完了
㉔	河南町上河内地区	青崩トイレ	トイレ			R7実施設計
㉖	泉佐野市犬鳴地区ほか	犬鳴トイレ	トイレ			完了（R7→R8繰越）
㉘	貝塚市蕎原地区ほか	蕎原トイレ	トイレ			R7実施設計
㉚	泉佐野市日根野地区ほか	近畿自然歩道	歩道			完了

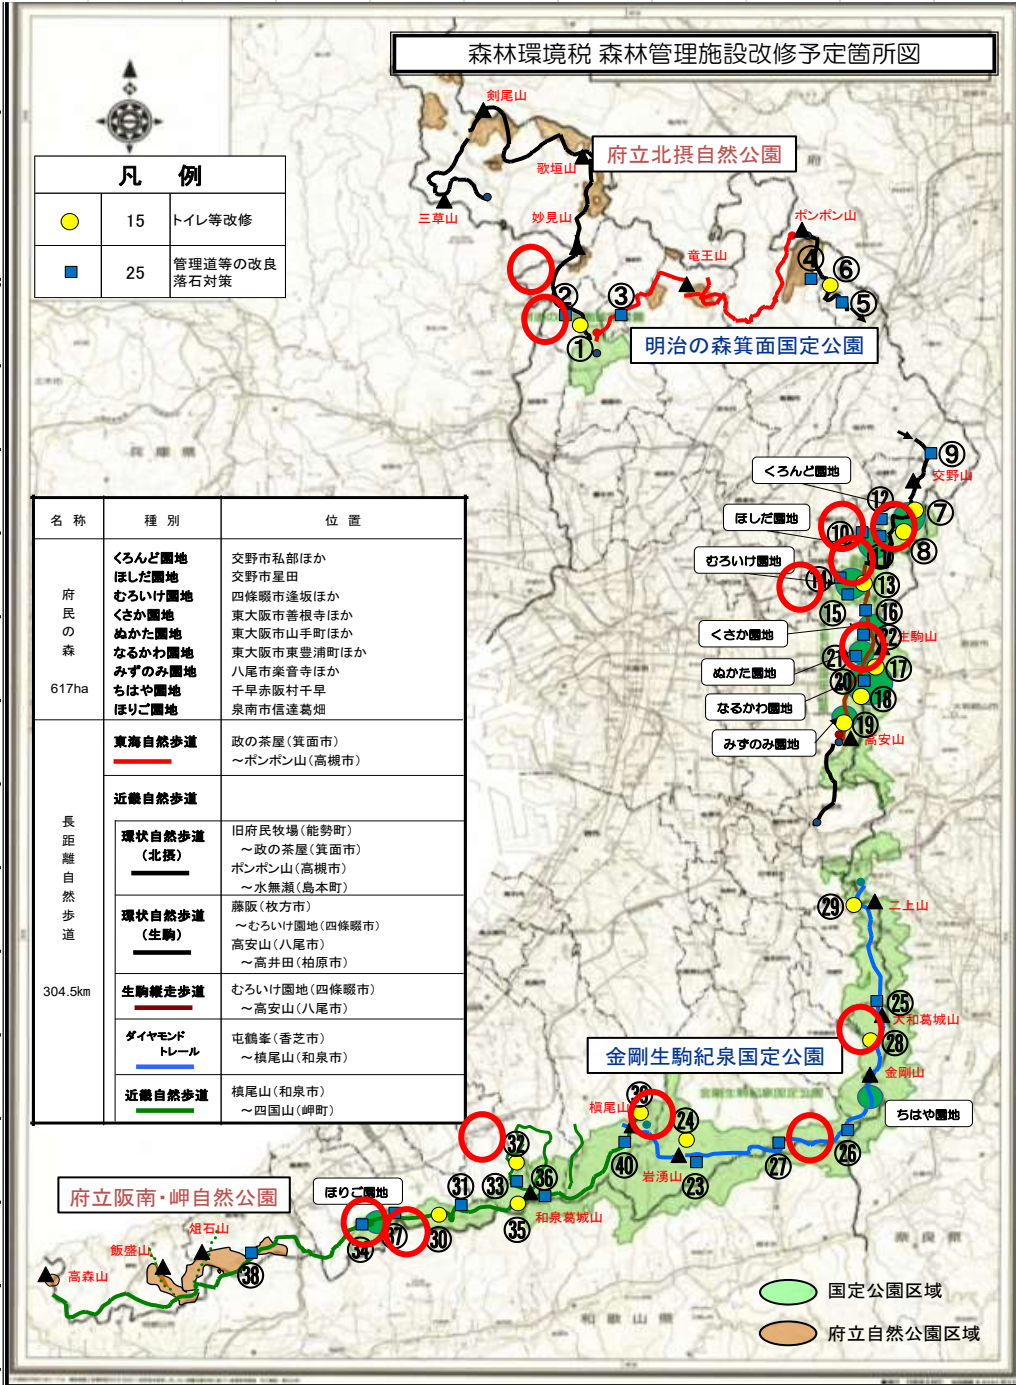


工種別実施数		R7年度			新規着手	R6	R7	R8	R9	R10	
歩道	落石	3箇所	2箇所	8箇所	R6年度着手	13箇所	13	7	4	2	1
					R7年度着手	6箇所		6	5	0	0
トイレ		8箇所	13箇所	8市町村	R8年度着手	11箇所			11	8	4
					R9年度着手	9箇所				9	5
合 計		13箇所	8市町村		R10年度着手	1箇所					1
					計	40箇所	13箇所	13箇所	20箇所	19箇所	11箇所

歩道等の改良

令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ②箕面市箕面地区ほか

【平面図】

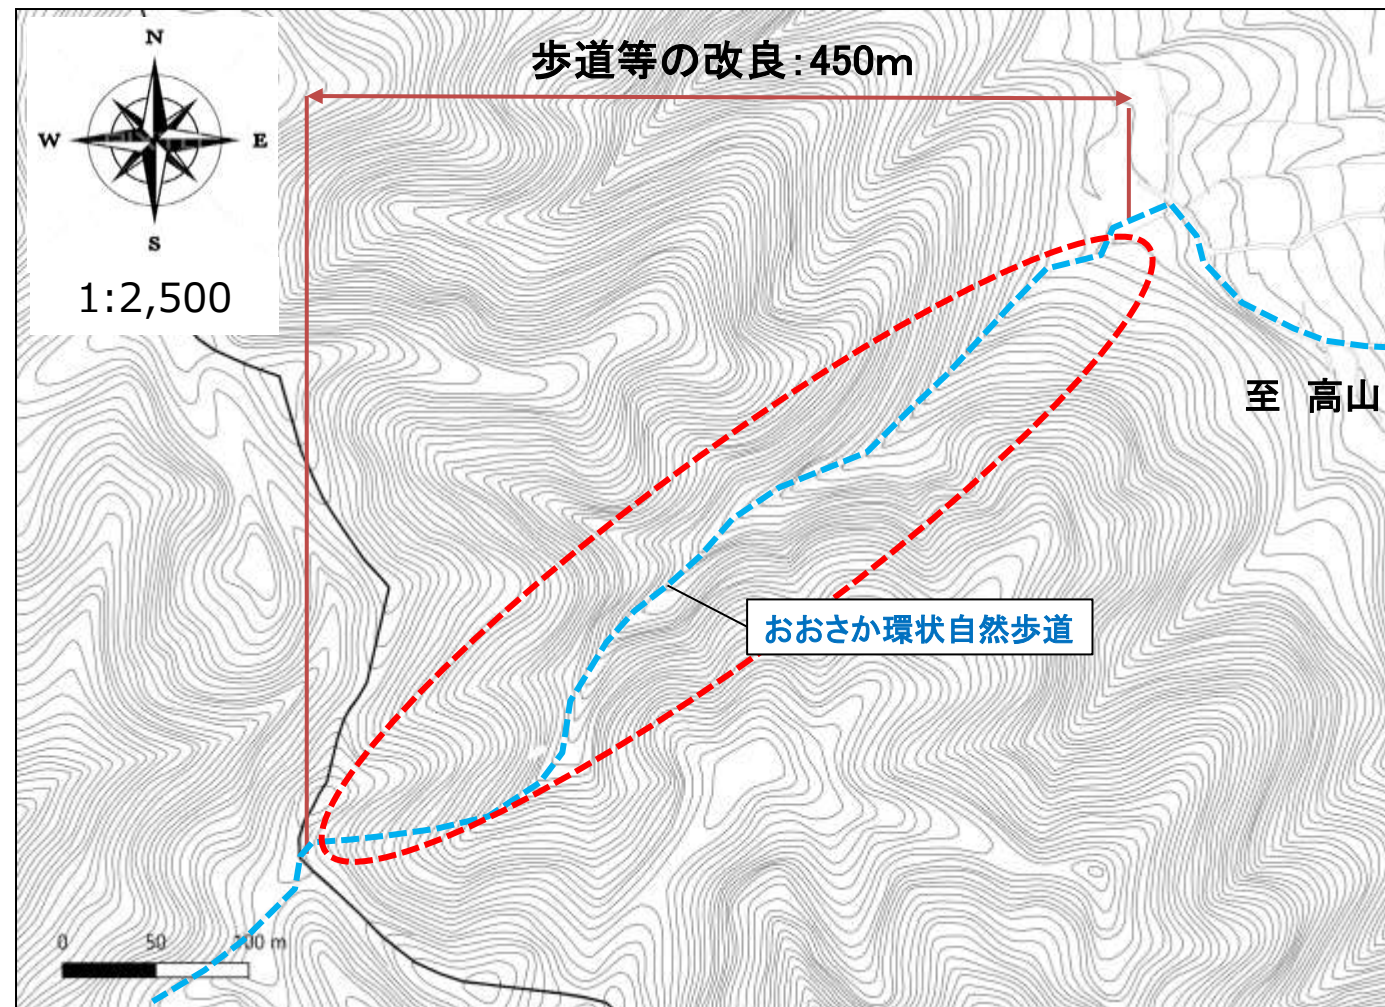

至 箕面VC

【施工前】



撮影日：R7.7.7

【施工後】



撮影日：R8.6.10


【凡例】 事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置

歩道等

施設名	工種	備考
環状自然歩道	歩道等の改良 整備区間450m	丸太階段工 石製水路工 水切り工 簡易土留工 ほか

令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ②6河内長野市天見地区ほか

【平面図】

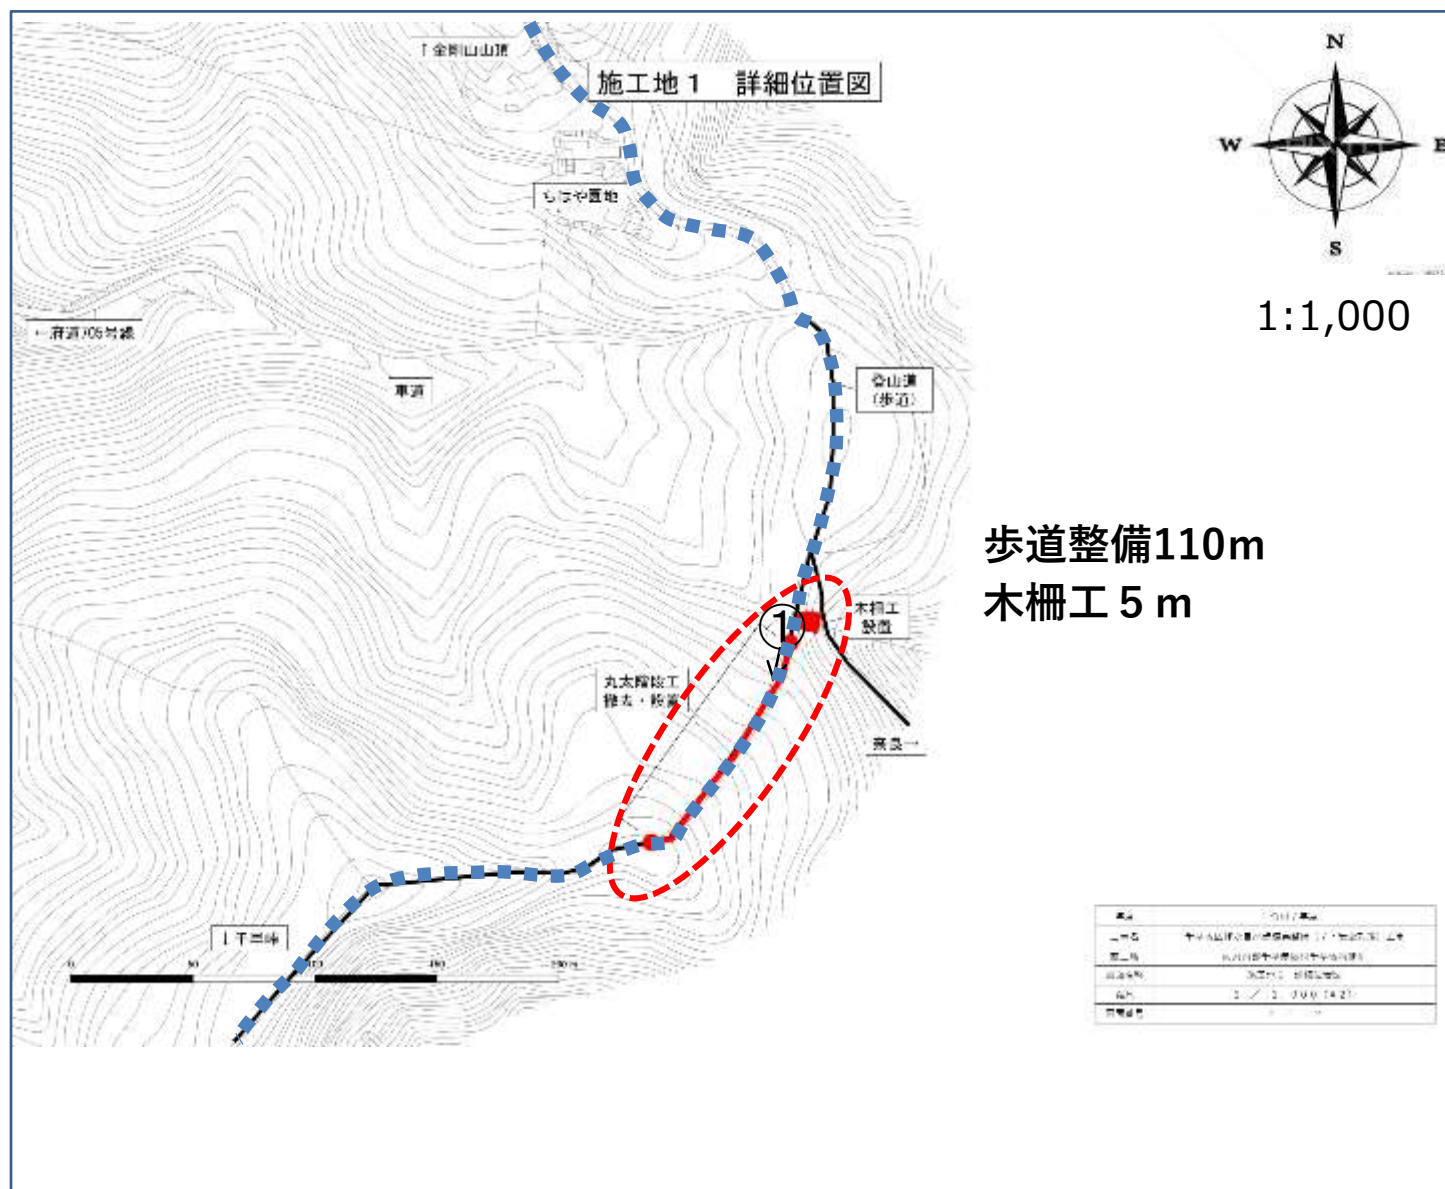

【施工前】




【施工後】



【凡例】 事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置
■■■■■■■■■■ 歩道等

施設名	工種	備考
環状自然歩道	歩道等の改良 整備区間115m	

【平面図】

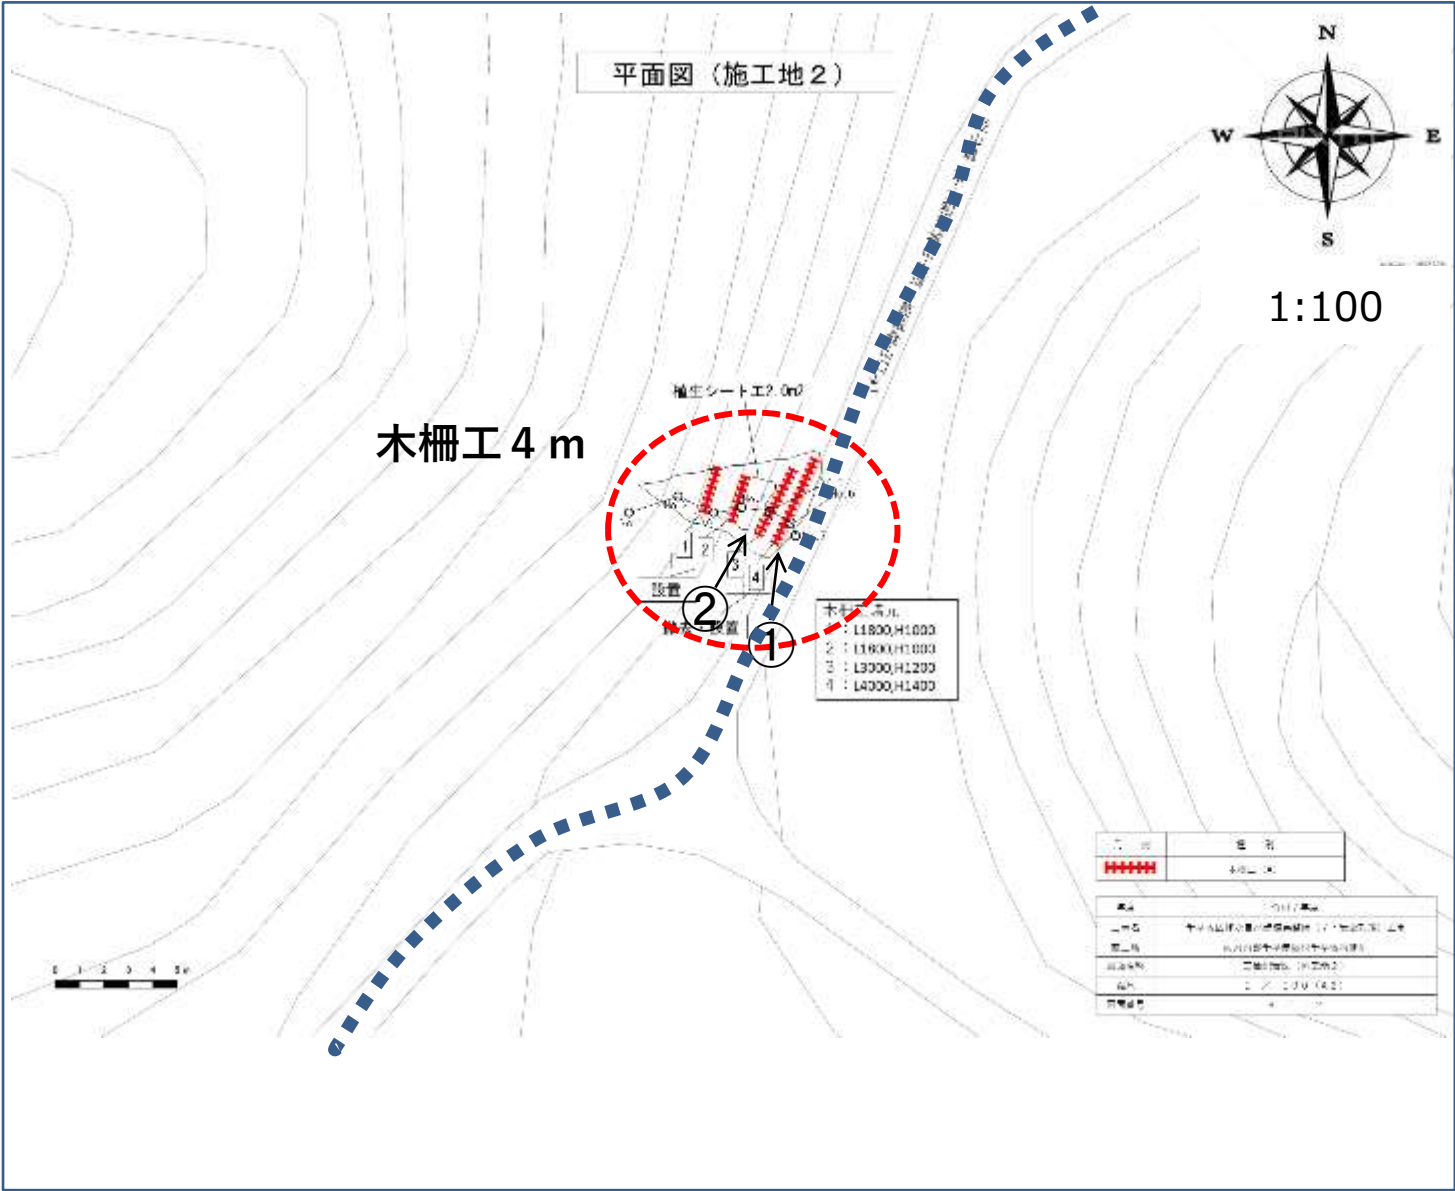

【凡例】  事業地（新規箇所） ①→写真撮影位置

 歩道等

施設名	工種	備考
環状自然歩道	歩道等の改良 整備区間4m	

【施工前】 ①




【施工後】 ②



令和 7 年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ③⑦ 泉佐野市日根野地区ほか

【平面図】

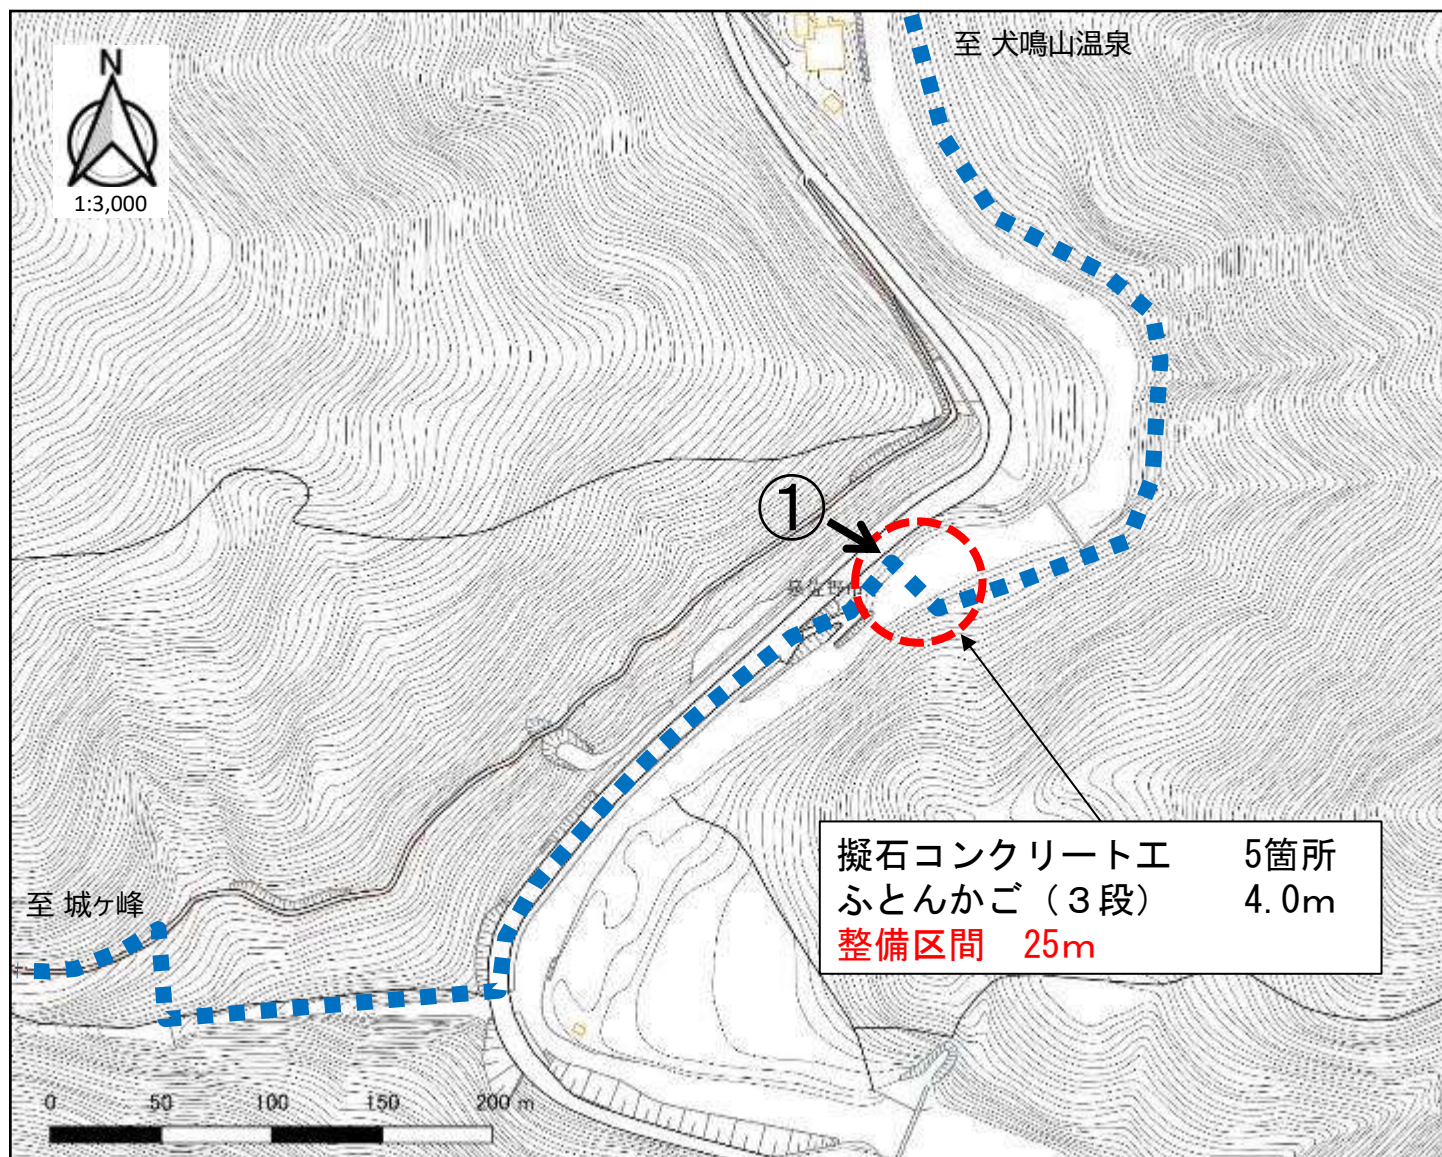

【凡例】  事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置
 歩道等

施設名	工種	備考
近畿自然歩道	歩道等の改良 整備区間25m	

【施工前】




【施工後】



落石对策

令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ⑪交野市星田地区

【平面図】

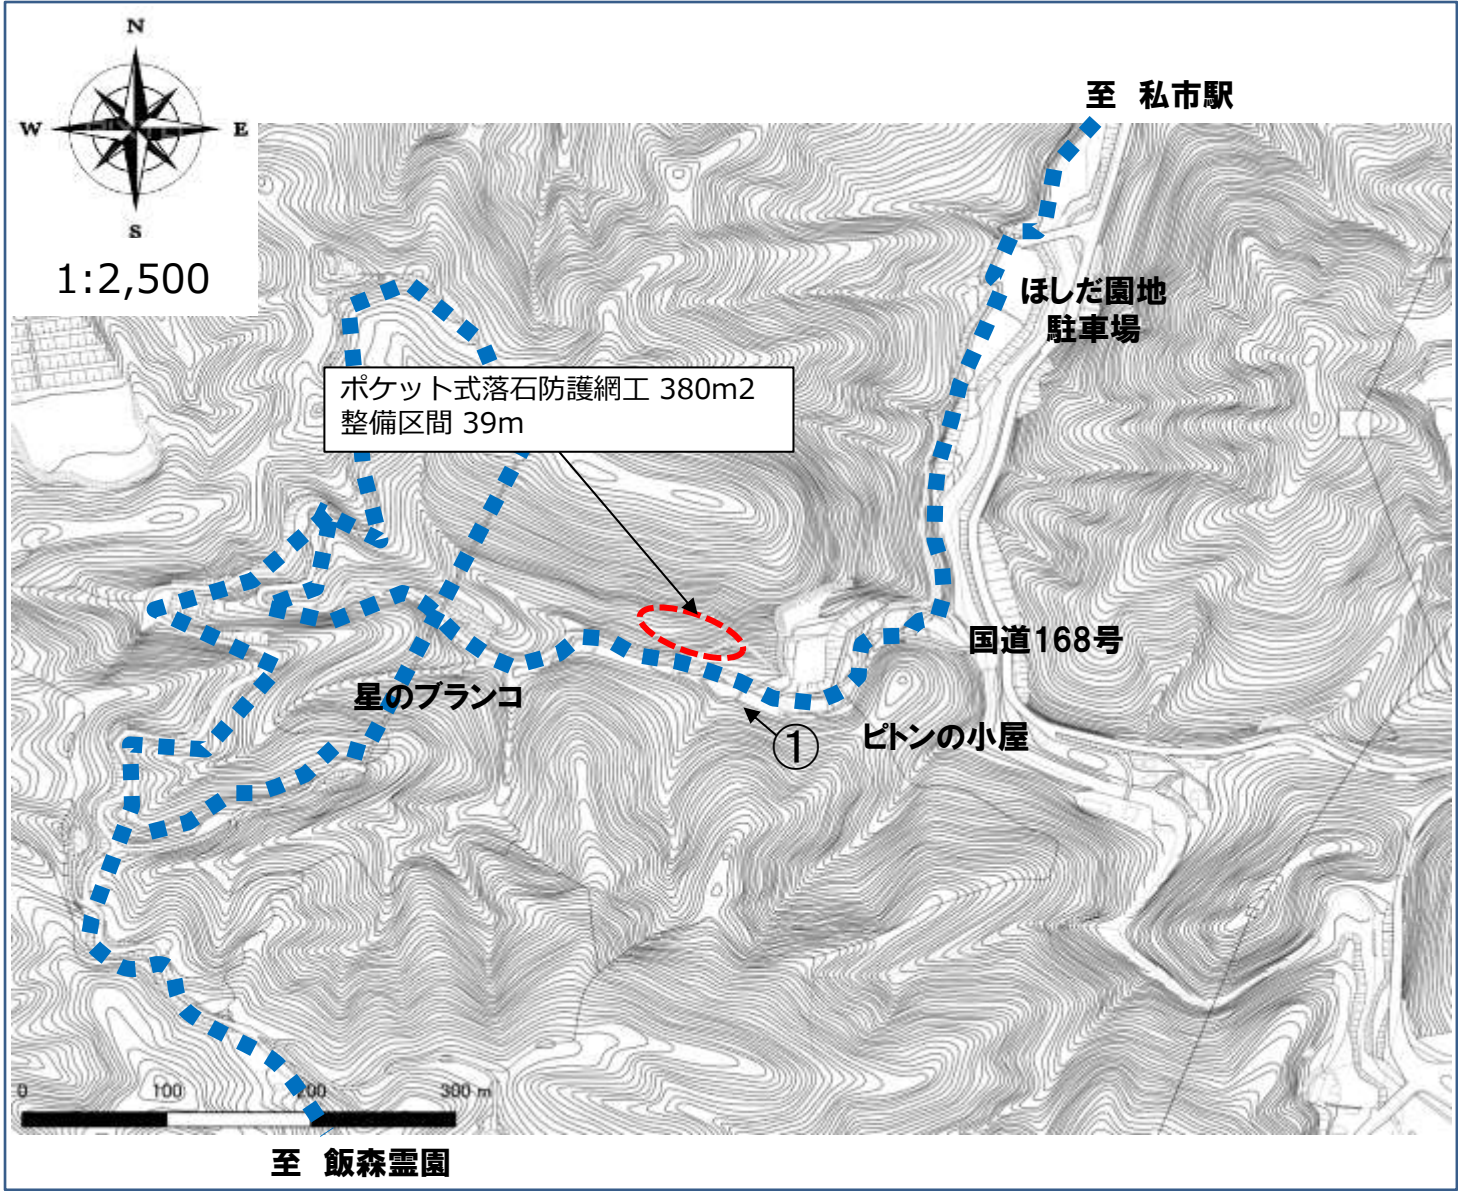

【凡例】  事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置
 歩道等

施設名	工種	備考
環状自然歩道	落石対策工 整備区間39m	


【施工前】



【施工後】



【平面図】

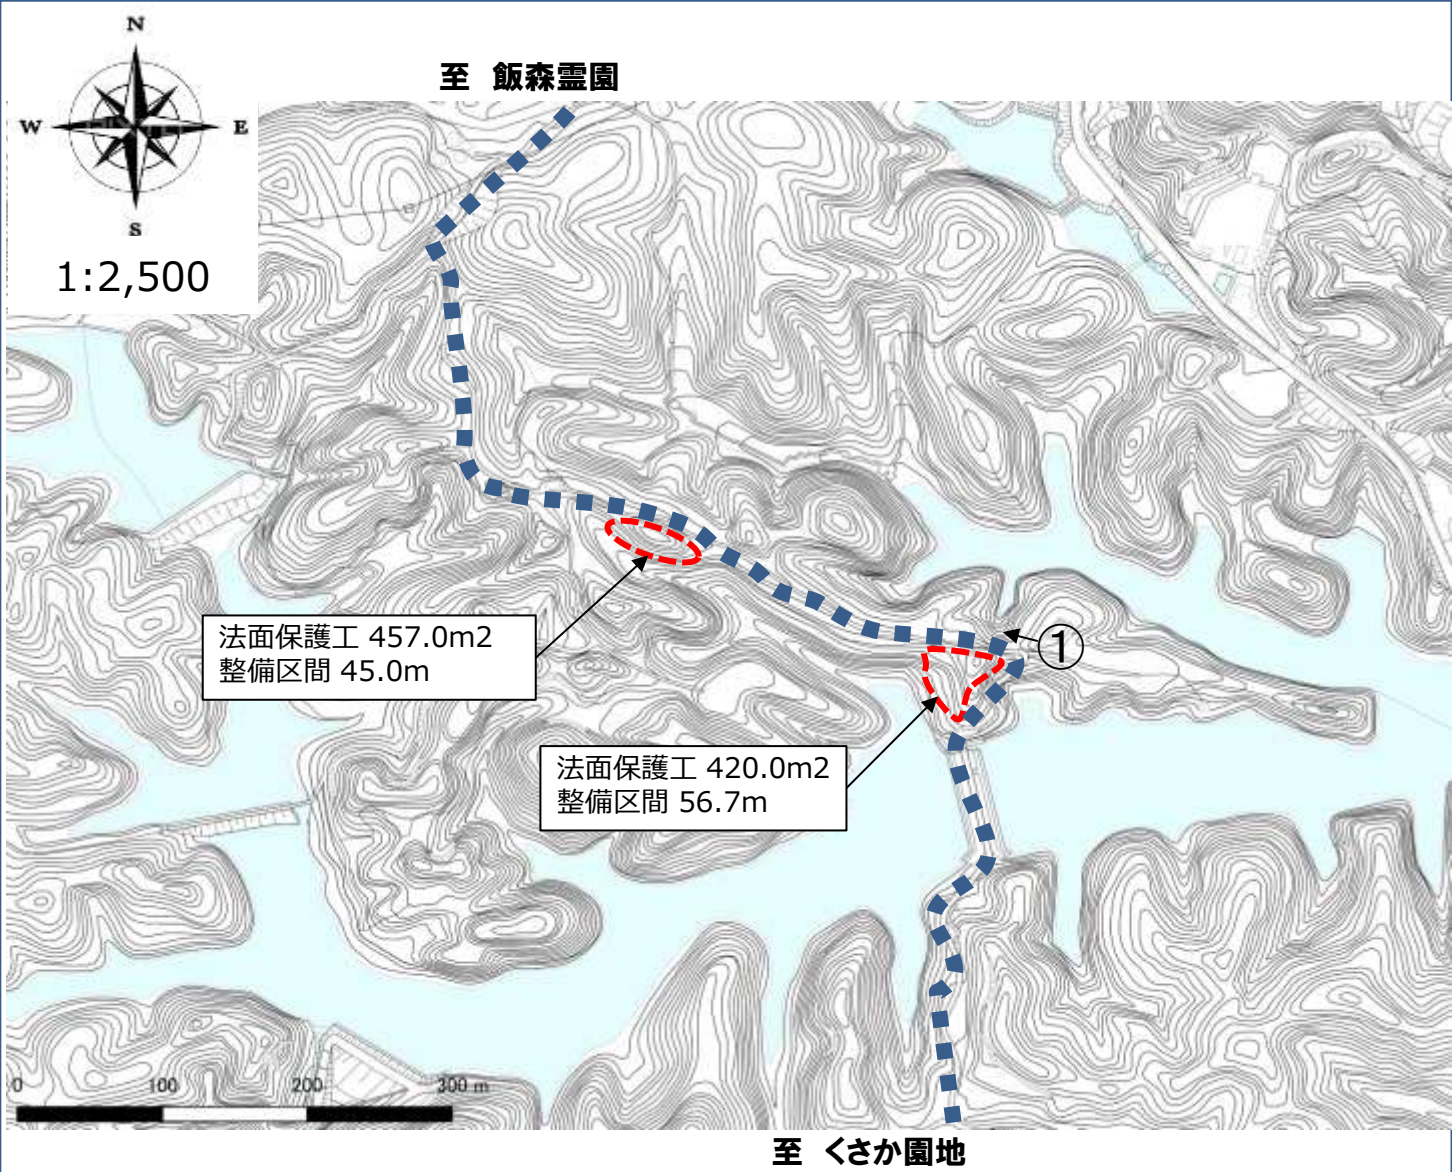

【凡例】  事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置
 歩道等

施設名	工種	備考
環状自然歩道	法面整備工 整備区間45.0m、56.7m	

【施工前】




【施工後】



トイレ等改修 (工事)

令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ⑰東大阪市上四条町地区

【平面図】

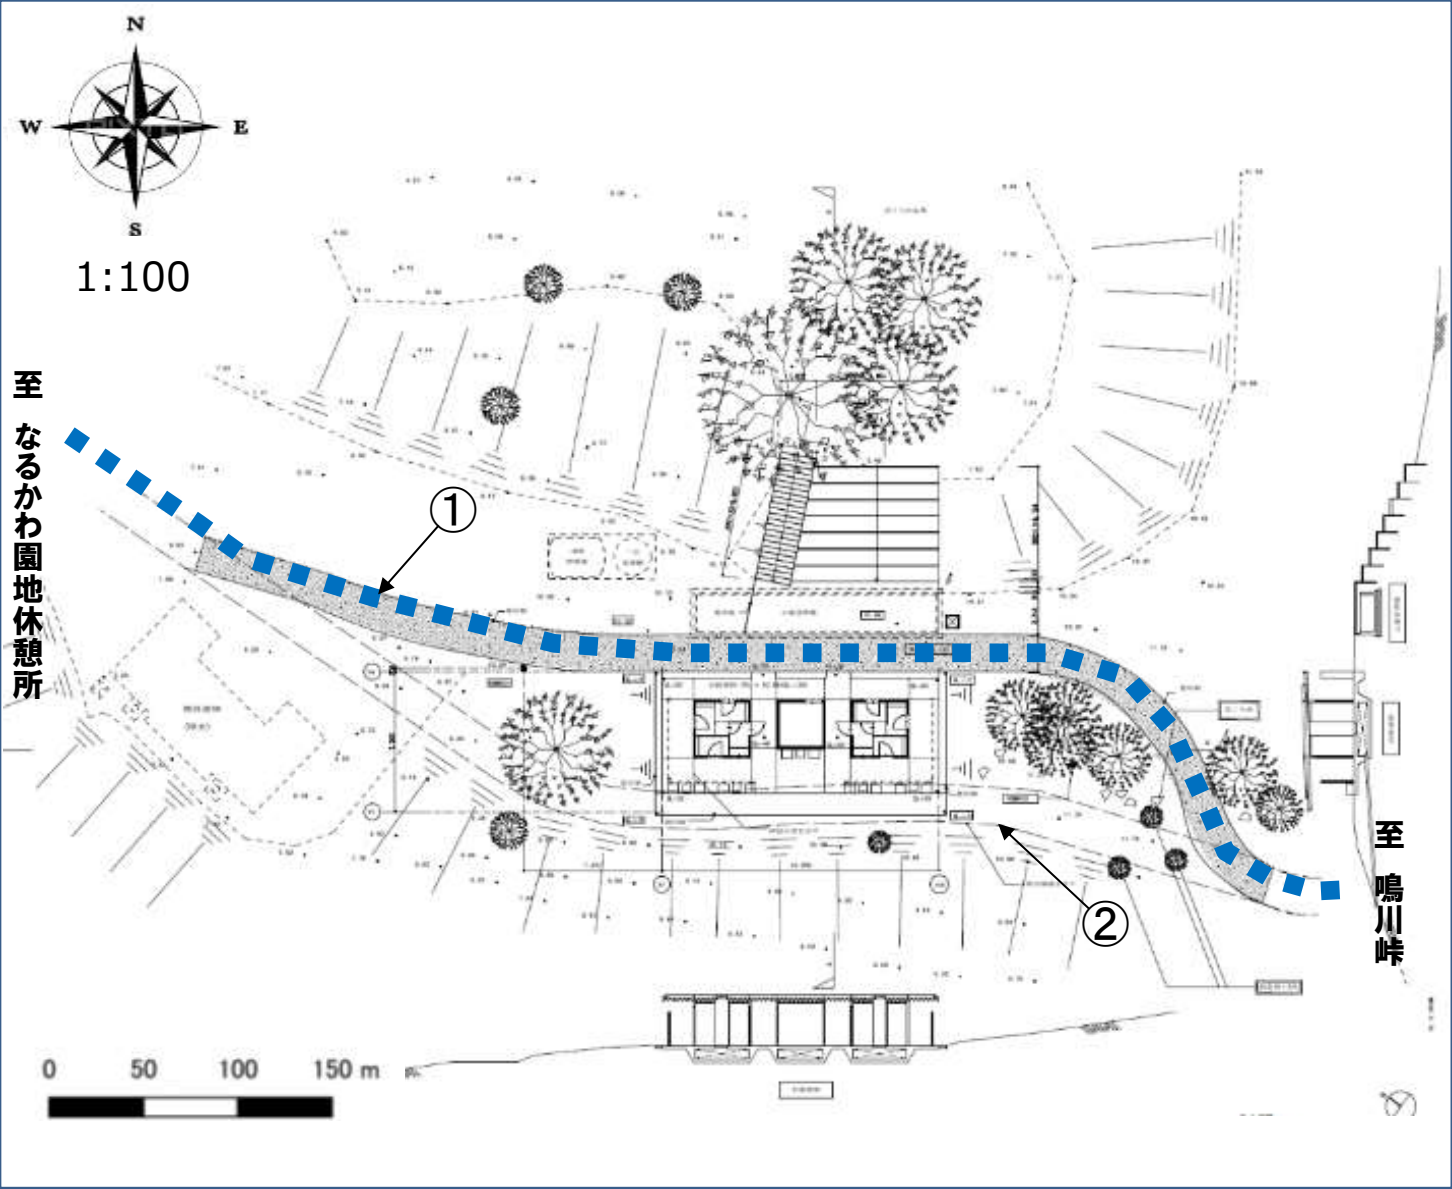

【凡例】 ■■■■■ 歩道等 ①→写真撮影位置

施設名	工種	備考
ぼくらの広場トイレ	トイレ改修	R7→R8繰越

【施工前】




【施工後（イメージ）】



令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ②河内長野市加賀田地区

【平面図】

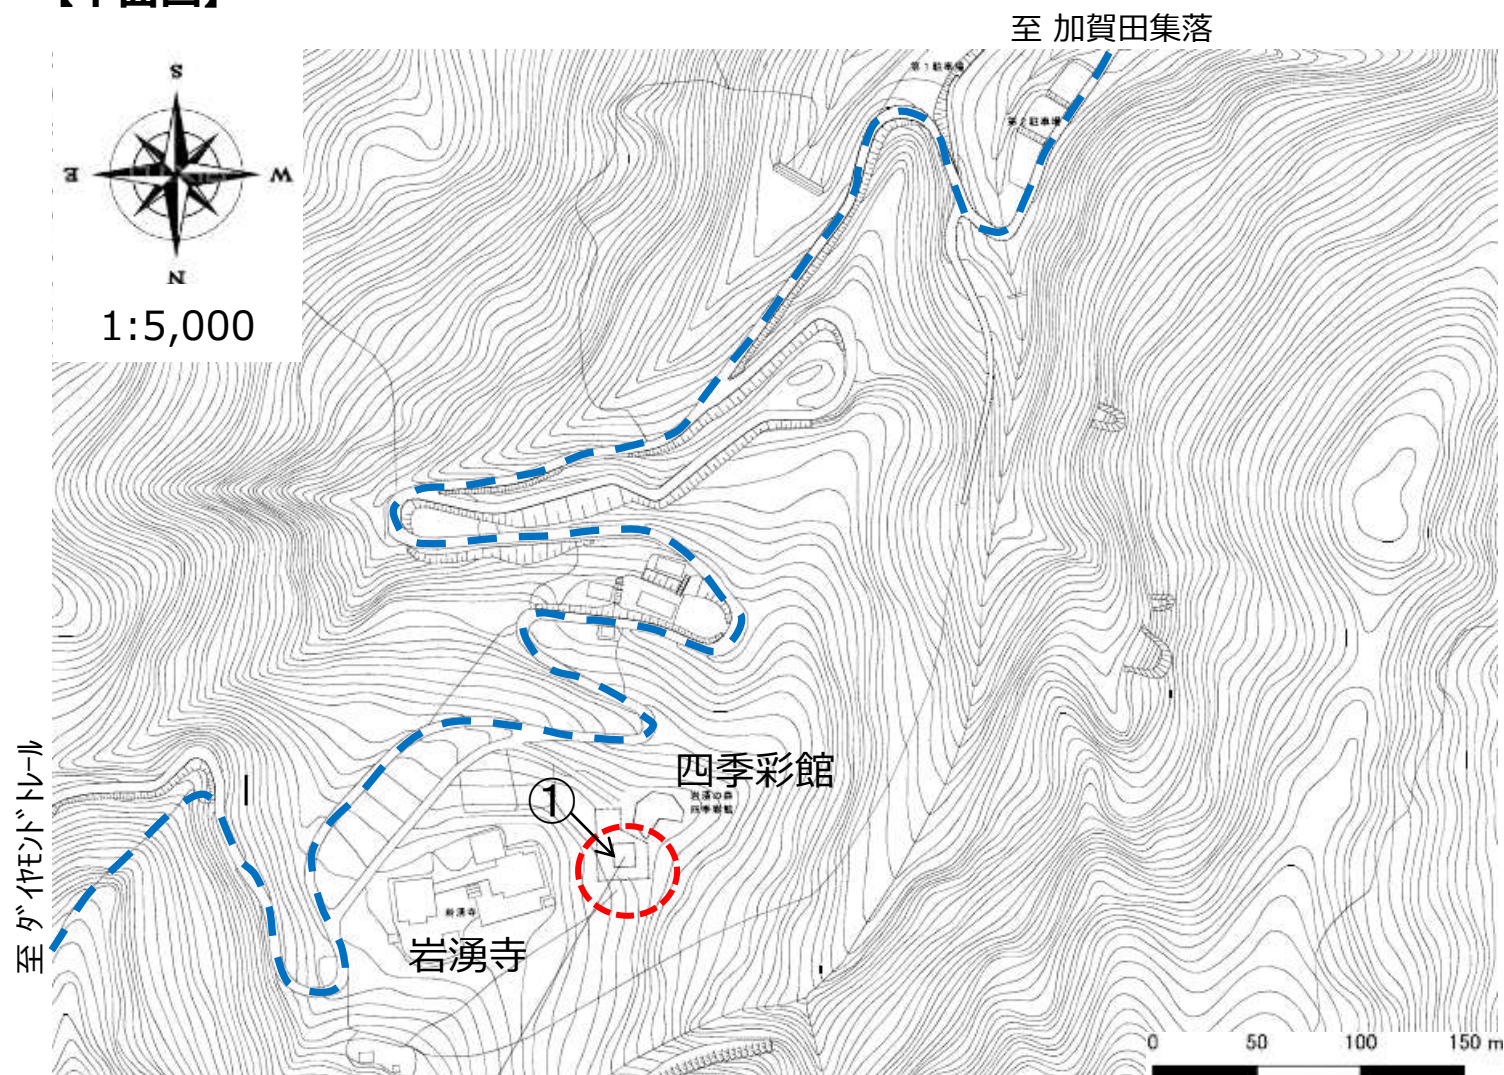

【施工前】



【施工状況（イメージ）】




【凡例】  事業地（新規箇所） ①→写真撮影位置
 歩道等

施設名	工種	備考
四季彩館トイレ	トイレ改修	R7→R8繰越

令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ③0 泉佐野市犬鳴地区ほか

【平面図】

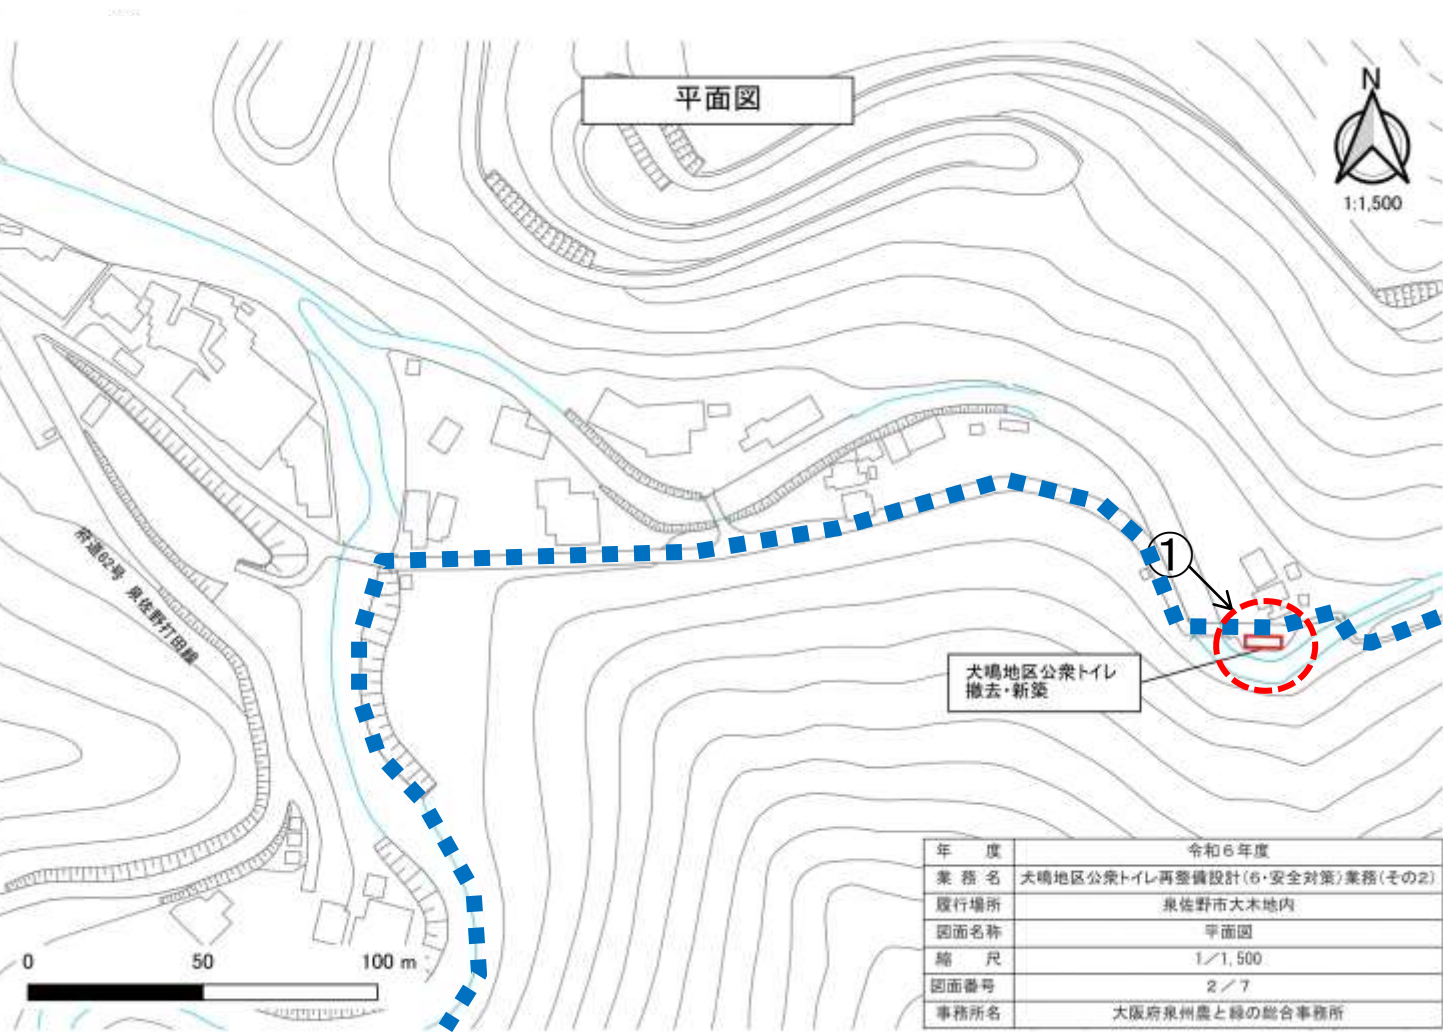

【凡例】  事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置

 歩道等

施設名	工種	備考
犬鳴トイレ	トイレ改修	R7→R8繰越

【施工前】




【施工状況（イメージ）】



トイレ等改修 (実施設計)

令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ①箕面市鉢伏山地区ほか

【平面図】

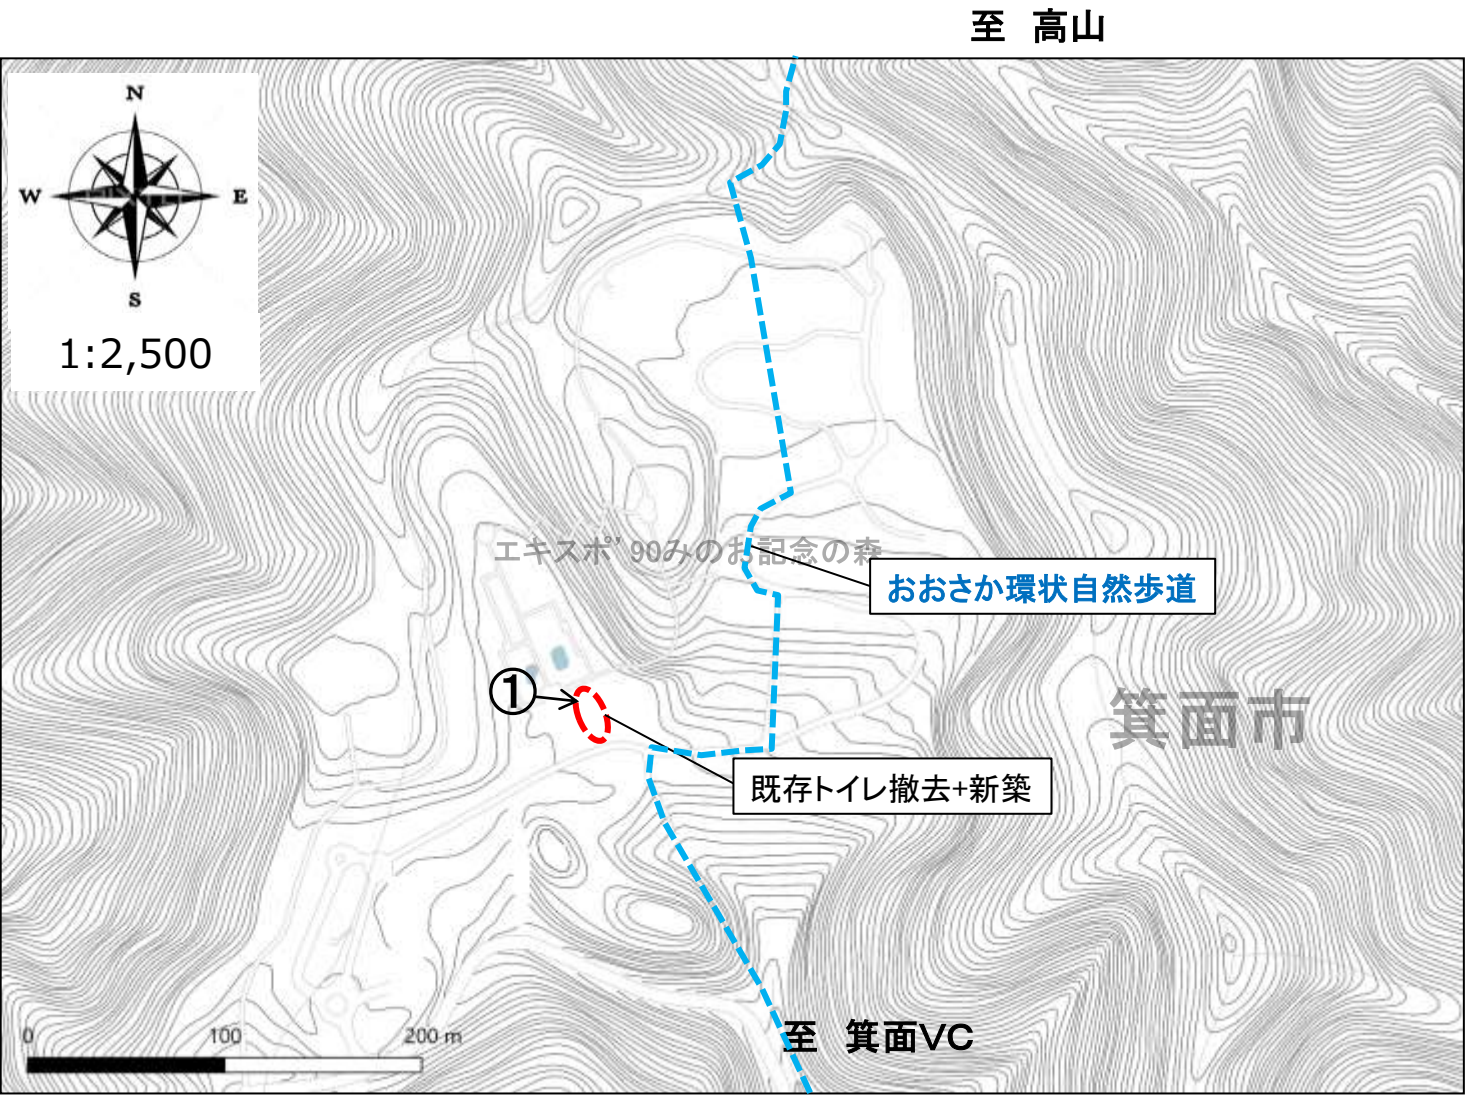

【施工前】



【施工後（イメージ）】




【凡例】  事業地（新規箇所） ①→写真撮影位置
 歩道等

施設名	工種	備考
エクスポ'90みのお記念の森 公衆トイレ	トイレ改修	実施設計のみ

⑧交野市私部地区

【平面図】

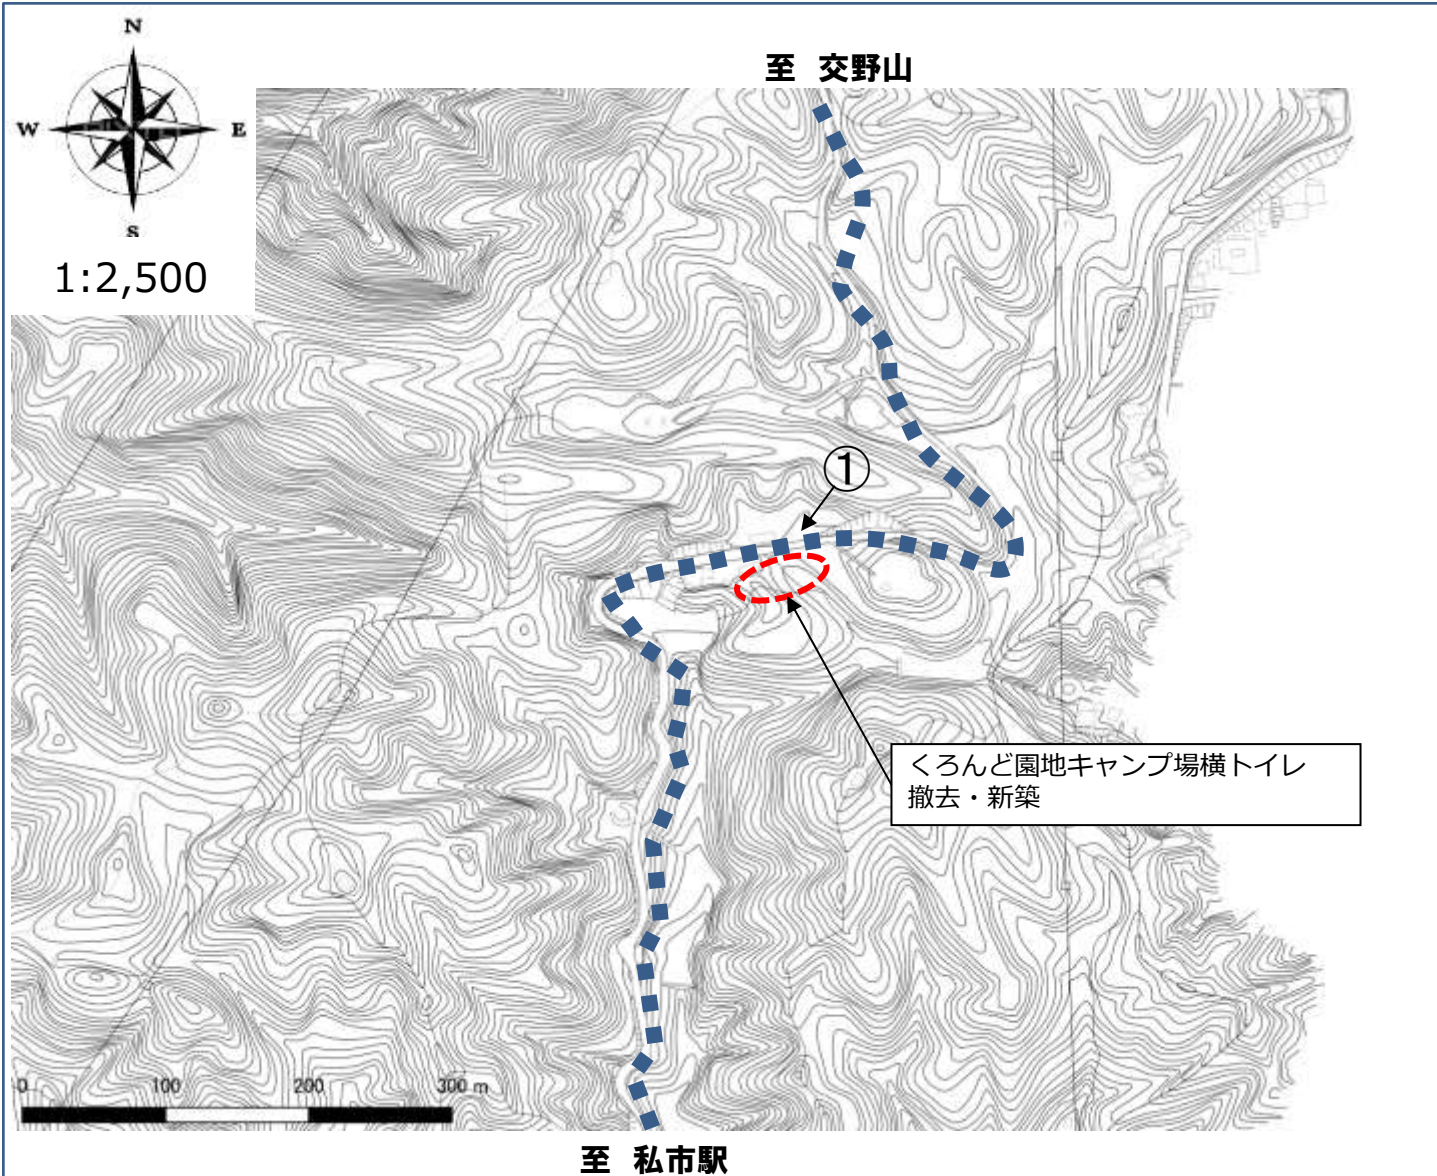

【凡例】  事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置
 歩道等

施設名	工種	備考
くろんど園地キャンプ場横トイレ	トイレ改修	実施設計のみ

【施工前】




【施工後（イメージ）】



令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ⑬四條畷市逢阪地区

【平面図】

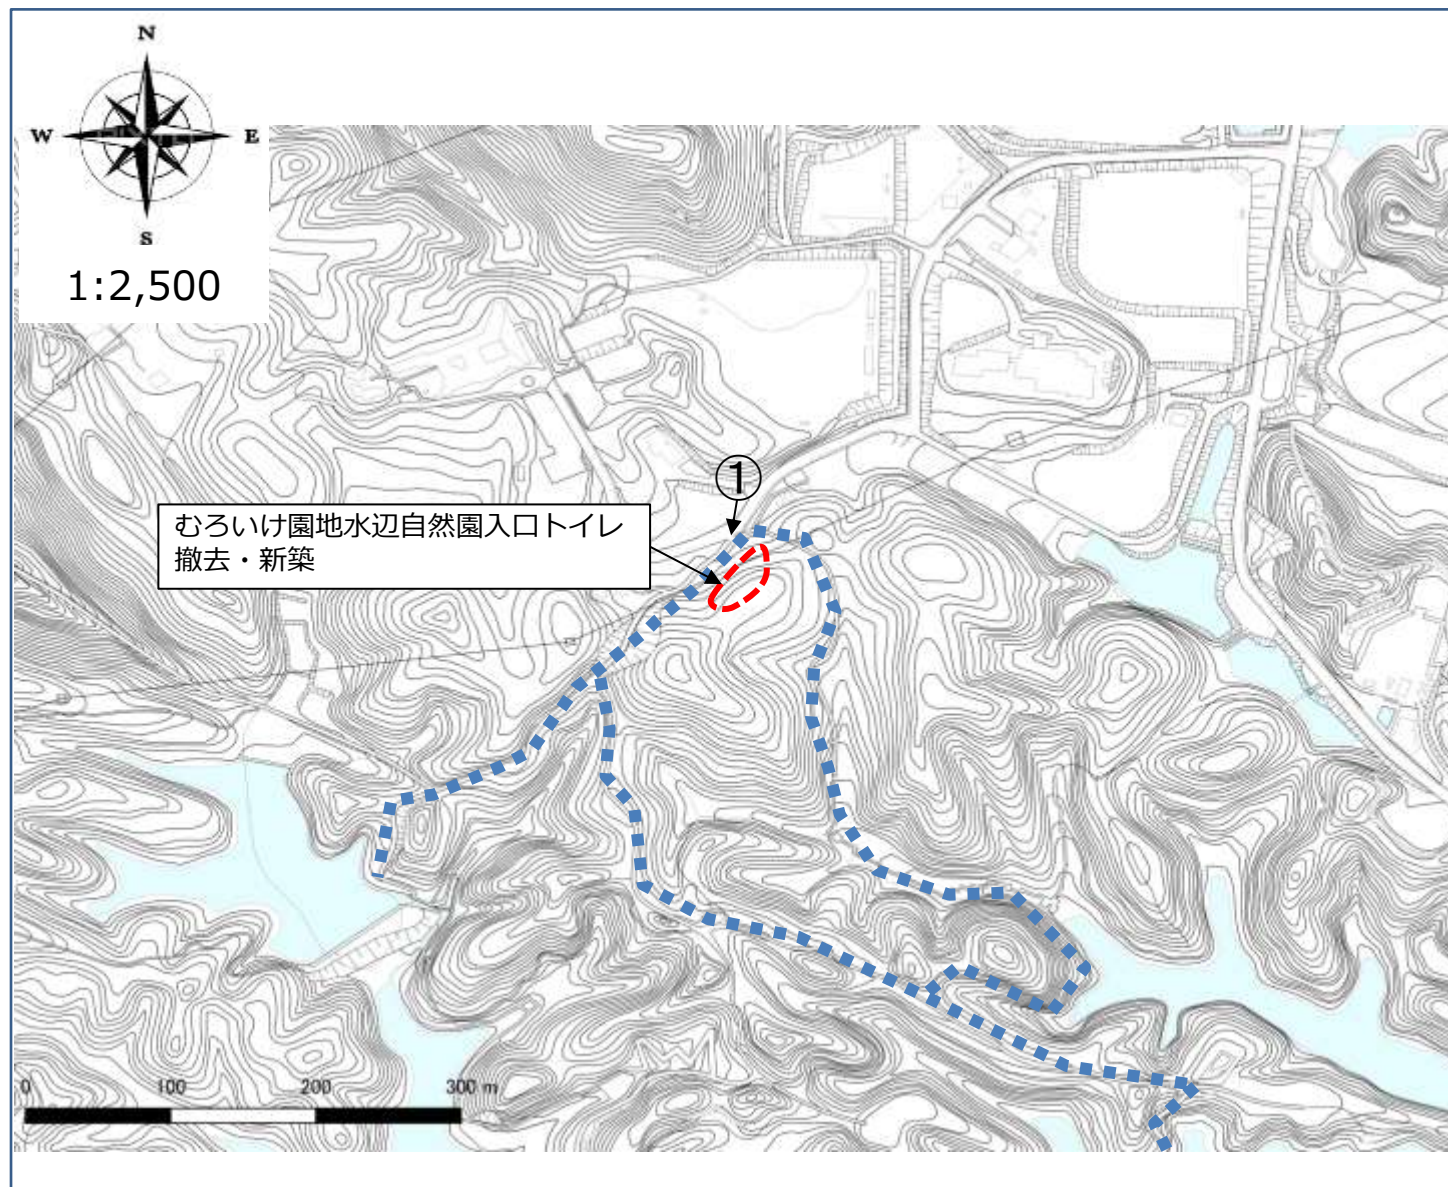

【凡例】 事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 歩道等

施設名	工種	備考
水辺自然園入口トイレ	トイレ改修	実施設計のみ

【施工前】




【施工後（イメージ）】



令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ②⑧河南町上河内地区

【平面図】

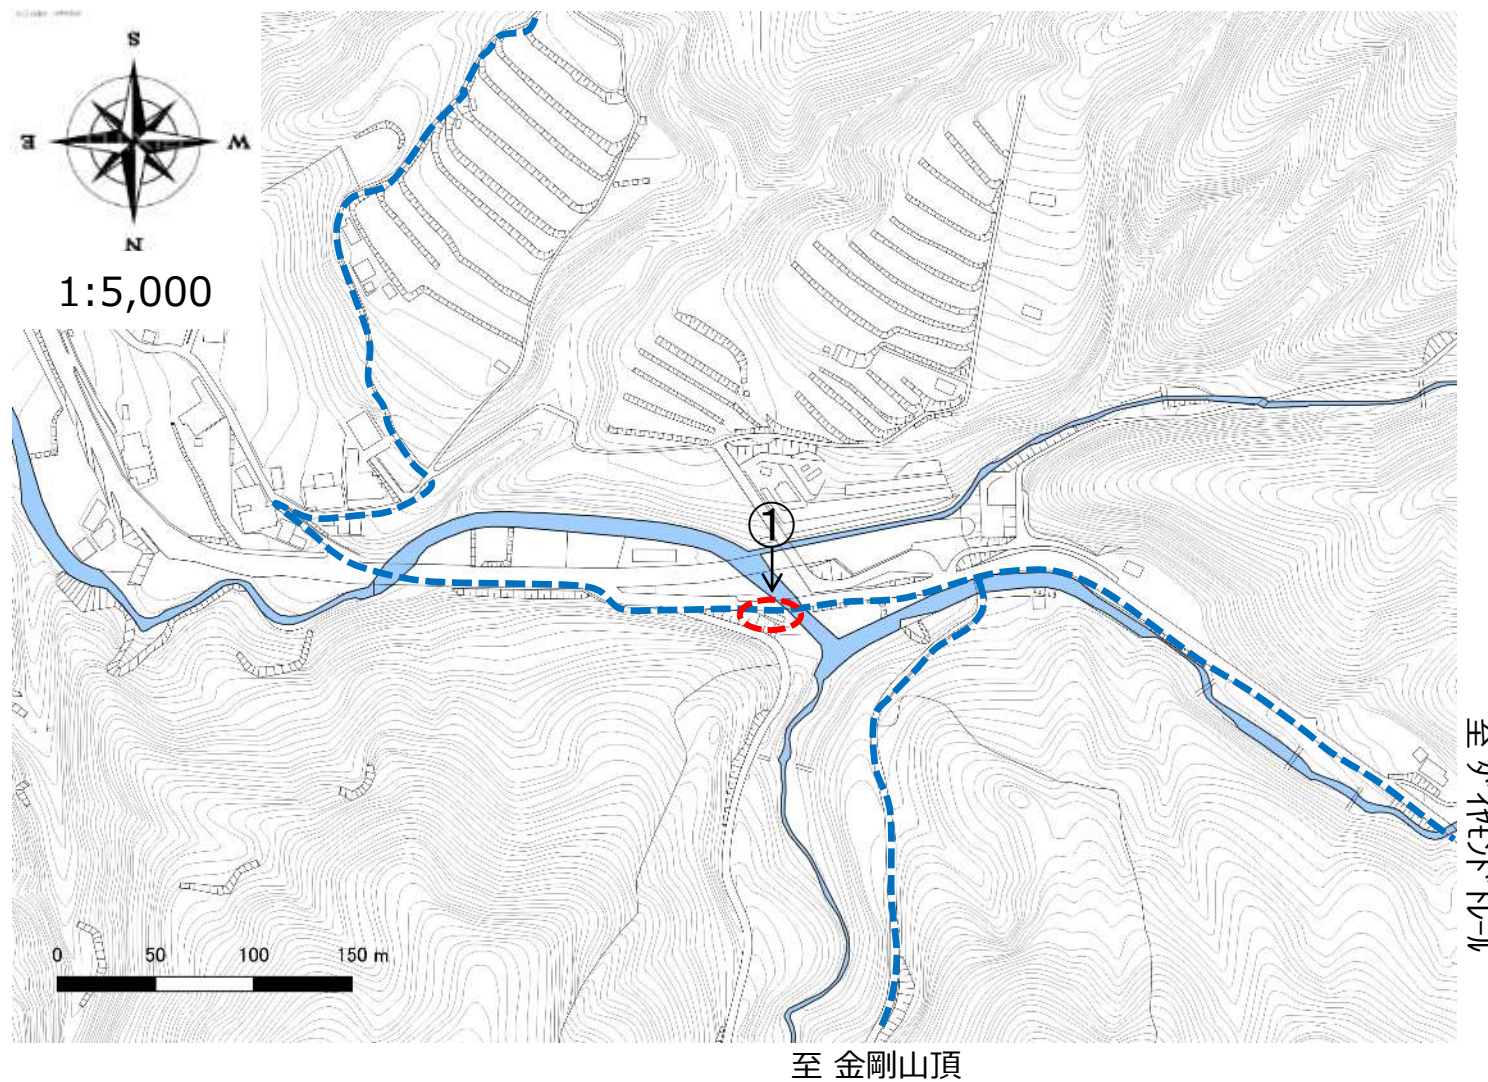

【施工前】



【施工後（イメージ）】




【凡例】  事業地（新規箇所） ①→写真撮影位置
 歩道等

施設名	工種	備考
青崩トイレ	トイレ改修	実施設計のみ

令和7年度 府民も利用する森林管理施設の安全対策事業実績 ③2 貝塚市蕎原地区ほか

【平面図】

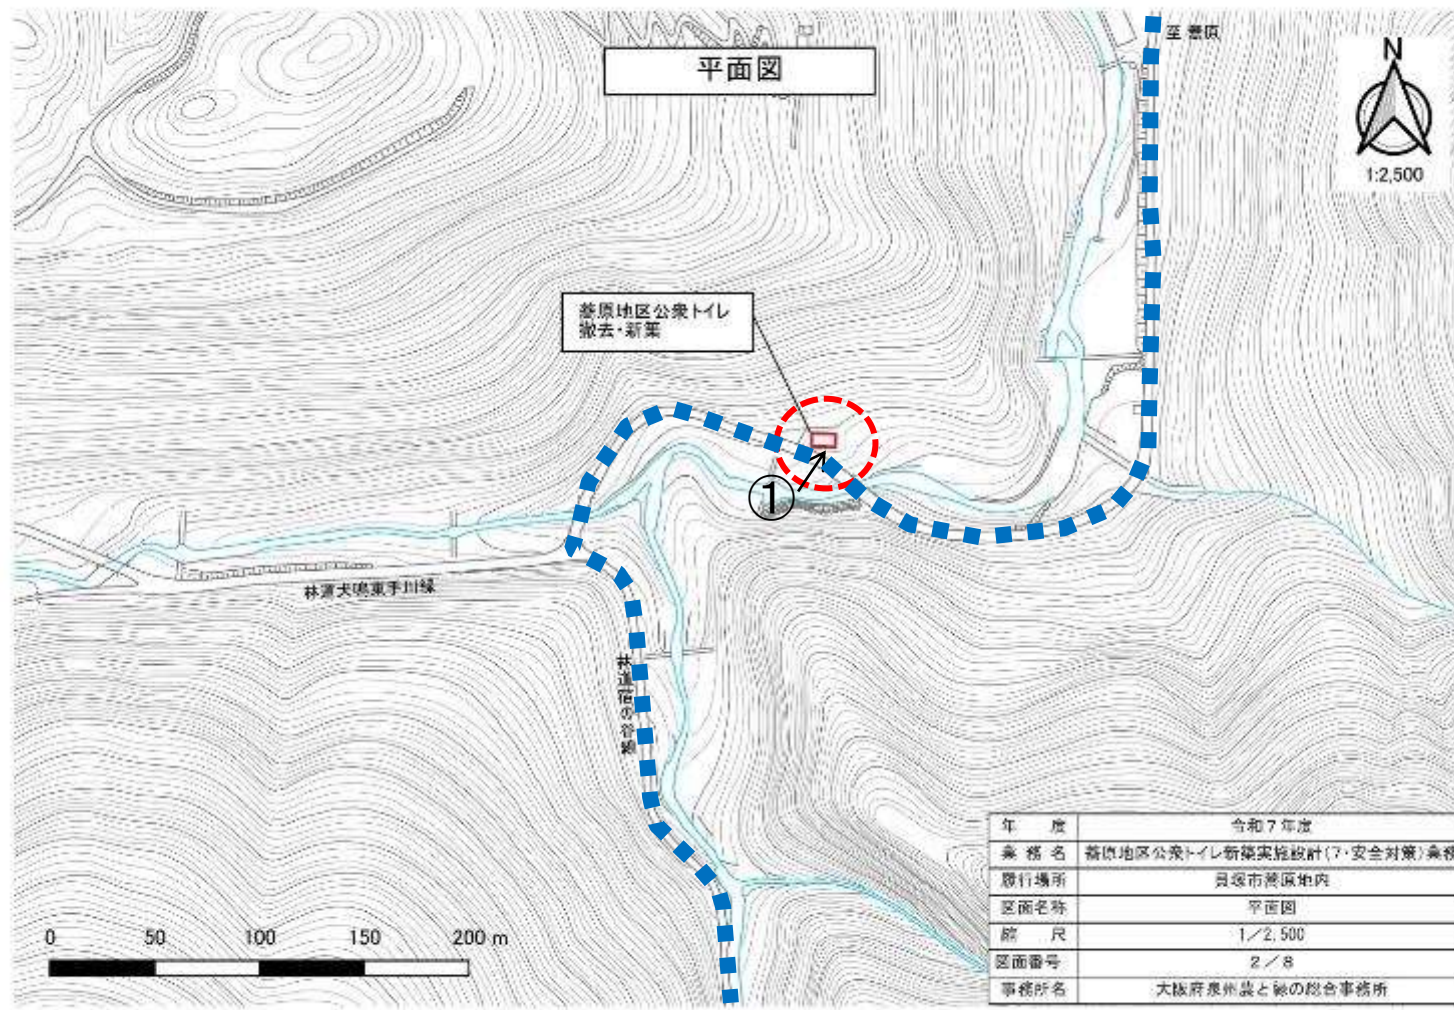


【施工前】



【施工後（イメージ）】




【凡例】  事業地(新規箇所) ①→写真撮影位置

施設名	工種	備考
蕎原トイレ	トイレ改修	実施設計のみ

【令和8年度事業 実施箇所】

番号	地区名	施設名	工種	スケジュール					備考
				R6	R7	R8	R9	R10	
①	箕面市鉢伏山地区	管理棟トイレ	トイレ						R7実施設計
②	箕面市箕面地区ほか	環状自然歩道	歩道						完了
③	茨木市車作地区ほか	環状自然歩道	歩道						
④	高槻市原地区ほか	環状自然歩道	歩道						完了
⑤	島本町広瀬地区ほか	東海自然歩道	歩道						
⑥	島本町大沢地区	大沢トイレ	トイレ						
⑦	交野市私部地区ほか	案内所横トイレ	トイレ						R7実施設計
⑧		キャンプ場横トイレ	トイレ						
⑨		環状自然歩道	歩道						
⑩	交野市星田地区	ほしだ園地	歩道						
⑪		環状自然歩道	落石						
⑫		環状自然歩道	歩道						
⑬	四條畷市逢阪地区	水辺自然園入口トイレ	トイレ						R7実施設計
⑭		むろいけ園地	歩道						完了
⑮		むろいけ園地	落石						
⑯		むろいけ園地	落石						
⑰		環状自然歩道	歩道						
⑱	東大阪市上四条町地区	ぼくらの広場トイレ	トイレ						完了（R7→R8繰越）
⑲	東大阪市客坊町地区	らくらくセンターハウストイレ	トイレ						
⑳	八尾市神立地区	みずのみトイレ	トイレ・落石						
㉑	東大阪市山手町地区ほか	環状自然歩道	落石						
㉒		ぬかた園地	歩道						
㉓	河内長野市加賀田地区	岩湧の森	歩道・落石						
㉔		四季彩館トイレ	トイレ						
㉕	千早赤阪村水分地区	ダイヤモンドトレール支線	歩道・落石						
㉖	河内長野市天見地区ほか	ダイヤモンドトレール	歩道						完了
㉗	河内長野市滝畑地区ほか	ダイヤモンドトレール	歩道						
㉘	河南町上河内地区	青崩トイレ	トイレ						R7実施設計
㉙	太子町山田地区	二上山万葉の森駐車場トイレ	トイレ						
㉚	泉佐野市犬鳴地区ほか	犬鳴トイレ	トイレ						完了（R7→R8繰越）
㉛		近畿自然歩道	歩道						
㉜	貝塚市蕎原地区ほか	蕎原トイレ	トイレ						R7実施設計
㉝		近畿自然歩道	歩道						
㉞	泉南市信達楠畑地区ほか	近畿自然歩道	歩道						
㉟	和泉葛城山地区	森林管理作業小屋	トイレ						
㊱		近畿自然歩道	歩道						
㊲	泉佐野市日根野地区ほか	近畿自然歩道	歩道						完了
㊳	阪南市桑畑地区ほか	近畿自然歩道	歩道						
㊴	和泉市槇尾山地区ほか	槇尾山トイレ	トイレ						
㊵		近畿自然歩道	歩道						

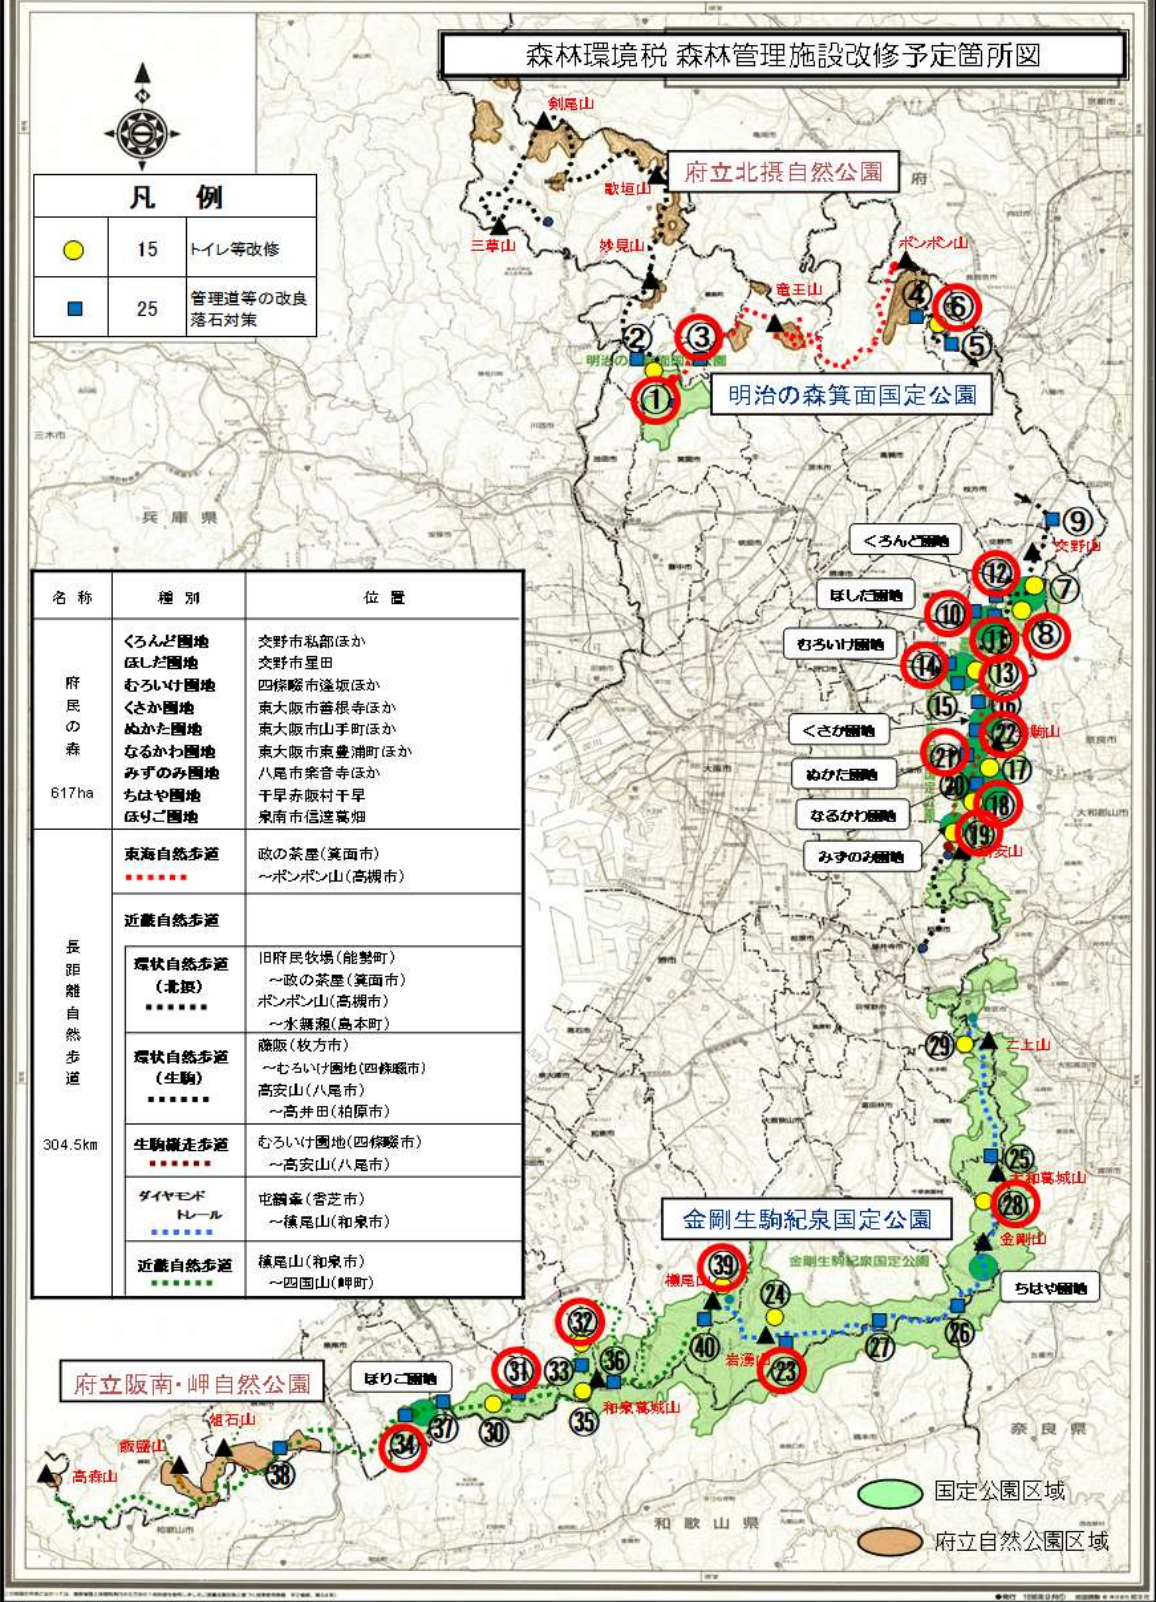

	新規着手	R6	R7	R8	R9	R10
R6年度着手	13箇所	13	7	4	2	1
R7年度着手	6箇所		6	5	0	0
R8年度着手	12箇所			11⇒12	8⇒9	4⇒5
R9年度着手	8箇所				9⇒8	5⇒4
R10年度着手	1箇所					1
計	40箇所	13箇所	13箇所	21箇所	19箇所	11箇所

令和7年度 大阪府森林環境整備事業 評価シート

担当課名	みどり推進室みどり企画課
担当グループ名	自然公園グループ
連絡先	(06)6210-9557

1 事業概要

(単位:千円)

①概要等	事業実施年度	令和7年度
	評価年月日	令和8年7月9日
	施策区分	自然災害から府民の暮らしを守る取組み
	事業名	森林管理施設安全対策事業
	事業概要	府民も利用する森林管理施設の安全対策事業
	事業開始年度	令和6年度
②事業の目的	府民も利用する自然公園内の管理道等の森林管理施設を改修し、安全性を確保する。	

③事業費	年度別推移	R6	R7	R8	R9	R10	合計
	当初計画	231,400	271,300	369,500	668,200		1,540,400
	現計画	231,400	271,300	454,200	668,200		1,625,100
	執行額	220,628	252,432	-	-	-	473,060
④事業の内容	事業対象：崩壊等の危険性の高い歩道・管理道や構造上の損傷・著しく劣化しているトイレ 事業箇所数：40箇所 事業内容： ①歩道等の改良 降雨等による路面洗堀や路肩崩壊により、土砂流出が顕在化し被害拡大の恐れがある箇所 ②落石対策 歩道・管理道沿いの斜面において、亀裂の入った不安定な巨石や浮石等、落石の恐れのある箇所 ③トイレ等改修 梁柱にひび割れが発生するなど構造上の損傷があり、また浄化槽等の設備機能が著しく低下した施設						

2 自己評価

(1) 事業実績

⑤実績検証の内容	指標・検証方法		計画	実績	評価区分	理由
	歩道等の改良・落石対策	指標	歩道等 改良箇所数	3箇所	3箇所	☐ 妥当である ☒ 概ね妥当である ☐ あまり妥当でない ☐ 妥当でない 計画通りに実施。 (※詳細については箇所別個票参照)
		検証方法	事業の完成検査			
		指標	落石対策 実施箇所数	2箇所	2箇所	
		検証方法	事業の完成検査			
	トイレ等の改修	指標	トイレ 改修棟数	3箇所	3箇所(繰越)	
		検証方法	事業の完成検査			

(2) 事業効果(令和8年度に中間評価・令和11年度に最終評価予定)

⑥効果検証の内容	指標・検証方法		計画	実績	評価区分	理由
	歩道等の改良・落石対策	指標	歩道等の崩壊等の防止	-	-	☐ 妥当である ☐ 概ね妥当である ☐ あまり妥当でない ☐ 妥当でない
		検証方法	自然公園施設点検で崩壊等の有無を確認			
		指標	落石の防止	-	-	
		検証方法	自然公園施設点検で落石の有無を確認			
	トイレ等の改修	指標	利便性の確保	-	-	
		検証方法	利用者数調査			
		指標	環境性能の向上	-	-	
		検証方法	国産木材利用率、府内産木材利用率			
		指標	安全・安心な施設	-	-	
		検証方法	緊急時の一時避難や雨宿り機能の付加			

(3) 自己評価(総合)(令和11年度に最終評価予定)

⑦自己評価	総合評価	理由
	☐ 評価できる	
	☐ 概ね評価できる	
	☐ あまり評価できない	
	☐ 評価できない	

3 第三者評価

⑧第三者評価	大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
	計画どおりの実績ではあるが、自己評価を「おおむね妥当である」とした理由は、一部工事の繰越しが発生し供用が遅れたためであることを踏まえ、事業実績に対する検証、自己評価は妥当である。
