

横断歩道橋
個別施設計画

【大阪府】

令和 7 年 7 月

改訂の履歴

改 訂	履 歴	項
令和 6 年 3 月	策定	—
令和 6 年 1 2 月	改訂	全項更新
令和 7 年 7 月	改訂	全項改訂

目 次

1. はじめに

1) 背景

2) 目的

2. 対象施設

3. 計画期間

4. 対策の優先順位


5. 個別施設の状態・健全性の判定区分・目標管理水準

6. 対策内容と費用縮減効果

1. はじめに

1) 背景

大阪府では、令和 7 年 3 月時点で 300 橋を管理している。橋梁と同じく 1970 年（昭和 45 年）大阪万博の開催にあわせ、一時的に年間 20 橋以上の横断歩道橋が整備されたが、1980 年代以降の整備は減少傾向である。

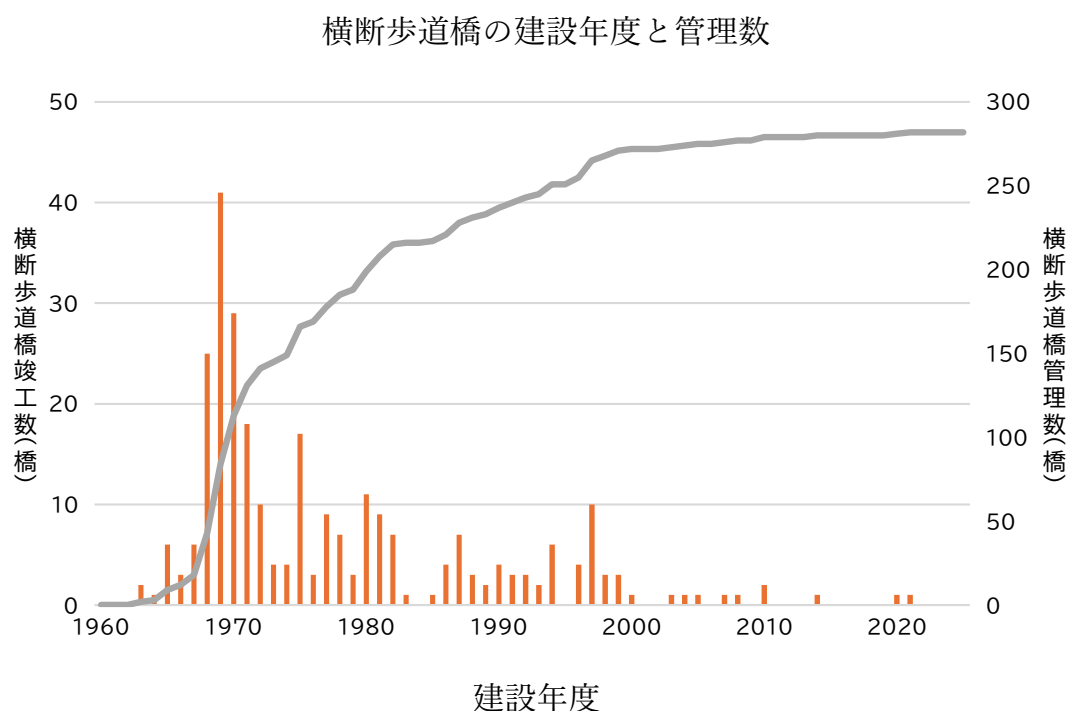

2) 目的

施設の高齢化に伴い、大阪府では平成 27 年 3 月に「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」（計画期間 10 年）を策定し、道路分野では「行動計画」として『道路施設寿命化計画』を定め、適正な維持管理に向けた取組を進めてきた。

これまでの点検結果や修繕実績に基づき、道路施設の健全度の推移等を検証し、点検の効率化や目標管理水準や見直しなどを行い、令和 7 年 3 月に「大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会」の答申を受け、新たな計画を策定した。

横断歩道橋についても、新たに策定した『道路施設長寿命化計画』に基づいて、点検・診断を行い、引き続き、計画的な予防保全型の維持管理を行い、施設の延命化を行う。

2. 対象施設

対象施設は大阪府が管理する 横断歩道橋 300 橋（令和 7 年 3 月時点）

3. 計画期間


令和 7 年度～令和 16 年度の 10 年間

（PDCA サイクルに基づき、概ね 5 年を目途に取組の検証を実施するものとする）

4. 対策の優先順位

対策の優先順位は、点検の診断結果（健全性）と重点化指標（社会的影響度）の組合せにより決定する。重点化指標は、道路施設が不具合を起こすことによって生じる社会的影響度等の大小に応じて、施設ごとに設定する。

対策の優先順位

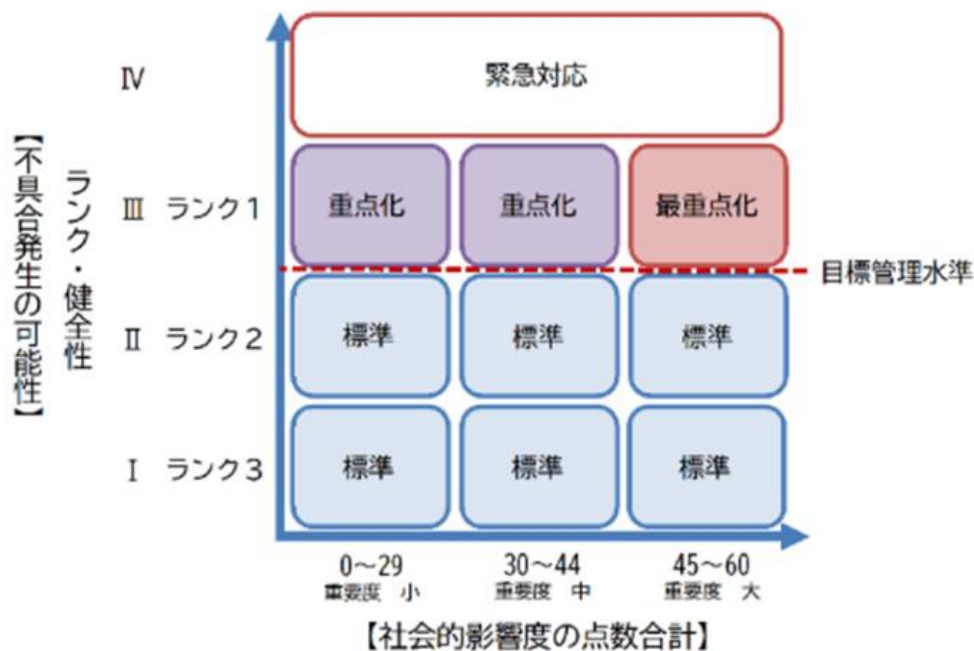

重点化指標（社会的影響度）

指標	社会的影響度			
	利用者		代替性	防災
	交通量	通学路	迂回路の有無	鉄道・道路・大河川跨ぎ
配点	20	10	10	20

5. 個別施設の状態・健全性の判定区分・目標管理水準

管理施設を対象として、5年に1回の近接目視による定期点検を実施している。

点検・診断の結果として、健全性をⅠ～Ⅳ区分に分類し、目標とする管理水準を設定している。これまでの定期点検による診断結果の割合を下記に示す。


健全性の判定区分

健全性		判定区分	定義
Ⅰ	健全	ランク 3	塗替え経過年数が15年未満かつ問題なし
Ⅱ	予防保全段階	ランク 2	塗替え経過年数が15年以上25年未満又は表面錆が局部的に見受けられる
Ⅲ	早期措置段階	ランク 1	塗替え経過年数が25年以上又は断面欠損が見受けられ表面錆が顕著
Ⅳ	緊措置段階	—	—

目標管理水準

維持管理手法	目標管理水準	限界管理水準
状態監視＋時間計画	ランク 2（健全性Ⅱ）	ランク 1（健全性Ⅲ）

診断結果の割合

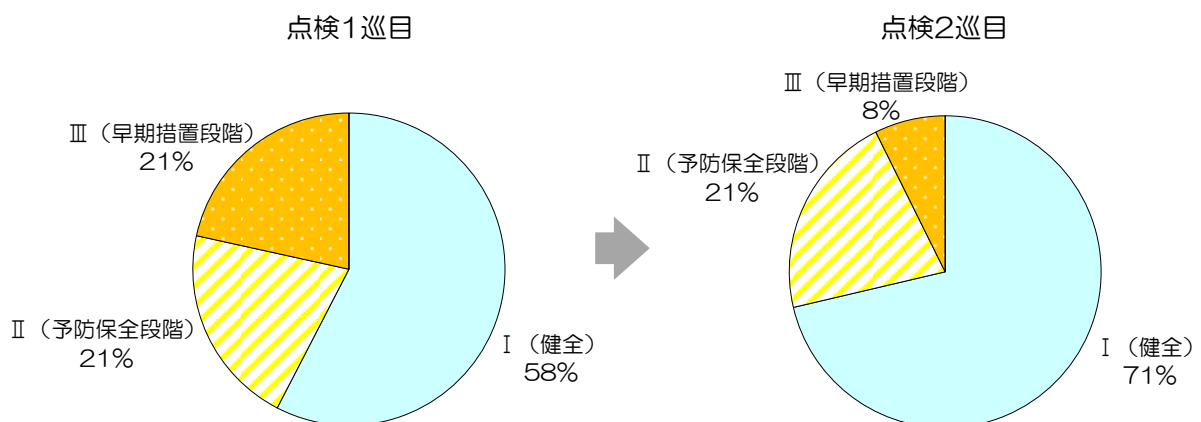

6. 対策内容と費用縮減効果

定期点検および修繕工事において、新たな技術、工法等を積極的に取り入れ、活用を検討する。新技術の導入により、コスト縮減効果（経済性）、工期短縮や手間削減などの効率化が期待される。新技術等の活用効果を以下に示す。

新技術活用の効果	
評価項目	新技術活用の効果
経済性	コスト縮減
工程	工期短縮、規制時間の短縮（交通への影響低減）
品質	点検・施工精度向上、耐久性向上
安全性	点検・施工作業時の安全性向上
施工性	工程、安全性の項目と同意
周辺環境への影響	環境負荷低減（有害物質、騒音・振動等の低減・排除）

1) 定期点検

定期点検において、従来技術よりもコスト縮減や作業時間の短縮（効率化）などの効果が見込まれる場合に、点検支援技術性能カタログに掲載のある新技術の導入を検討する。

また、上部構造と階段との接続部は狭隘であり、目視点検が困難であるため、内視鏡などを用いたの新技術を検討する。

2) 修繕工事

修繕工事において、NETIS に登録されている新技術等の活用によりコスト縮減や工期短縮、品質の向上等を図る。

今後 10 年間で修繕予定の横断歩道橋のうち、塗装塗替えが想定される 15 橋に対して、新技術を適用した場合、約 17 百万円のコスト縮減が期待できる見込みである。

※コスト縮減効果の試算は、点検支援技術性能カタログ掲載の参考単価をもとに行っているため、実際の現場条件を考慮した見積とは異なる場合がある

新技術活用によりコスト縮減効果（想定）

修繕方法	対象 橋梁数	工事費用 (百万円)	縮減費用 (百万円)
塗装塗替え工（従来技術）	15	128	17
塗装塗替え工（新技術）		111	

3）集約・撤去

今後 10 年間で社会経済情勢や利用状況等の変化に応じて、撤去条件に該当する横断歩道橋の撤去を検討する。撤去条件に該当し、今後 10 年間で 1 橋の横断歩道橋を撤去したと仮定した場合、約 41 百万円のコスト縮減効果が期待できる見込みである。

集約・撤去によるコスト縮減効果（想定）

今後 50 年間の維持管理費用		撤去費用 (百万円)	縮減費用 (百万円)
定期点検 (百万円)	修繕工事 (百万円)		
4	41	4	41

個別施設計画(横断歩道橋)

施設一覧						点検結果			点検計画	修繕計画(□:設計、○:工事)												
施設名	路線名	架設年度	延長 (m)	幅員 (m)	所在地	管理事務所名	点検 年度	判定 区分	措置状況	次回 年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	修繕内容	全体事業費 (千円)
											□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○		
城南横断歩道橋	176号	1964	16.9	1.5	大阪府池田市城南3丁目	池田土木事務所	2023	Ⅲ	措置未着手	2028		□	○								撤去工等	90,000
桜塚横断歩道橋	176号	1966	14.6	1.5	大阪府豊中市南桜塚3丁目	池田土木事務所	2023	I	—	2028												
福江横断歩道橋	176号	1967	17	1.5	大阪府豊中市日出町2丁目	池田土木事務所	2023	I	—	2028												
豊中横断歩道橋	176号	1969	45.6	4.5	大阪府豊中市本町1丁目	池田土木事務所	2023	I	—	2028												
豊島歩道橋	176号	1969	63.4	1.5	池田市豊島南1丁目	池田土木事務所	2021	I	—	2026												
神田歩道橋	176号	1970	69.7	1.5	池田市豊島北1丁目	池田土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026											塗装塗替え工等	
鯉ヶ池横断歩道橋	176号	1971	14.3	1.5	大阪府豊中市鯉ヶ池東町3丁目	池田土木事務所	2023	I	—	2028												
神州横断歩道橋	176号	1986	25.4	2.1	大阪府豊中市三園2丁目	池田土木事務所	2023	I	—	2028												
庄内東横断歩道橋	176号	1988	17.5	1.5	大阪府豊中市庄内東町4丁目	池田土木事務所	2023	Ⅱ	予防保全段階	2028											塗装塗替え工等	
稲津横断歩道橋	176号	1991	29.4	3	大阪府豊中市稲津町3丁目	池田土木事務所	2023	I	—	2028												
猪名川大橋歩道橋(南)	176号	1996	70.2	2.2	池田市神田4丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
猪名川大橋歩道橋(北)	176号	1996	38.4	2.4	池田市神田4丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
曾根横断歩道橋	176号	不明	21.6	2	大阪府豊中市服部本町4丁目	池田土木事務所	2023	I	—	2028												
瀬川第2	423号	1969	19.5	1.5	箕面市瀬川5丁目	池田土木事務所	2020	I	—	2025												
新千里南歩道橋	423号	1970	101.2	1.5	豊中市上新田1丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
上新田歩道橋	423号	1970	77.9	1.5	豊中市上新田1丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
浜歩道橋	479号	1975	71.3	2.2	豊中市浜2丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
末広歩道橋	伊丹豊中線	1969	50.8	1.5	豊中市末広町2丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
箕輪歩道橋	伊丹豊中線	1977	50.6	1.5	豊中市箕輪1丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
小野原南歩道橋	山田上小野原線	1981	35	1.5	箕面市小野原西5丁目	池田土木事務所	2021	I	—	2026												
穂積歩道橋	西宮豊中線	1967	53.2	1.5	豊中市穂積1丁目	池田土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027											塗装塗替え工等	
鯉ヶ池駅前連絡通路	大阪国際空港線	1990	47	5	豊中市鯉ヶ池中町3丁目	池田土木事務所	2021	I	—	2026												
鯉ヶ池南町北歩道橋	大阪国際空港線	1997	57.3	1.5	豊中市鯉ヶ池中町1丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
鯉ヶ池南町南歩道橋	大阪国際空港線	1997	46.7	1.5	豊中市鯉ヶ池南町3丁目	池田土木事務所	2022	I	—	2027												
庄本跨線橋(南)(歩道橋)	大阪池田線	1963	25.4	1.5	豊中市島江町2丁目	池田土木事務所	2022															

個別施設計画(横断歩道橋)

施設一覧							点検結果			点検計画	修繕計画(□:設計、○:工事)											
施設名	路線名	架設年度	延長 (m)	幅員 (m)	所在地	管理事務所名	点検 年度	判定 区分	措置状況	次回 年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	修繕内容	全体事業費 (千円)
											□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○		
知意谷歩道橋	箕面池田線	1968	38.2	2	箕面市知意谷2丁目	池田土木事務所	2021	I	—	2026												
松原歩道橋	170号	1970	47	2	高槻市南松原町	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
春日歩道橋	170号	1975	95.3	2	高槻市春日町	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
豊津歩道橋	423号	1969	67.1	2	吹田市豊津町	茨木土木事務所	2023	Ⅱ	措置着手済	2028	○										塗装塗替え工事	73.372
江の木歩道橋	423号	1969	66.8	1.5	吹田市江の木町	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
名神北歩道橋	423号	1969	46.6	1.5	吹田市江坂町3丁目	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
名神南歩道橋	423号	1969	43.9	1.5	吹田市江坂町3丁目	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
寿町歩道橋	479号	1965	19.7	1.5	吹田市寿町1丁目	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
泉町歩道橋	479号	1968	19.5	1.5	吹田市泉町2丁目	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
江の木町歩道橋	479号	1970	18.9	1.5	吹田市江の木町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
広芝歩道橋	479号	1987	45.3	2.2	吹田市広芝町1丁目	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
駅前町歩道橋	茨木寝屋川線	1969	35.2	1.5	茨木市駅前町1丁目	茨木土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027											塗装塗替え工事	
大法寺歩道橋	茨木寝屋川線	1970	29.5	1.5	茨木市西駅前町3	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
安威川新橋取付歩道橋(寝屋川行北側)	茨木寝屋川線	不明	未登録	1.6	茨木市野々宮	茨木土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027											塗装塗替え工事	
安威川新橋取付歩道橋(茨木行南側)	茨木寝屋川線	不明	未登録	1.6	摂津市島飼八町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
安威川新橋取付歩道橋(寝屋川行南側)	茨木寝屋川線	不明	未登録	1.6	摂津市島飼八町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
安威川新橋取付歩道橋(茨木行北側)	茨木寝屋川線	不明	14.4	1.6	茨木市野々宮	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
山田歩道橋	茨木摂津線	1969	28.5	1.5	吹田市桜切山	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
平成調和歩道橋	茨木摂津線	1990	40	3	吹田市万博公園	茨木土木事務所	2023	Ⅱ	予防保全段階	2028											塗装塗替え工事	
大吹橋取付歩道橋(北)(下り)	新大阪高槻京都線	1996	112.4	2	大阪府吹田市南吹田	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
大吹橋取付歩道橋(北)(上り)	新大阪高槻京都線	1996	45.2	2.1	大阪府吹田市南吹田	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
芥川歩道橋	西京高槻線	1976	16.8	1.5	高槻市真上町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
豊川駅歩道橋	大阪モノレール	2005	61.4	3	茨木市豊川	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
南茨木駅歩道橋	大阪モノレール	不明	64.6	3.1	茨木市沢良宜西	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
万博記念公園駅歩道橋	大阪モノレール	不明	167.6	7.2	吹田市千里万博公園	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
彩都西駅歩道橋	大阪モノレール	不明	21.2	3	茨木市彩都あさぎ	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
東片山歩道橋	大阪高槻京都線	1965	35.3	2	吹田市片山町	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
味舌歩道橋	大阪高槻京都線	1966	53.4	1.5	摂津市千里丘	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
西の庄歩道橋	大阪高槻京都線	1968	55.5	2.3	吹田市西の庄町	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
西駅前歩道橋	大阪高槻京都線	1968	127.1	1.5	茨木市中穂積	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
千里丘歩道橋	大阪高槻京都線	1968	41.8	2	吹田市千里丘上	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
春日歩道橋	大阪高槻京都線	1970	41.4	1.2	高槻市春日町	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
鶴野歩道橋	大阪高槻京都線	1975	52.5	2.3	摂津市鶴野	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
吹田東小学校前歩道橋	大阪高槻京都線	1975	17.9	2.3	吹田市吹東町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
芝生大橋取付歩道橋(摂津行南側)	大阪高槻京都線	1997	60.7	1.5	高槻市唐崎北	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
芝生大橋取付歩道橋(高槻行南側)	大阪高槻京都線	1997	34.7	2	高槻市唐崎北	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
学園町歩道橋	大阪高槻京都線	1998	195.8	2	摂津市学園町2丁目	茨木土木事務所	2021	I	—	2026												
芝生大橋取付歩道橋(摂津行北側)	大阪高槻京都線	不明	未登録	1.5	高槻市堤町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
玉島橋取付歩道橋(摂津行南側)	大阪高槻京都線	不明	未登録	3	茨木市野々宮2丁目	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
玉島橋取付歩道橋(高槻行南側)	大阪高槻京都線	不明	未登録	2.5	茨木市玉島2丁目	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
玉島橋取付歩道橋(高槻行北側)	大阪高槻京都線	不明	未登録	2.5	茨木市目垣1丁目	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
玉島橋取付歩道橋(摂津行北側)	大阪高槻京都線	不明	未登録	2.5	0	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
芝生大橋取付歩道橋(高槻行北側)	大阪高槻京都線	不明	12.8	2	高槻市堤町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
島飼野々歩道橋	大阪高槻線	1969	26	1.5	摂津市島飼野々	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
西面歩道橋	大阪高槻線	1970	13.5	1.2	高槻市西面北町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
芝生歩道橋	大阪高槻線	1970	15.2	1.2	高槻市芝生町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
柱本歩道橋	大阪高槻線	1975	29.3	1.5	高槻市柱本	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
別府歩道橋	大阪高槻線	1978	25.5	1.5	摂津市別府町	茨木土木事務所	2022	I	—	2027												
弘濟院歩道橋	大阪中央環状線	1965	83	2	吹田市津雲台	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	

個別施設計画(横断歩道橋)

施設一覧							点検結果			点検計画	修繕計画(□:設計、○:工事)													修繕内容	全体事業費 (千円)
施設名	路線名	架設年度	延長 (m)	幅員 (m)	所在地	管理事務所名	点検 年度	判定 区分	措置状況	次回 年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
											□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○			
摂津歩道橋	大阪中央環状線	1968	135	2.4	摂津市三島	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026												塗装塗替え工等			
一津屋歩道橋	大阪中央環状線	1969	77	1.5	摂津市一津屋	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026												塗装塗替え工等			
味舌橋取付歩道橋(池田行北側)	大阪中央環状線	1971	47.8	1.5	摂津市学園町2丁目	茨木土木事務所	2022	Ⅲ	措置未着手	2027	○											当て板補修			
鶴野橋取付歩道橋(堺行北側)	大阪中央環状線	1971	26.4	2	摂津市三島	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
美沢歩道橋	大阪中央環状線	1973	111.6	1.8	茨木市美沢町	茨木土木事務所	2021	Ⅱ	予防保全段階	2026	□	○										耐震・塗装塗替	105,864		
下穂積第二歩道橋	大阪中央環状線	1975	35.8	2.5	茨木市松ヶ本	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
味舌橋取付歩道橋(池田行南側)	大阪中央環状線	1980	未登録	2.1	摂津市三島1丁目	茨木土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027												塗装塗替え工等			
奈良跨線橋側道橋(堺行)	大阪中央環状線	1980	22.1	1.9	茨木市若草町	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
奈良跨線橋側道橋(池田行)	大阪中央環状線	1980	22.1	1.9	茨木市天王2丁目	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
鶴野橋取付歩道橋(池田行北側)	大阪中央環状線	1981	25.9	2	摂津市三島2丁目	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
鶴野橋取付歩道橋(池田行南側)	大阪中央環状線	1981	23.2	2	摂津市東別府1丁目	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
宇野辺下穂積歩道橋	大阪中央環状線	1990	264.7	2.5	茨木市宇野辺	茨木土木事務所	2023	I	―	2028	□	○	○									耐震・塗装塗替	176,061		
鶴野橋取付歩道橋(堺行南側)	大阪中央環状線	1990	21.1	2	摂津市安威川南町	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
沢良宜駅歩道橋	大阪中央環状線	1997	219.8	3.6	茨木市高浜町	茨木土木事務所	2023	I	―	2028															
南摂津駅歩道橋	大阪中央環状線	1997	149	4	摂津市東一津屋	茨木土木事務所	2023	I	―	2028															
富田小学校前歩道橋	島飼八丁富田線	1980	18.8	2	高槻市富田町	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
南春日丘歩道橋	南千里茨木停車場線	1977	19.3	1.5	茨木市南春日丘	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
競技場前歩道橋	南千里茨木停車場線	1987	60.2	3	吹田市千里万博公園	茨木土木事務所	2022	I	―	2027		○										落橋防止工	25,000		
中穂積歩道橋	南千里茨木停車場線	1989	28.7	1.5	茨木市中穂積2丁目	茨木土木事務所	2022	Ⅱ	予防保全段階	2027												塗装塗替え工等			
競技場西歩道橋	南千里茨木停車場線	1997	41.8	3	吹田市千里万博公園	茨木土木事務所	2022	I	―	2027															
竹橋歩道橋	八尾茨木線	1977	17.3	1.5	茨木市竹橋町	茨木土木事務所	2022																		

個別施設計画(横断歩道橋)

施設一覧							点検結果			点検計画	修繕計画(□:設計、○:工事)											
施設名	路線名	架設年度	延長 (m)	幅員 (m)	所在地	管理事務所名	点検 年度	判定 区分	措置状況	次回 年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	修繕内容	全体事業費 (千円)
											□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○		
緑町歩道橋	479号	1969	132.4	2	守口市緑町	枚方土木事務所	2021	I	—	2026	○											108,356
梅園歩道橋	479号	1969	35.4	2	守口市梅園町	枚方土木事務所	2021	I	—	2026												
滝井歩道橋	479号	1970	20.6	1.5	守口市平代町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
池田歩道橋	京都守口線	1968	41.8	1.5	寝屋川市池田3丁目	枚方土木事務所	2022	II	手防保全段階	2027											塗装塗替え工等	
仁和寺横断歩道橋	京都守口線	1969	33.3	1.5	寝屋川市仁和寺町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
御殿山歩道橋	京都守口線	1971	16.7	1.5	枚方市御殿山町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
磯島歩道橋	京都守口線	1972	15.2	1.5	門真市磯島元町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
阪歩道橋	京都守口線	1975	18.2	1.5	枚方市牧野阪1丁目	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
天野が原歩道橋	交野久御山線	1975	16.5	1.5	交野市天野が原5丁目	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
鞍屋歩道橋	私市太秦線	1982	35.2	1.5	大阪府寝屋川市鞍屋1丁目	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
三ツ島歩道橋	深野南寺方大坂線	1971	35.1	1.5	門真市三ツ島	枚方土木事務所	2021	I	—	2026												
長尾谷町歩道橋	杉田口禁野線	1978	17.6	1.5	枚方市長尾谷町1丁目	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
門真駅南北連絡通路橋	大坂モノレール	1997	185.1	3.2	大阪府門真市新橋町	枚方土木事務所	2023	I	—	2028												
大日駅連絡通路橋	大坂モノレール	2007	48.8	6.1	大阪府守口市大日町	枚方土木事務所	2023	I	—	2028												
南郷歩道橋	大版生駒線	1969	17	1.5	大東市太子町1丁目	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
竜間歩道橋	大版生駒線	1970	52.3	1.5	大東市大字龍間	枚方土木事務所	2021	III	措置未着手	2026	—	○									塗装塗替え工等	100,000
山上ロバストップ歩道橋	大版生駒線	1970	51.9	1.5	大東市大字龍間	枚方土木事務所	2021	II	措置完了済	2026											塗装塗替え工等	
新田歩道橋	大版生駒線	1972	51.8	1.5	大東市新田本町	枚方土木事務所	2021	I	—	2026												
門真北歩道橋	大版中央環状線	1968	52.2	1.5	門真市泉町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027	○	○										32,040
門真南歩道橋	大版中央環状線	1969	81	1.5	門真市新橋町	枚方土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026											塗装塗替え工等	
松葉西歩道橋	大版中央環状線	1980	110.5	2	門真市松葉町	枚方土木事務所	2021	I	—	2026												
門真市釋島歩道橋	大版中央環状線	2010	389.5	3.2	門真市釋島	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
仁和寺南歩道橋	八尾茨木線	1987	45.7	2	寝屋川市仁和寺本町2丁目	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
仁和寺東歩道橋	八尾茨木線	1987	30.1	2.1	寝屋川市仁和寺本町1丁目	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
仁和寺西歩道橋	八尾茨木線	1987	111.2	2.1	寝屋川市仁和寺本町1丁目	枚方土木事務所	2021	I	—	2026												
木田歩道橋	八尾枚方線	1968	19.3	1.5	寝屋川市木田元宮1丁目	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
四宮歩道橋	八尾枚方線	1969	39.6	1.5	門真市北岸和田	枚方土木事務所	2021	I	—	2026												
西沖橋歩道橋	八尾枚方線	1970	15.6	1.5	寝屋川市大成町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
米野横断歩道橋	八尾枚方線	1981	48	1.2	大東市米野1丁目	枚方土木事務所	2021	I	—	2026												
守口小学校前歩道橋	北大日竜田線	1971	19.4	1.5	守口市八島町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
中宮歩道橋	枚方茨木線	1972	24.8	1.5	枚方市松丘町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
茄子作歩道橋	枚方交野寝屋川線	1977	15.5	1.5	枚方市茄子作	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
明和歩道橋	枚方富田林泉佐野線	1971	11.3	1.5	寝屋川市打上高塚町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
清瀬歩道橋	枚方富田林泉佐野線	1997	28.6	2	四條畷市大字清瀬	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
打上歩道橋	枚方富田林泉佐野線	2003	36	2	寝屋川市打上	枚方土木事務所	2021	I	—	2026												
春日歩道橋	木屋交野線	1969	17	1.5	高槻市春日町	枚方土木事務所	2022	I	—	2027												
六万寺歩道橋	170号	1968	44.8	1.5	東大阪市六万寺町	八尾土木事務所	2021	II	手防保全段階	2026											塗装塗替え工等	
若草歩道橋	170号	1968	40.2	1.5	東大阪市若草町	八尾土木事務所	2021	II	手防保全段階	2026											塗装塗替え工等	
植付歩道橋	170号	1969	40.2	1.5	東大阪市西石切町	八尾土木事務所	2021	I	—	2026												
善根寺歩道橋	170号	1971	47.1	1.5	東大阪市善根寺町	八尾土木事務所	2021	II	手防保全段階	2026											塗装塗替え工等	
恩智歩道橋	170号	1971	61.1	2.3	八尾市恩智北町	八尾土木事務所	2021	I	—	2026												
新町歩道橋	170号	1973	69.4	1.5	東大阪市新町	八尾土木事務所	2021	II	手防保全段階	2026											塗装塗替え工等	
高井田歩道橋	308号	1969	59.4	1.9	東大阪市高井田中	八尾土木事務所	2022	II	手防保全段階	2027				□							塗装塗替え工等	46,182
長田歩道橋	308号	1969	57.7	1.9	東大阪市長田西	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
水走歩道橋	308号	1970	80.4	1.9	東大阪市水走	八尾土木事務所	2022	II	手防保全段階	2027				□							塗装塗替え工等	62,509
春宮歩道橋(国道308号)	308号	1970	74.2	2.1	東大阪市荒本北	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
西石切歩道橋(北側)	308号	1998	34.1	2.4	東大阪市水走	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
西石切歩道橋(南側)	308号	1998	29	2.4	東大阪市水走	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
東鴻池歩道橋	石切大坂線	1972	39.8	1.9	東大阪市東鴻池町	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												

個別施設計画(横断歩道橋)

施設一覧							点検結果			点検計画	修繕計画(□:設計、○:工事)											
施設名	路線名	架設年度	延長 (m)	幅員 (m)	所在地	管理事務所名	点検 年度	判定 区分	措置状況	次回 年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	修繕内容	全体事業費 (千円)
											□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○		
北宮歩道橋	石切大阪線	1972	32.1	1.9	東大阪市吉原	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
植松歩道橋	大阪中央環状線	1965	41.1	1.7	八尾市植松町	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
意岐部歩道橋	大阪中央環状線	1968	133.1	1.9	大阪府東大阪市荒本西	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
佐堂歩道橋	大阪中央環状線	1969	152.4	1.5	八尾市佐堂町	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026	□	□○	○								耐震補強工事	120,000
新家歩道橋	大阪中央環状線	1969	95.2	1.5	東大阪市新家町	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026	○										耐震補強工事	112,290
赤宮歩道橋	大阪中央環状線	1970	133.1	1.9	東大阪市荒本西	八尾土木事務所	2022	II	措置着手済	2027	○										塗装塗替え工事	152,000
久宝寺口歩道橋	大阪中央環状線	1970	105.4	3	八尾市末広町	八尾土木事務所	2021	II	措置着手済	2026	□○	□○									塗装塗替工事等(委託なし、工事R7) 耐震補強(委託R7-8、工事R8)	120,000
亀井歩道橋	大阪中央環状線	1971	128.7	1.5	八尾市亀井町	八尾土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
池島歩道橋	大阪東大阪線	1972	41.1	1.9	東大阪市池島町	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
若江歩道橋	大阪東大阪線	1982	67.1	2.7	東大阪市若江南町	八尾土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027											塗装塗替え工事	
寿町歩道橋	大阪八尾線	1968	39.3	1.8	吹田市寿町1丁目	八尾土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027											塗装塗替え工事	
久宝寺歩道橋	大阪八尾線	1970	42.7	1.9	八尾市久宝寺	八尾土木事務所	2022	II	措置完了済	2027											塗装塗替え工事	
ライオンズ歩道橋	大阪枚岡奈良線	1968	35.9	1.9	東大阪市西堤学園町	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
新家歩道橋	八尾茨木線	1970	43.1	1.9	東大阪市新家町	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
山本北歩道橋	八尾茨木線	1970	45.3	1.9	八尾市山本北町	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
菱江歩道橋(菱屋東歩道橋)	八尾枚方線	1968	39.8	1.9	東大阪市稲葉	八尾土木事務所	2022	I	—	2027												
古堂歩道橋	170号	1969	39.3	1.5	羽曳野市豊田	富田林土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	○										塗装塗替え工事	33,300
沢田歩道橋	170号	1969	229.4	1.5	藤井寺市沢田	富田林土木事務所	2023	I	—	2028												
新堂歩道橋	170号	1970	41.1	1.2	松原市新堂	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
西浦東歩道橋	170号	1973	56.2	1.5	羽曳野市東阪田	富田林土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	○										塗装塗替え工事	47,453
野作歩道橋	170号	1975	66.5	1.5	河内長野市野作町	富田林土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	○										塗装塗替え工事	55,778
緑ヶ丘歩道橋	170号	1975	61.1	1.5	富田林市緑ヶ丘町	富田林土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	○										塗装塗替え工事	51,615
富美ヶ丘歩道橋	170号	1977	198	2	富田林市寿町	富田林土木事務所	2021	III	措置未着手	2026		○									塗装塗替え工事	179,566
軽里北歩道橋	170号	1978	169.5	2	羽曳野市軽里	富田林土木事務所	2023	II	予防保全段階	2028											塗装塗替え工事	
西浦北歩道橋	170号	1979	48	1.5	羽曳野市西浦	富田林土木事務所	2021	III	措置完了済	2026											塗装塗替え工事	
軽里南歩道橋	170号	1979	56.2	1.5	羽曳野市軽里	富田林土木事務所	2021	I	—	2026												
野中歩道橋	170号	1980	55.1	1.5	藤井寺市野中	富田林土木事務所	2021	III	措置完了済	2026											塗装塗替え工事	
桜ヶ丘歩道橋	170号	1980	149.7	2	富田林市桜ヶ丘町	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
錦ヶ丘歩道橋	170号	1980	49.3	1.5	富田林市緑ヶ丘町	富田林土木事務所	2021	I	—	2026												
向野歩道橋	170号	1981	54.4	1.5	河内長野市向野町	富田林土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026											塗装塗替え工事	
市町歩道橋	170号	1981	69.6	2	河内長野市市町	富田林土木事務所	2021	I	—	2026												
昭和町歩道橋	170号	1982	88.2	1.5	富田林市若松町西	富田林土木事務所	2022	I	—	2027												
新家歩道橋	170号	1987	335.2	2	東大阪市新家町	富田林土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	○										塗装塗替え工事	279,720
新堂歩道橋	309号	1967	48.8	1.5	松原市新堂	富田林土木事務所	2021	III	措置完了済	2026											塗装塗替え工事	
阿保歩道橋	309号	1969	47	1.5	松原市阿保	富田林土木事務所	2021	III	措置完了済	2026	○										塗装塗替え工事	41,122
松ヶ丘歩道橋	310号	1975	45.4	1.5	河内長野市松ヶ丘中町	富田林土木事務所	2021	I	—	2026												
天見歩道橋	371号	1968	25.1	1.5	河内長野市天見	富田林土木事務所	2023	I	—	2028												
三日市歩道橋	371号	1973	36.6	1.5	河内長野市三日市町	富田林土木事務所	2022	I	—	2027												
喜多歩道橋	371号	1976	21	1.5	河内長野市喜多町	富田林土木事務所	2021	III	措置完了済	2026											断面修復工事	
上田歩道橋	371号	1978	28.3	1.5	河内長野市上田町	富田林土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	○										下部工補修工事	35,000
加賀田東歩道橋	371号	1989	147.1	2.1	河内長野市加賀田	富田林土木事務所	2021	III	措置着手済	2026	○										塗装塗替え工事	129,371
東條歩道橋	甘南備川向線	1971	37.7	1.5	富田林市佐備	富田林土木事務所	2023	II	予防保全段階	2028											塗装塗替え工事	
大堀北歩道橋	都戸大堀線	2000	38.8	2	松原市大堀	富田林土木事務所	2023	I	—	2028												
岡歩道橋	堺羽曳野線	1969	55.4	1.5	松原市岡	富田林土木事務所	2022	I	—	2027												
野々上歩道橋	堺羽曳野線	1970	47.5	1.5	羽曳野市野々上	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027											塗装塗替え工事	
狭山工区歩道橋	堺狭山線	1971	50	1.5	大阪狭山市池之原三丁目	富田林土木事務所	2023	I	—	2028												
南新町歩道橋	堺大和高田線	1968	45	1.5	松原市南新町	富田林土木事務所	2022	I	—	2027												
三宅中歩道橋	住吉八尾線	1981	51.4	1.5	富田林市三宅中	富田林土木事務所	2023	III	措置着手済	2028	○										塗装塗替え工事	26,681

個別施設計画(横断歩道橋)

施設一覧							点検結果			点検計画	修繕計画(□:設計、○:工事)											修繕内容	全体事業費 (千円)
施設名	路線名	架設年度	延長 (m)	幅員 (m)	所在地	管理事務所名	点検 年度	判定 区分	措置状況	次回 年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
											□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○	□or○		
平田歩道橋	森屋狭山線	1971	67.7	2	大阪狭山市平田	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
久野喜台歩道橋	森屋狭山線	1978	93.8	2	富田林市久野喜台	富田林土木事務所	2023	I	—	2028													
大堀新町橋	大堀羽曳野線	2021	24	未登録	松原市大堀4丁目	富田林土木事務所	2023	I	—	2028													
天美西歩道橋	大阪狭山線	1978	47.2	1.5	松原市天美西	富田林土木事務所	2023	II	予防保全段階	2028												塗装塗替え工等	
大堀歩道橋	大阪中央環状線	1968	104.4	1.5	松原市大堀	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027												塗装塗替え工等	
インター歩道橋A	大阪中央環状線	1968	53	2	松原市大堀	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027												塗装塗替え工等	
インター西歩道橋	大阪中央環状線	1969	42.3	1.5	松原市大堀	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027												塗装塗替え工等	
西大塚歩道橋	大阪中央環状線	1969	75	1.5	松原市大塚	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
別所歩道橋	大阪中央環状線	1977	90	1.5	高槻市別所本町	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
紫壇歩道橋	大阪中央環状線	1979	80.6	1.5	松原市紫壇	富田林土木事務所	2022	II	予防保全段階	2027												塗装塗替え工等	
インター歩道橋B	大阪中央環状線	1981	86.1	3	松原市大堀	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
新大堀歩道橋	大阪中央環状線	1992	259.4	2	松原市大堀	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
三宅歩道橋	大堀驛線	1970	36.2	1.5	松原市三宅	富田林土木事務所	2023	I	—	2028													
羽曳野IC前歩道橋	美原太子線	2004	596.1	2	羽曳野市尺度	富田林土木事務所	2023	I	—	2028													
錦織歩道橋	富田林泉大津線	1975	34.9	1.5	富田林市錦織南	富田林土木事務所	2022	I	—	2027													
北田中歩道橋	170号	1992	52	1.5	和泉市北田中町	鳳土木事務所	2021	III	措置未着手	2026	□	○									塗装塗替、補修	31,918	
南面利歩道橋	170号	1997	64	3	和泉市南面利	鳳土木事務所	2021	I	—	2026													
国府なかよし歩道橋	480号	1987	64.5	1.5	和泉市府中町	鳳土木事務所	2022	I	—	2027													
緑園歩道橋	泉大津美原線	1968	82.1	1.5	高石市緑園	鳳土木事務所	2021	I	—	2026													
上町歩道橋	泉大津美原線	1969	97.3	2.3	和泉市上町	鳳土木事務所	2021	I	—	2026													
取石歩道橋	泉大津美原線	1982	78.8	1.8	高石市取石	鳳土木事務所	2022	I	—	2027													
高石大橋歩道橋	大阪臨海線	1970	85.2	3	高石市高師浜	鳳土木事務所	2022	I	—	2027	○										塗装塗替等	106,145	
高砂歩道橋	大阪臨海線	1980	85.2	3	高石市高砂	鳳土木事務所	2022	I	—	2027													
和気歩道橋	大阪和泉南線	1986	122.2	2	和泉市和気町	鳳土木事務所	2022	I	—	2027													
松之浜歩道橋	富田林泉大津線	1980	169.7	2	泉大津市松之浜町	鳳土木事務所	2021	III	措置未着手	2026	○										塗装塗替え工等	128,257	
池上歩道橋	富田林泉大津線	1999	84.6	2.1	和泉市池上町	鳳土木事務所	2022	I	—	2027													
長滝歩道橋	481号	1994	227.4	2.7	泉佐野市 長滝	岸和田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026	□										塗装塗替え工等	不明	
大芝歩道橋	岸和田牛滝山貝塚線	1969	19.6	1.9	岸和田市 磯上町	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													
天の川歩道橋(上)	岸和田牛滝山貝塚線	1974	25	1.9	岸和田市 磯上町1丁目～吉井町2丁目	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													
天の川歩道橋(下)	岸和田牛滝山貝塚線	1974	21	1.9	岸和田市 磯上町1丁目～吉井町1丁目	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													
中井町歩道橋	岸和田牛滝山貝塚線	1975	45	1.5	岸和田市 中井町	岸和田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026	□										塗装塗替え工等	不明	
JR歩道橋	岸和田牛滝山貝塚線	1988	88.7	2.2	岸和田市西大路町	岸和田土木事務所	2024	I	—	2029													
貝塚西歩道橋	堺阪南線	1967	40.6	1.5	貝塚市 西町	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026													
朝陽歩道橋	堺阪南線	1968	47	1.5	岸和田市 上野町	岸和田土木事務所	2021	II	予防保全段階	2026											塗装塗替え工等		
臨浜歩道橋	堺阪南線	1968	46.2	1.5	貝塚市 臨浜	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026													
春木歩道橋	堺阪南線	1969	45.3	1.5	岸和田市 春木若松町	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026													
堺町歩道橋	堺阪南線	1983	94	1.5	岸和田市 堺町	岸和田土木事務所	2021	I	—	2026													
三ツ松歩道橋	水間和泉橋本停車場線	1970	18	2	貝塚市 三ツ松	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													
泉南マリンブリッジ歩道橋(海側)	泉佐野岩出線	1993	138	未登録	泉南市岡田	岸和田土木事務所	2023	II	予防保全段階	2028											塗装塗替え工等		
泉南マリンブリッジ歩道橋(山側)	泉佐野岩出線	1993	138	未登録	泉南市岡田	岸和田土木事務所	2023	II	予防保全段階	2028											塗装塗替え工等		
4号歩道橋	泉佐野岩出線	1994	35.7	9.8	泉佐野市 りんくう往来南	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													
りんくう往来南歩道橋	泉佐野岩出線	2008	134.9	4.1	泉佐野市りんくう往来南	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													
新7号歩道橋	泉佐野岩出線	2020	81.2	未登録	泉佐野市りんくう往来南	岸和田土木事務所	2023	I	—	2028													
3号歩道橋	大阪臨海線	1994	38.6	9	泉佐野市 りんくう従来北	岸和田土木事務所	2023	I	—	2028													
1号歩道橋	大阪臨海線	1994	35.7	6.8	泉佐野市 りんくう往来北	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													
2号歩道橋	大阪臨海線	1994	35.7	6.8	泉佐野市 りんくう往来北	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													
近木川歩道橋(下流側)	大阪臨海線	1999	173.6	未登録	貝塚市臨浜～沢	岸和田土木事務所	2023	I	—	2028													
近木川歩道橋(上流側)	大阪臨海線	1999	71.2	未登録	貝塚市臨浜～沢	岸和田土木事務所	2023	I	—	2028													
麻生中歩道橋	大阪和泉南線	1968	12.2	1.9	貝塚市 麻生中	岸和田土木事務所	2022	I	—	2027													

個別施設計画(横断歩道橋)

[illegible]
