

工事中		工事完了	
③ 青木あすなろ・協和興業種間特定 J V R3.3.25~R8.12.15	⑳ 中林建設(株) R7.3.25~R10.2.29	① 奥村組土木興業(株) R2.12~R6.4	⑯ (株)駒井ハルテック R5.3~R7.12
⑥ 森本組・新土木開発 J V R3.10.12~R10.5.31	㉑ 中林建設・タカコンストラクション特定 J V R7.3.25~R10.2.29	② (株)ハンソン建設 R2.12~R4.10	⑰ 中林建設(株) R5.12~R7.8
⑪ 東洋建設・修成建設コンサルtant J V R4.12.21~R9.9.30	㉒ (株)浅沼組大阪本店 R7.3.25~R11.2.28	④ (株)五大コーポレーション大阪支店 R3.7~R5.2	㉓ (株)M・B・W R7.3~R7.7
⑭ (株)森組大阪本店 R5.3.20~R8.6.30	㉔ (株)IHインフラシステム 事業戦略本部戦略第1部 R7.3.25~R10.5.31	⑤ 中林建設(株) R3.7~R5.12	
⑮ 鉄建建設(株)大阪支店 R5.3.20~R9.1.29	㉕ 大鉄・イチエスケイ特定 J V R7.12.1~R13.2.28	⑦ 大日本土木・全日本コンサルタント J V R3.10~R7.1	
⑯ (株)森組大阪本店 R5.3.20~R9.1.29	⑳ 戸田・ハンソン特定 J V R7.10.21~R11.2.28	⑧ 川田工業(株) R3.12~R6.6	
㉑ 宮地エンジニアリング(株)大阪支社 R6.3.25~R12.1.31	㉖ (株)森本組 大阪支店 R7.7.1~R10.9.29	⑨ 瀬上工業(株) R3.12~R6.2	
㉒ 川田工業(株)大阪支社 R6.3.25~R8.9.30	㉗ 奥村・中林・大勝特定 J V R7.10.21~R13.10.31	⑩ (株)森組大阪本店 R4.12~R8.2	
㉓ 鉄建・岩田地崎 J V R6.3.25~R10.2.29	㉘ 岸本・奈良 J V R7.6.18~R11.8.31	⑪ 岸本建設(株)大阪営業所 R4.12~R7.1	
㉔ (株)大林組 R6.6.17~R10.6.30	㉙ 高田機工(株) R8.3.25~R11.2.28	⑫ ヤマト工業(株) R4.12~R6.11	
㉕ 中林建設(株) R6.12.17~R8.11.27		⑬ (株)ハンソン建設 R5.3~R7.2	

路線計画図

詳細設計発注状況


R8.4.1現在

設計中

- ㉔ パシフィックコンサルタンツ(株)
R4.10.12 ~ R9.2.24
- ㉔ 八千代エンジニアリング(株)
R4.10.20 ~ R9.2.24

完了

- ① ㈱一ニチコンサルタント
R2.8.4 ~ R7.2.26
- ② 八千代エンジニアリング(株)
R2.9.9 ~ R5.2.28
- ③ ㈱一ニチコンサルタント
R1.6.5 ~ R2.11.30
- ④ ㈱復建技術コンサルタント
R2.9.17 ~ R6.2.28
- ⑤ パシフィックコンサルタンツ(株)
R3.3.12 ~ R5.3.15
- ⑥ ㈱エイト日本技術開発
R3.6.14 ~ R6.2.28
- ⑦ ㈱復建技術コンサルタント
R2.9.17 ~ R7.2.26
- ⑧ 復建調査設計(株)
R1.11.6 ~ R3.2.26
- ⑨ 中央復建コンサルタンツ(株)
R3.3.22 ~ R5.3.15
- ⑩ 中央復建コンサルタンツ(株)
R2.9.15 ~ R4.8.16
- ⑪ セントラルコンサルタンツ(株)
R2.9.14 ~ R4.2.28
- ⑫ ㈱一ニチコンサルタント
R3.6.11 ~ R5.2.28
- ⑬ 復建調査設計(株)
R3.6.8 ~ R5.2.28
- ⑭ ㈱一ニチコンサルタント
R1.11.12 ~ R4.2.28
- ⑮ ㈱復建技術研究所
R3.3.22 ~ R7.3.12
- ⑯ ㈱エイト日本技術開発
R2.9.23 ~ R5.2.28
- ⑰ セントラルコンサルタンツ(株)
R2.9.14 ~ R4.2.28
- ⑱ ㈱復建技術コンサルタント
R2.7.27 ~ R5.2.28
- ⑲ 協和設計(株)
R2.7.28 ~ R5.2.28
- ⑳ セントラルコンサルタンツ(株)
R3.6.11 ~ R5.2.28
- ㉑ 復建調査設計(株)
R2.7.29 ~ R4.2.28
- ㉒ パシフィックコンサルタンツ(株)
R2.7.27 ~ R4.2.28
- ㉓ ㈱復建技術コンサルタント
R3.6.7 ~ R5.2.28
- ㉔ 中央復建コンサルタンツ(株)
R3.8.6 ~ R5.2.28
- ㉕ ジェアール西日本コンサルタンツ(株)
R4.6.24 ~ R8.2.25
- ㉖ 中央復建コンサルタンツ(株)
R4.6.17 ~ R7.2.26
- ㉗ ㈱復建技術コンサルタント
R4.6.27 ~ R7.2.26

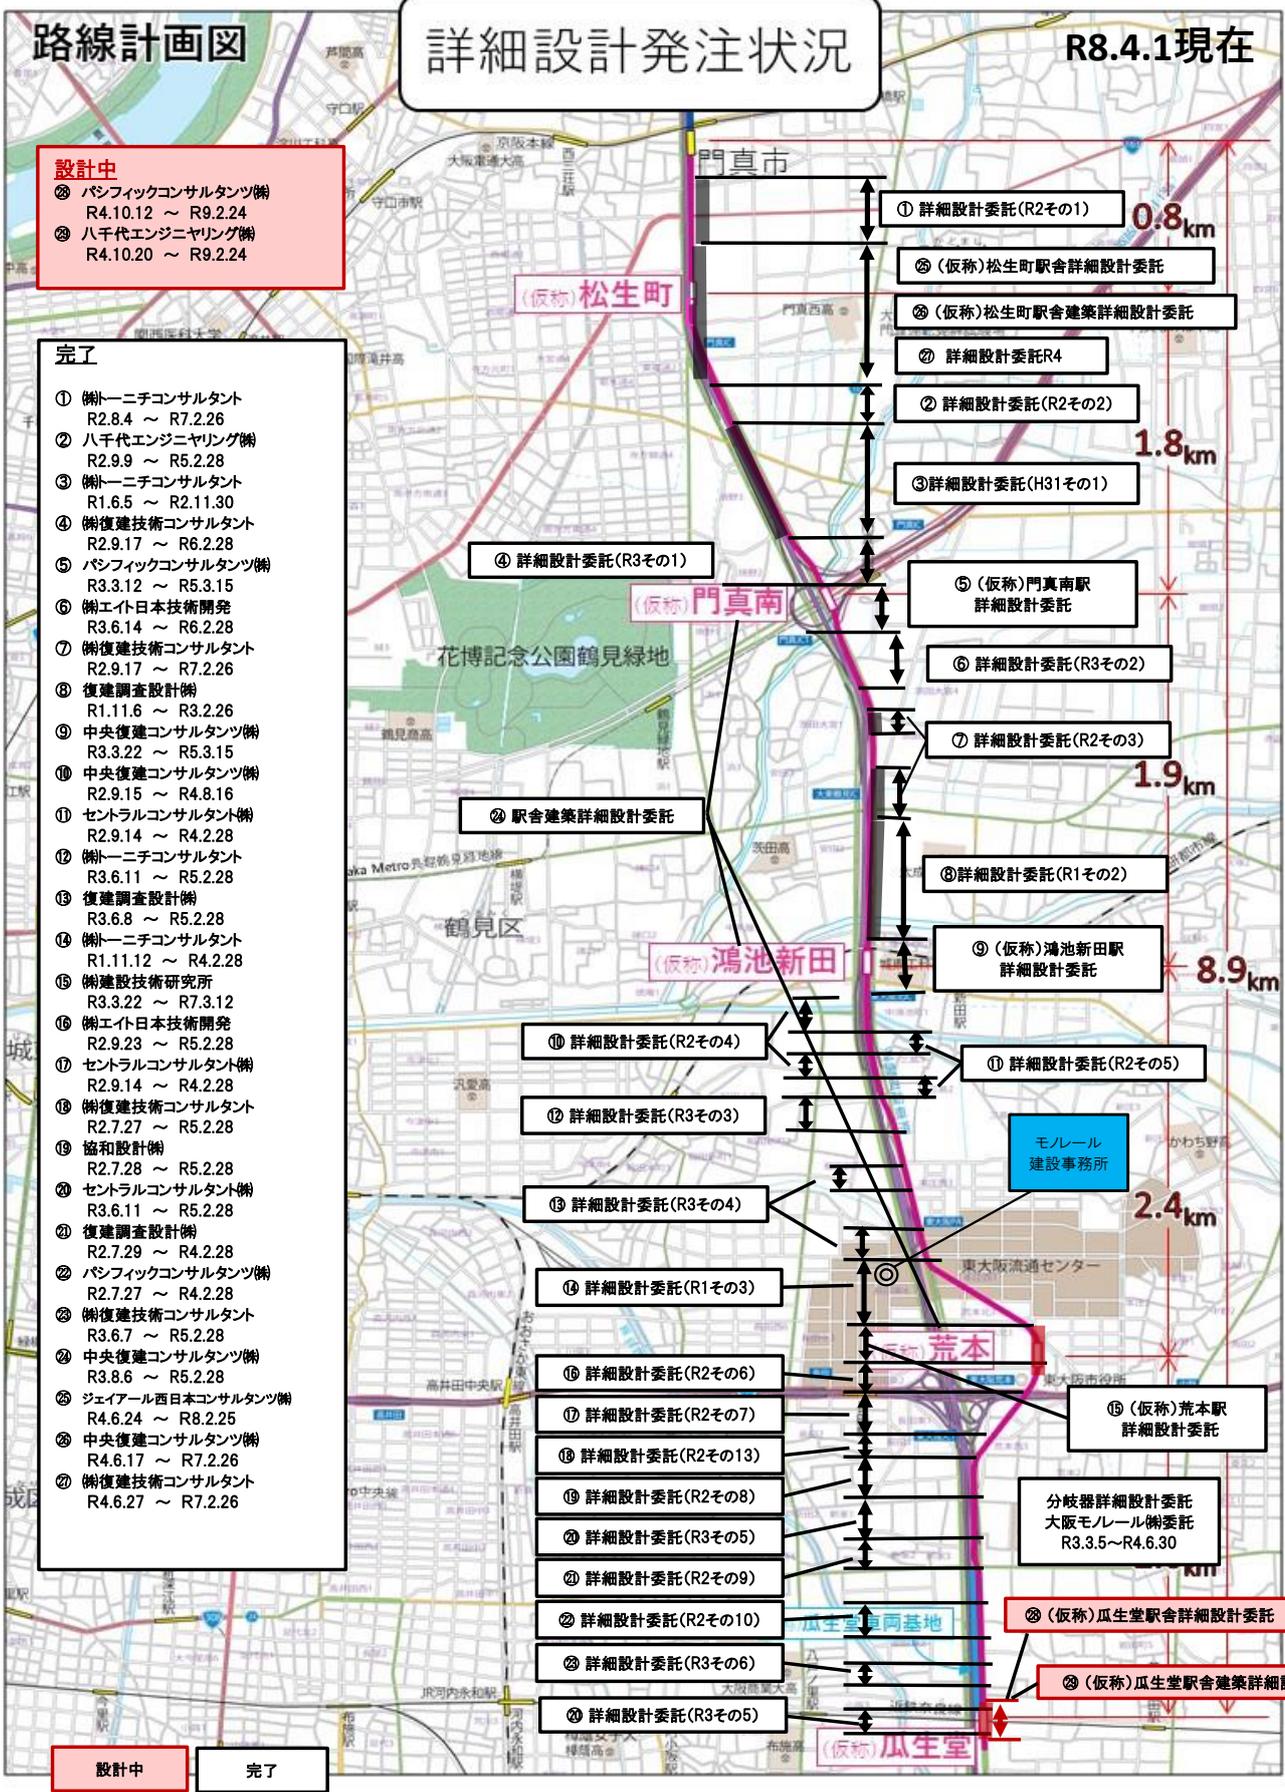

設計中 完了

モノレール
建設事務所

分岐器詳細設計委託
大阪モノレール(株)委託
R3.3.5~R4.6.30

㉔ (仮称)瓜生堂駅舎詳細設計委託

㉔ (仮称)瓜生堂駅舎建築詳細設計委託

⑮ (仮称)荒本駅
詳細設計委託

① 詳細設計委託(R2その1)

㉔ (仮称)松生町駅舎詳細設計委託

㉔ (仮称)松生町駅舎建築詳細設計委託

㉗ 詳細設計委託R4

② 詳細設計委託(R2その2)

③ 詳細設計委託(H31その1)

④ 詳細設計委託(R3その1)

⑤ (仮称)門真南駅
詳細設計委託

⑥ 詳細設計委託(R3その2)

⑦ 詳細設計委託(R2その3)

㉒ 駅舎建築詳細設計委託

⑧ 詳細設計委託(R1その2)

⑨ (仮称)鴻池新田駅
詳細設計委託

⑩ 詳細設計委託(R2その4)

⑪ 詳細設計委託(R2その5)

⑫ 詳細設計委託(R3その3)

⑬ 詳細設計委託(R3その4)

⑭ 詳細設計委託(R1その3)

⑯ 詳細設計委託(R2その6)

⑰ 詳細設計委託(R2その7)

⑱ 詳細設計委託(R2その13)

⑲ 詳細設計委託(R2その8)

㉑ 詳細設計委託(R3その5)

㉒ 詳細設計委託(R2その9)

㉓ 詳細設計委託(R2その10)

㉔ 詳細設計委託(R3その6)

㉕ 詳細設計委託(R3その5)
