

# 路線計画図

## 駅舎イメージ図



松生町駅



門真南駅



鴻池新田駅




荒本駅



瓜生堂駅

# 工事発注状況

R7.1.1現在

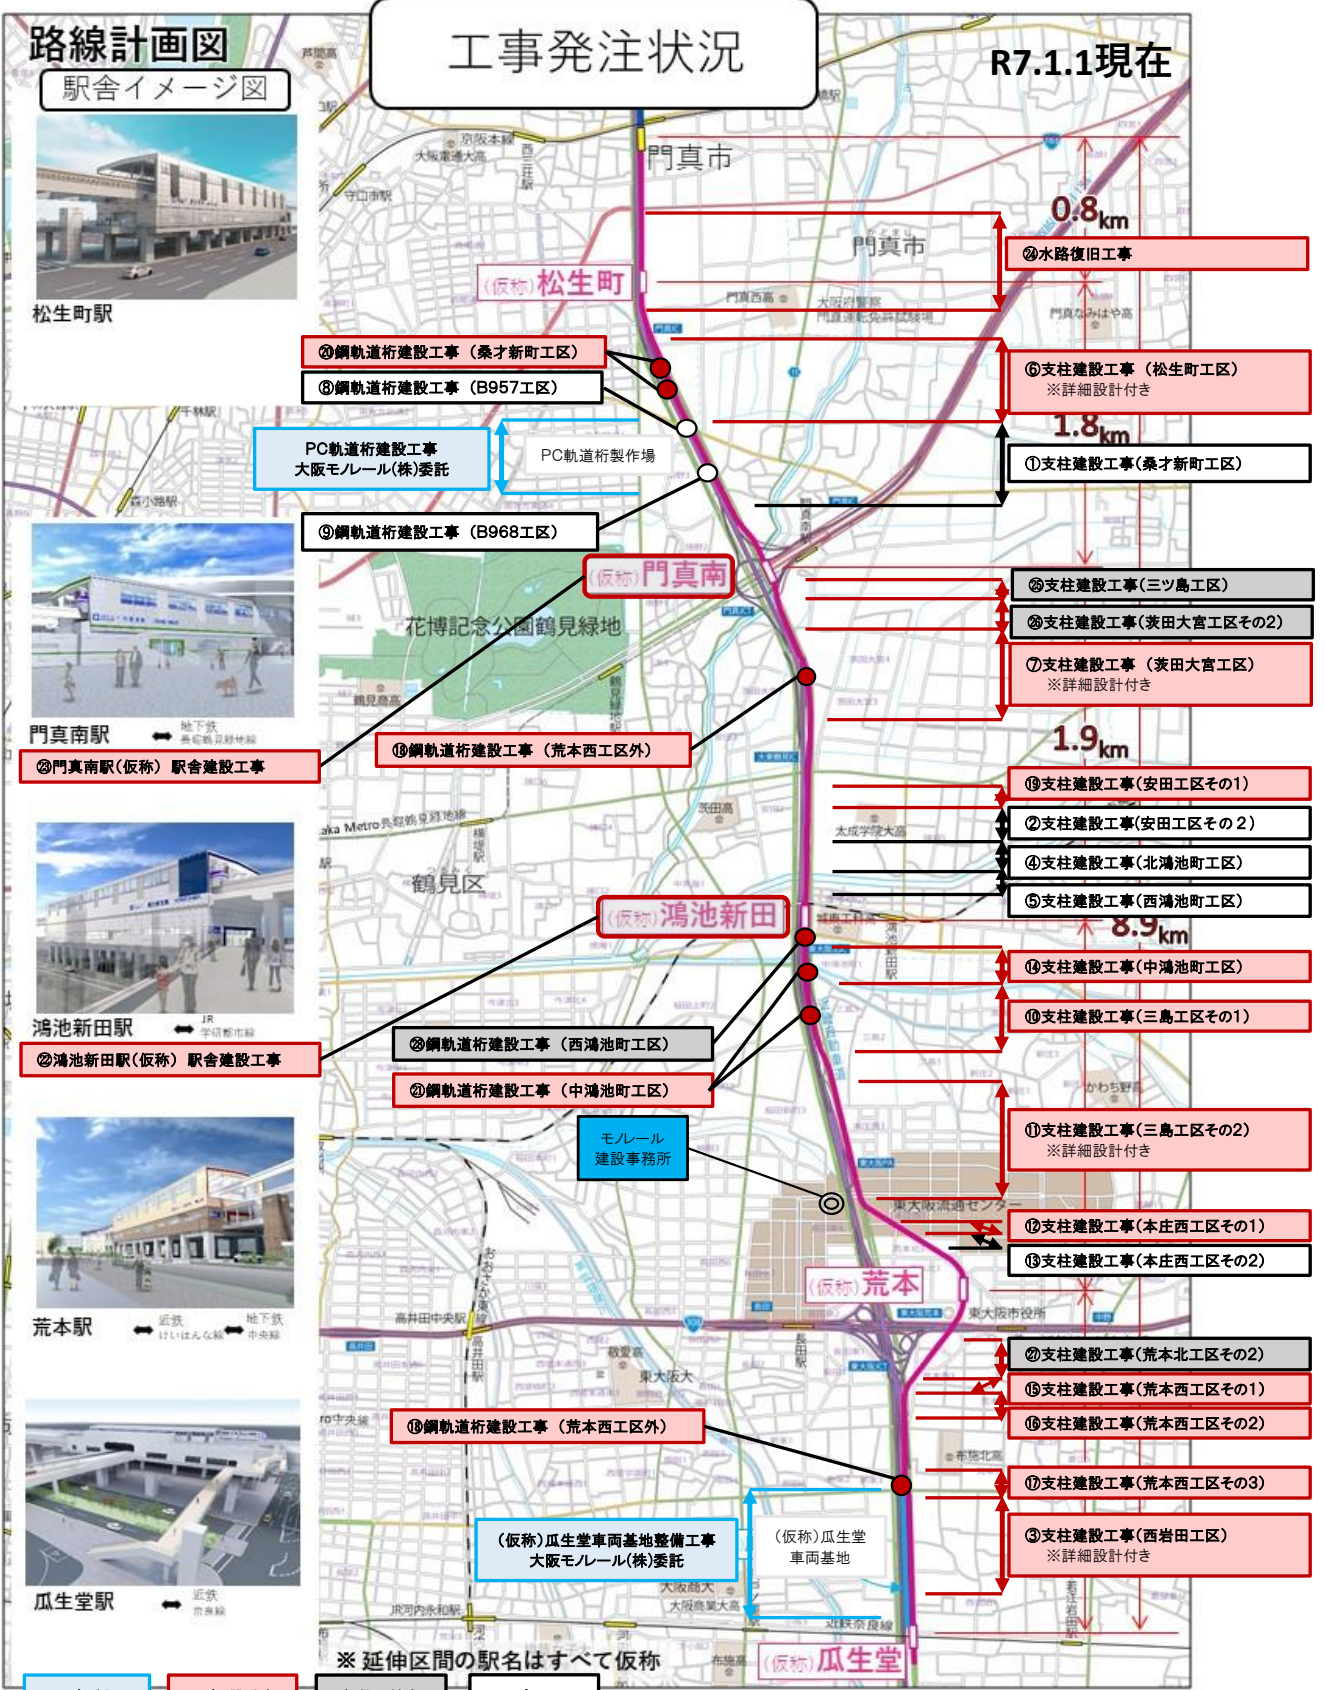

- 工事委託
- 工事・設計中
- 契約手続中
- 完了

工事中		工事完了
③ 青木あすなろ・協和異業種間特定 J V R3.3.25~R8.12.15	⑮ 鉄建建設(株)大阪支店 R5.3.20~R8.1.30	① 奥村組土木興業(株) R2.12~R6.4
⑥ 森本組・新土木開発 J V R3.10.12~R8.2.27	⑯ (株)森組大阪本店 R5.3.20~R8.2.27	② (株)ハンソン建設 R2.12~R4.10
⑦ 大日本土木・全日本コンサルタント J V R3.10.12~R7.1.31	⑰ (株)ハンジン建設 R5.3.20~R7.2.28	④ (株)五大コーポレーション大阪支店 R3.7~R5.2
⑩ (株)森組大阪本店 R4.12.21~R7.11.28	⑱ (株)駒井ハルテック R5.3.20~R7.9.30	⑤ 中林建設(株) R3.7~R5.12
⑪ 東洋建設・修成建設コンサルタント J V R4.12.21~R8.1.20	⑲ 中林建設(株) R5.12.18~R7.8.29	⑧ 川田工業 (株) R3.12~R6.6
⑫ (株)岸本建設大阪営業所 R4.12.21~R7.1.31	⑳ 宮地エンジニアリング(株)大阪支社 R6.3.25~R8.9.30	⑨ 瀧上工業 (株) R3.12~R6.2
⑭ (株)森組大阪本店 R5.3.20~R8.6.30	㉑ 川田工業(株)大阪支社 R6.3.25~R8.9.30	⑬ ヤマト工業(株) R4.12~R6.11

# 路線計画図

# 詳細設計発注状況


R7.1.1現在

## 設計中

- ① ㈱一ニチコンサルタント  
R2.8.4 ~ R7.2.26
- ⑦ ㈱復建技術コンサルタント  
R2.9.17 ~ R7.2.26
- ⑮ ㈱建設技術研究所  
R3.3.22 ~ R7.2.26
- ⑯ ジェアール西日本コンサル㈱  
R4.6.24 ~ R7.2.26
- ⑳ 中央復建コンサルタンツ㈱  
R4.6.17 ~ R7.2.26
- ㉑ ㈱復建技術コンサルタント  
R4.6.27 ~ R7.2.26
- ㉒ パシフィックコンサルタンツ㈱  
R4.10.12 ~ R7.2.26
- ㉓ 八千代エンジニアリング㈱  
R4.10.20 ~ R7.2.26

## 完了

- ② 八千代エンジニアリング㈱  
R2.9.9 ~ R5.2.28
- ③ ㈱一ニチコンサルタント  
R1.6.5 ~ R2.11.30
- ⑤ パシフィックコンサルタンツ㈱  
R3.3.12 ~ R5.3.15
- ⑥ ㈱エイト日本技術開発  
R3.6.14 ~ R6.2.28
- ④ ㈱復建技術コンサルタント  
R2.9.17 ~ R6.2.28
- ⑧ 復建調査設計㈱  
R1.11.6 ~ R3.2.26
- ⑨ 中央復建コンサルタンツ㈱  
R3.3.22 ~ R5.3.15
- ⑩ 中央復建コンサルタンツ㈱  
R2.9.15 ~ R4.8.16
- ⑪ セントラルコンサルタンツ㈱  
R2.9.14 ~ R4.2.28
- ⑫ ㈱一ニチコンサルタント  
R3.6.11 ~ R5.2.28
- ⑬ 復建調査設計㈱  
R3.6.8 ~ R5.2.28
- ⑭ ㈱一ニチコンサルタント  
R1.11.12 ~ R4.2.28
- ⑰ セントラルコンサルタンツ㈱  
R2.9.14 ~ R4.2.28
- ⑱ ㈱復建技術コンサルタント  
R2.7.27 ~ R5.2.28
- ⑲ 協和設計㈱  
R2.7.28 ~ R5.2.28
- ㉔ セントラルコンサルタンツ㈱  
R3.6.11 ~ R5.2.28
- ㉕ 復建調査設計㈱  
R2.7.29 ~ R4.2.28
- ㉖ パシフィックコンサルタンツ㈱  
R2.7.27 ~ R4.2.28
- ㉗ ㈱復建技術コンサルタント  
R3.6.7 ~ R5.2.28
- ㉘ 中央復建コンサルタンツ㈱  
R3.8.6 ~ R5.2.28

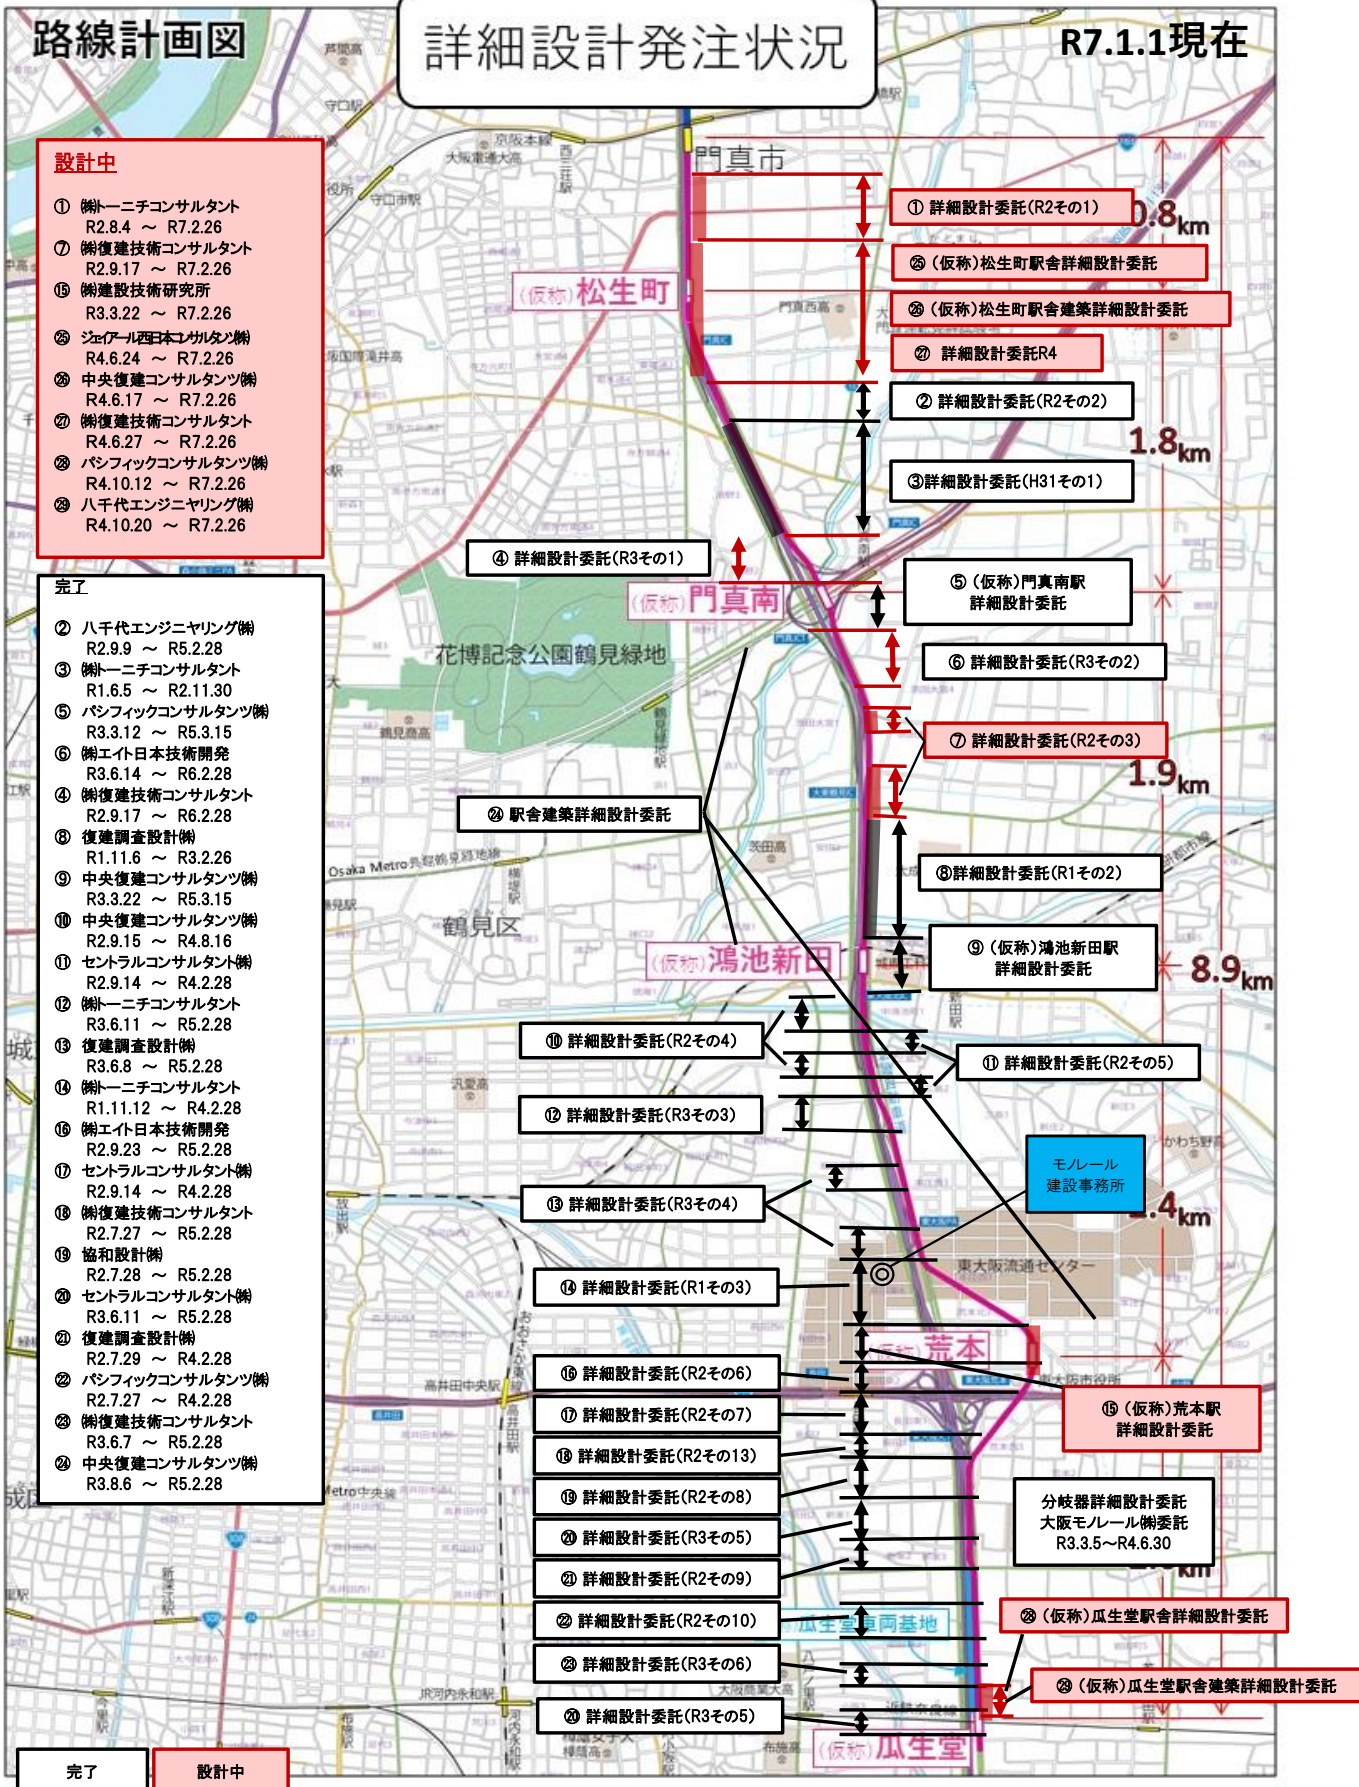

完了

設計中

モジュール  
建設事務所

分岐器詳細設計委託  
大阪モジュール㈱委託  
R3.3.5~R4.6.30

⑳ (仮称)瓜生堂駅舎詳細設計委託

㉑ (仮称)瓜生堂駅舎建築詳細設計委託

㉒ (仮称)瓜生堂駅舎建築詳細設計委託
