

一級河川安治川(旧淀川)新水門築造工事 進捗状況



工事概要


工事名：一級河川安治川（旧淀川）新水門築造工事

受注者：鹿島・みらい・井上共同企業体
（現場代理人：鹿島建設(株) 平岡）

工事場所：大阪市此花区西九条七丁目地内 外

工期：R7年（2025年）3月25日～R15年（2033年）7月29日


契約金額：12,776,881,700円（税込）

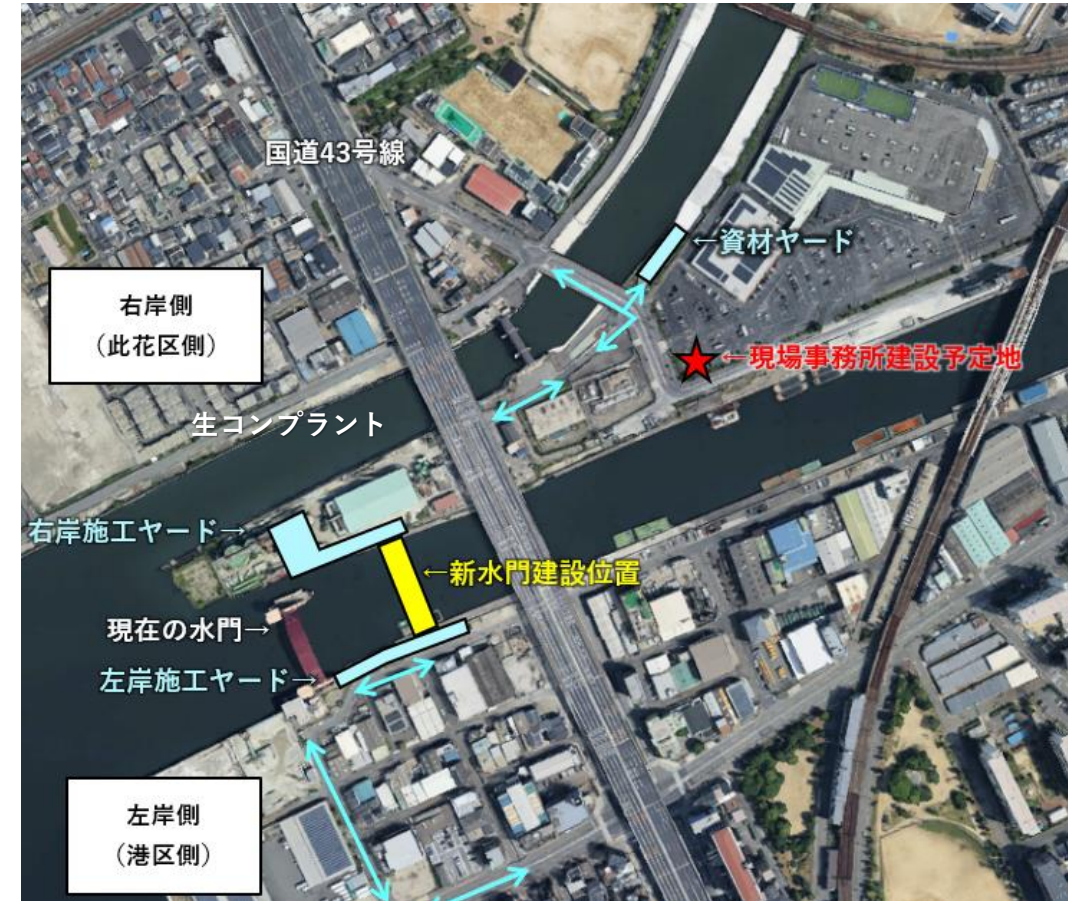


工事概要

- 現水門の直上流に新たな水門を築造します。第2回デザイン会議を踏まえ、当初よりもスリムな形状に変更しています。

現在（バイザーゲート式：アーチ状）

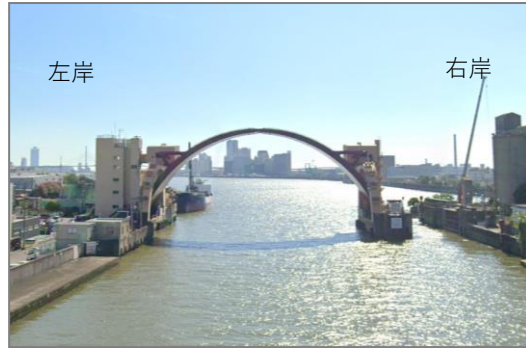


平面図

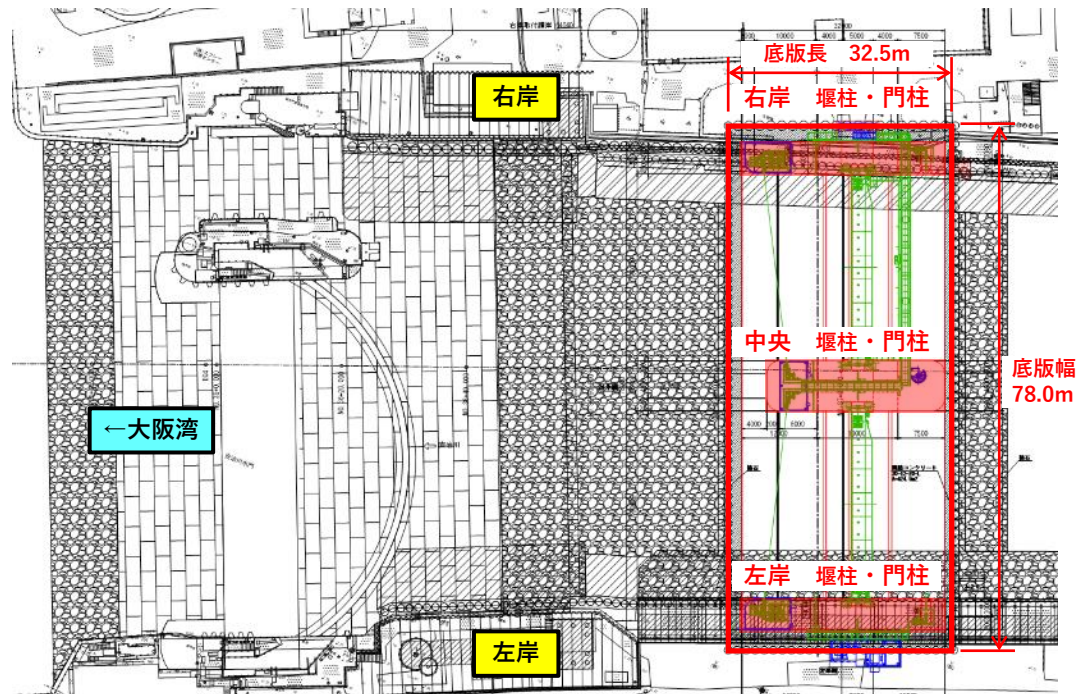

完成イメージ（ローラゲート式）




正面図

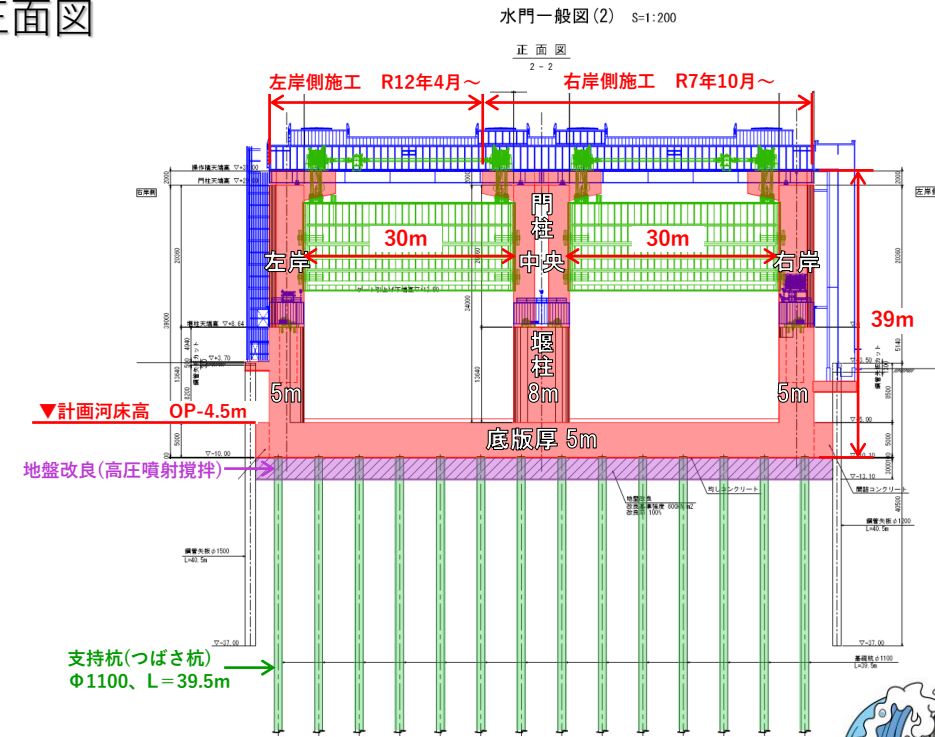

安治川新水門築造工事 進捗状況

- 昨年6月より不稼働施設撤去工(右岸施工ヤード整備)に着手し、本年2月に完了しました。
- 万博期間中は河川内作業を控え、10月中旬より河川内の不発弾探査開始し、1月中旬には完了しました。
- 現在は半川締切するため、既存護岸などの構造物撤去工と、周辺では船舶の航行のため、河床掘削工事を実施しています。

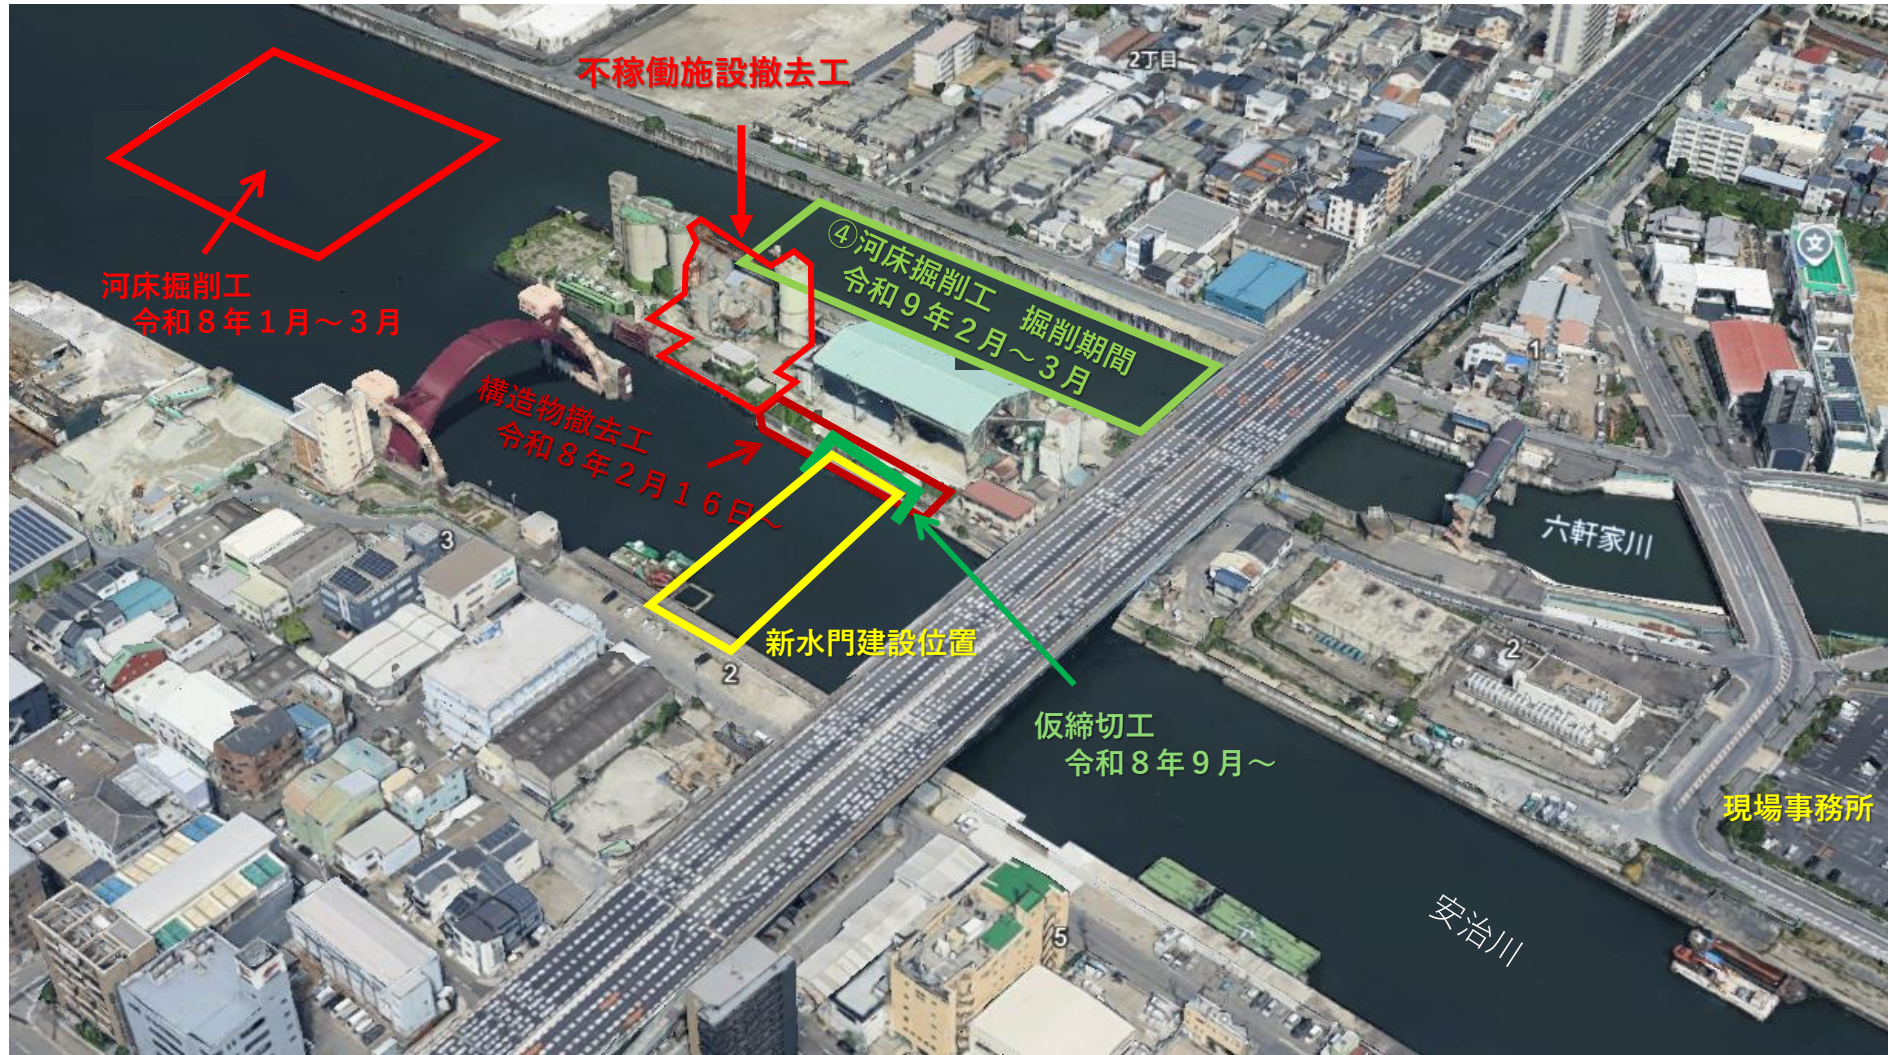

安治川新水門築造工事 進捗状況（不稼働施設撤去工）





令和8年2月撮影





安治川新水門築造工事 令和8年度の予定（構造物撤去工）

- 引き続き構造物撤去工を進めます。

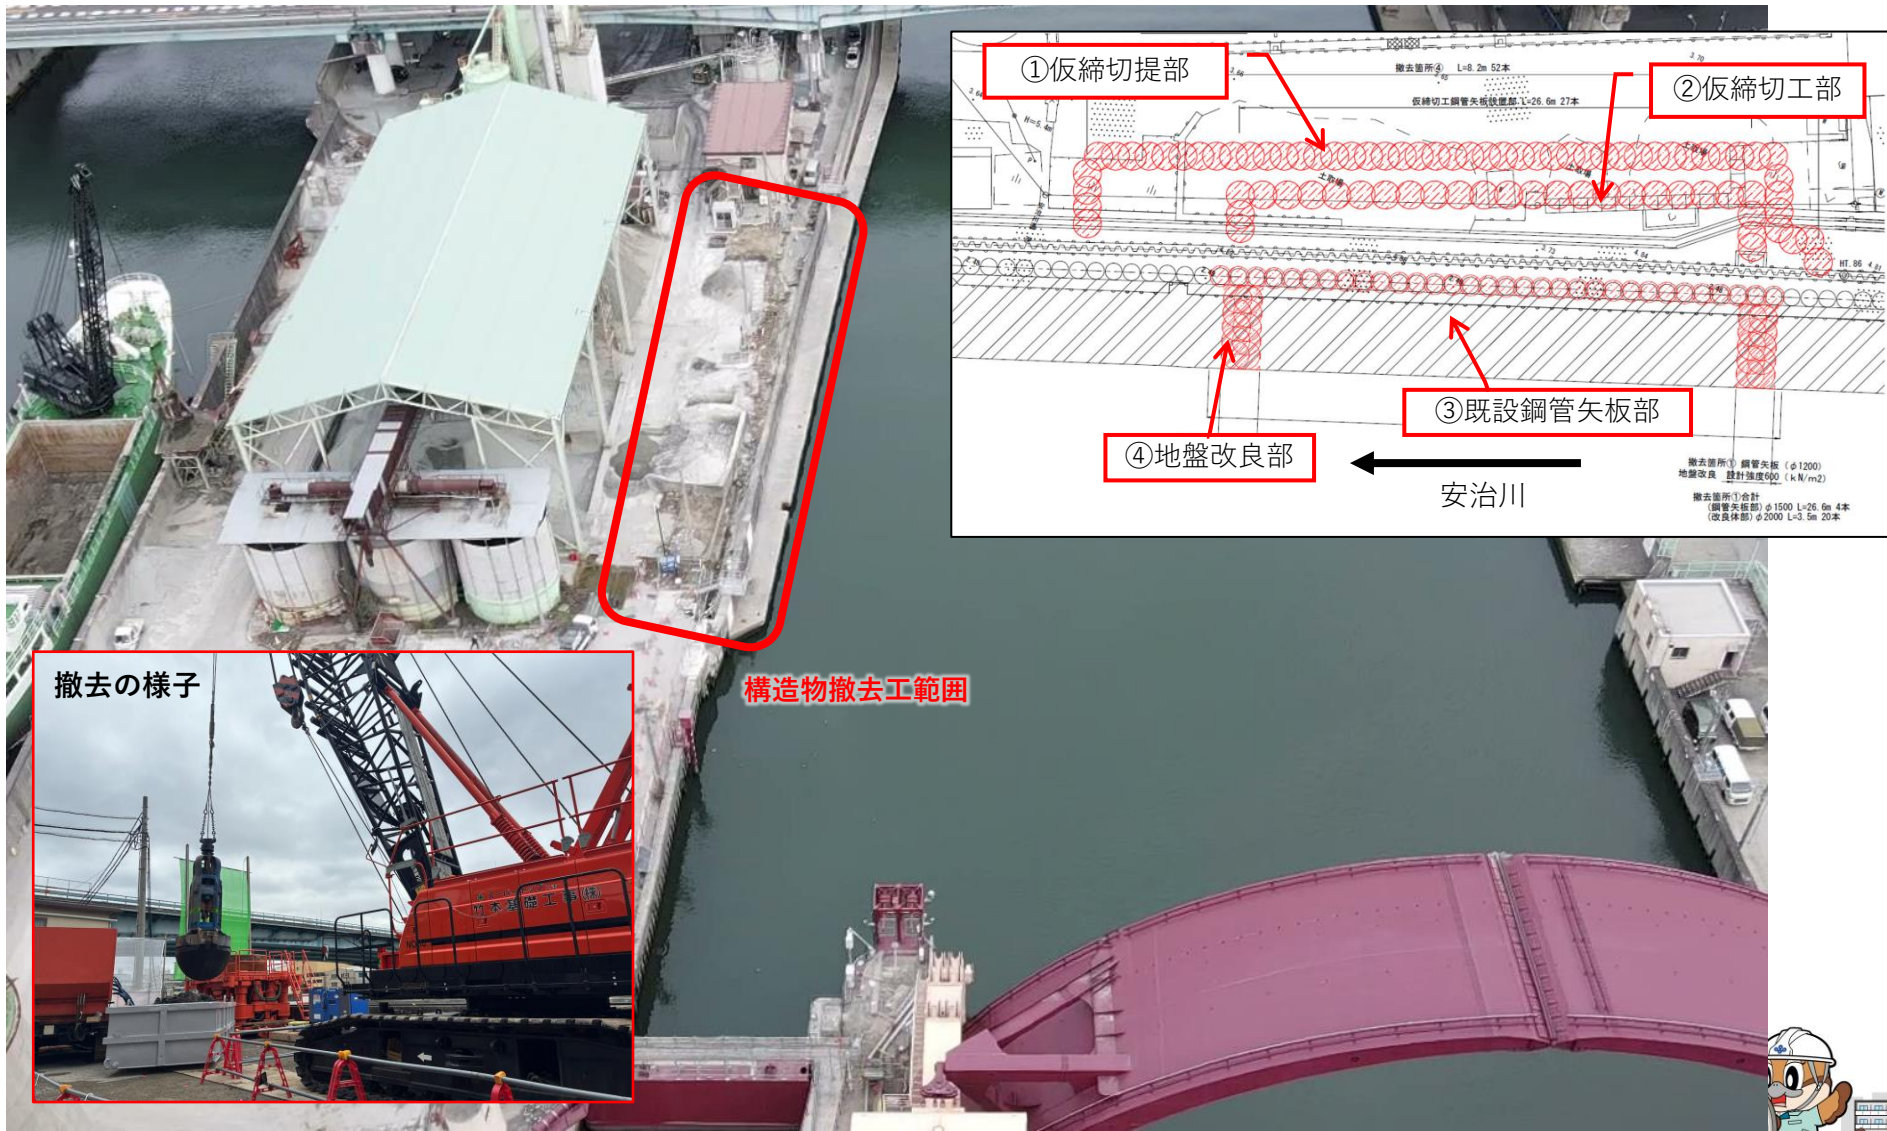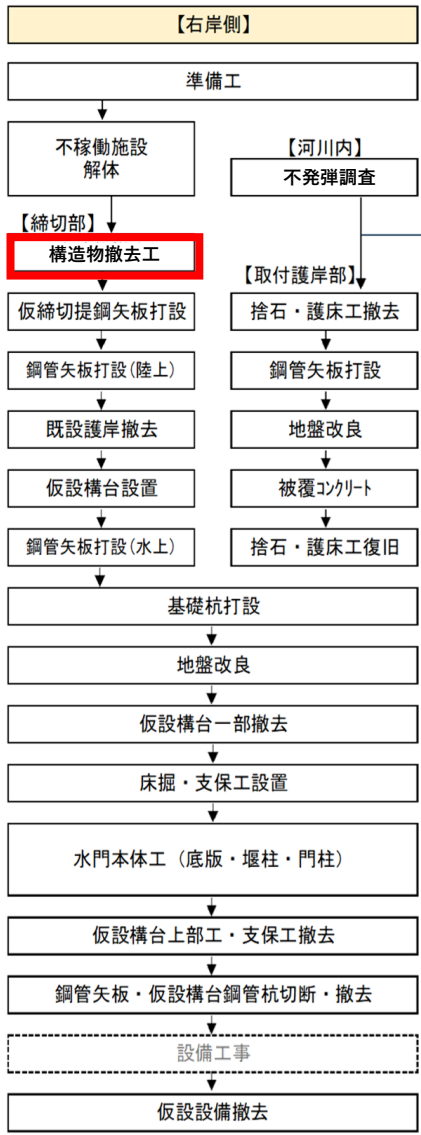

安治川新水門築造工事 令和8年度の予定（仮締切工）

- 令和8年9月からは仮締切工に着手する予定です。

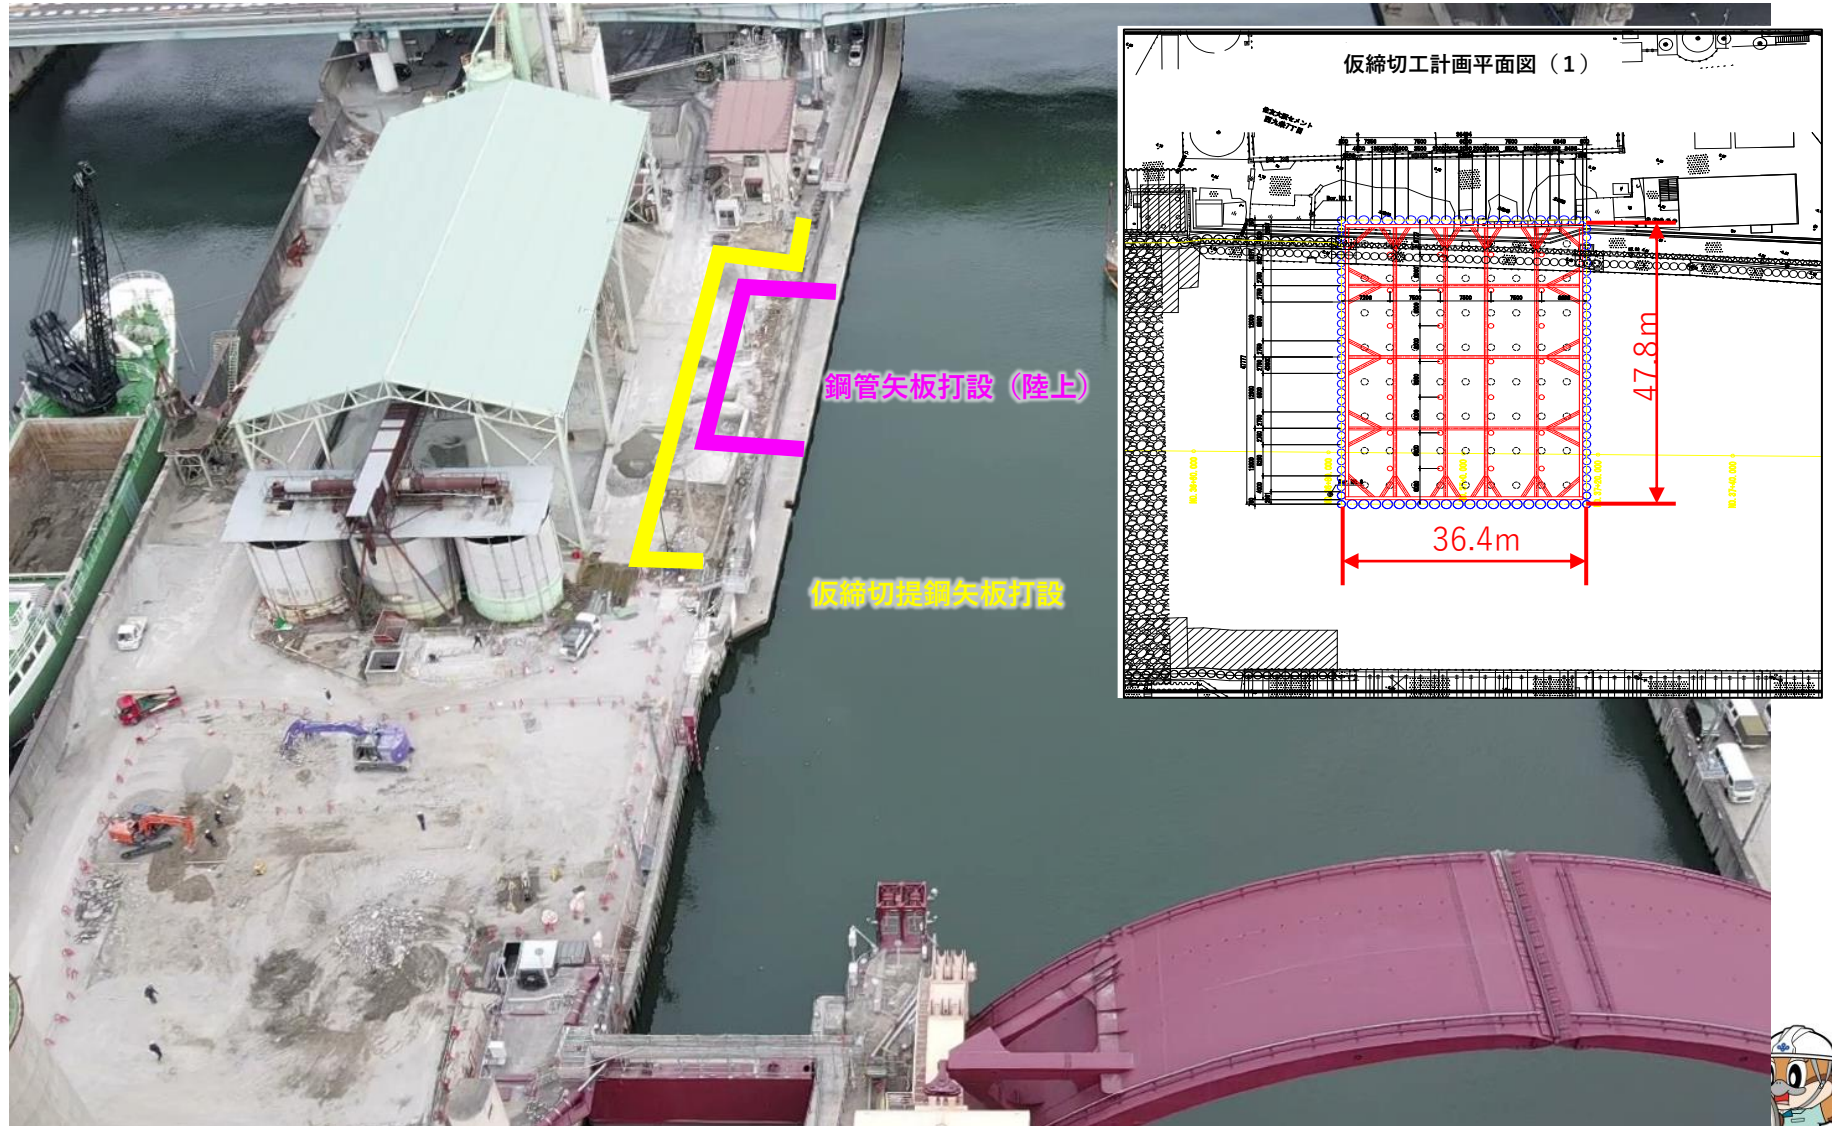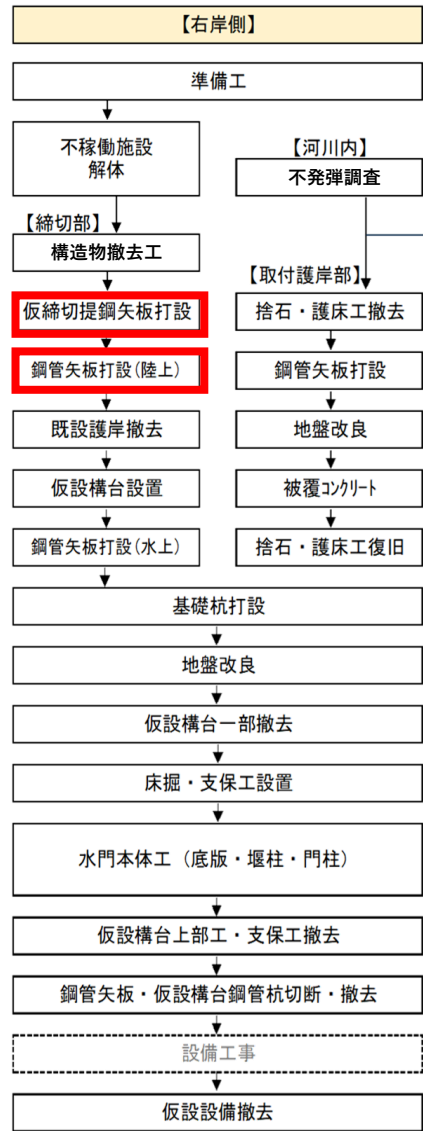


今年度は不稼働施設撤去、不発弾探査の完成。来年度は既設構造物撤去、仮締切工の施工

- ・ 水門本体築造は令和10年度から着手予定
- ・ 令和8～9年度は管理棟など建築関連の設計を進める





安治川新水門築造工事 情報発信館の設置

- 新水門の工事情報に加え、アーチ型の現水門や土木、地域の魅力を発信すべく、現場事務所敷地内に情報発信スペース(1F)と展望ルーム(2F)の機能を備えた情報発信館を設置します。

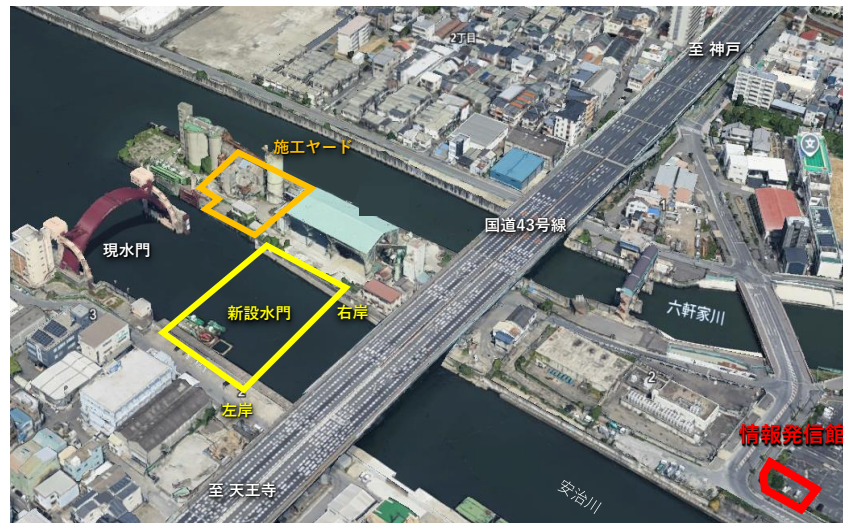

■情報発信館の展示イメージ

新水門の模型やジオラマ、治水対策に関するパネルを展示予定です。

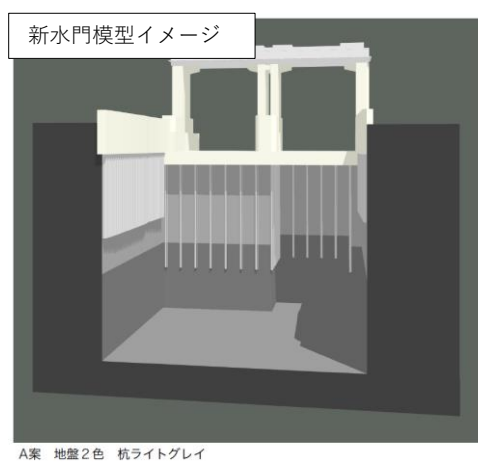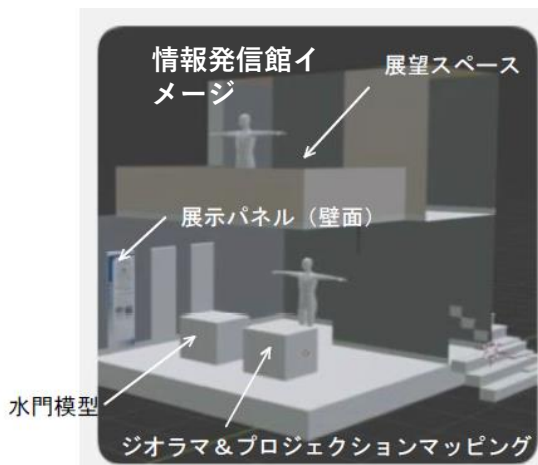

[今後の予定]
 ・令和8年7月にオープンを予定。
 ・展示物は防災教育や区民祭りなど出張展示の実施を検討中。
