

令和7年度森林等環境整備事業（流域保全森林防災事業） の実施状況及び令和7年度実績に係る評価について

令和8年7月

大阪府 環境農林水産部 みどり推進室

流域保全森林防災事業

【目的】

集水域である森林区域において、流域治水の考え方に基づき、森林の土砂流出防止及び洪水緩和機能の維持向上を図り、地球温暖化に伴う気候変動に起因する、想定を超える豪雨や台風等による洪水被害の軽減・防止を目的とする。

【事業概要】

- 事業対象区域：流域治水上、緊急的に対策を必要とする以下の全てを満たす森林
 - ・流域治水プロジェクトに位置付けられた河川の上流
 - ・集水域に概ね100ha以上の森林がある河川の上流
 - ・土砂堆積傾向にある河川の上流、または、洪水リスクがある河川の上流
 - ・既存の治山事業等で対応できない区域
- ・事業地区数：23地区
- ・事業内容：山地保水力の向上対策
 - ・ピーク流量調整機能を付加した治山ダム（流域治水対策型）の整備等
 - ・本数調整伐と筋工の組み合わせによる面的整備等土砂・流木流出抑制対策
 - ・流木化の恐れのある倒木や立木の事前伐採・撤去等
 - ・溪流の侵食や土砂流出を抑制する治山ダム（流域治水対策型）の整備等
- ・事業の工程：初年度～ 現地調査、地権者調査（コンサルタント委託）
森林所有者、市町村、地元自治会等との調整
森林所有者と協定書を締結し事業実施
※ 協定書により、10年間の森林の維持



ピーク流量調整機能のある治山ダム（流域治水対策型）の設置



本数調整伐と筋工の施工



溪流沿いの危険木の除去
(単位：千円)

【事業計画】

	全体計画		R 6		R 7		R 8		R 9		R 10	
	地区数	事業費	地区数	事業費	地区数	事業費	地区数	事業費	地区数	事業費	地区数	事業費
	23	3,002,600	16	422,600	21	665,000	23	710,000	21	660,000	18	545,000
(新規着手件数)			(16)		(5)		(2)		—		—	

事業対象区域の選定方法

選定基準	選定条件	抽出箇所数
① 流域治水との連携	⇒ 流域治水プロジェクトが策定されている河川 ⇒ 流域治水プロジェクト：河川管理者等が主に行う従来の治水対策のほか、農林部局や市町村等が行う取組も含めた治水対策の全体像をとりまとめたもの。	154 河川
② 集水域の森林面積	⇒ 河川上流の集水域の森林面積が概ね100ha以上の河川	86 / 154
③ 下流の洪水リスク	⇒ 土砂堆積傾向にある河川または洪水リスクがある河川	66 / 86
④ 森林の荒廃状況	⇒ 航空レーザ計測データの解析による微地形図や空中写真を判読し、荒廃地形や荒廃溪流が多く、保水機能の低下が懸念される流域や、近年、土石流・流木などの山地災害が発生、または、今後の降雨等により荒廃拡大の危険性が高い流域	66 / 86 【調査の視点】 ・崩壊地の有無 ・土砂・流木の堆積状況 ・溪岸侵食の有無 ・荒廃森林の有無 ・下層植生の有無
⑤ 既存事業の棲分け	⇒ 既存の治山事業等で対応できる区域を除外	重点対策箇所 23 地区 23 河川 / 66 河川

事業対象区域の現況



溪岸侵食による溪流への倒伏



下層植生が消失し、表土が流出

集水域における流域治水対策（山地保水力向上・土砂、流木流出抑制）

流域治水対策

【目的】河川への土砂、流木流出の抑制・山地保水力の向上による洪水被害の軽減

対象)下流河川において土砂堆積や洪水リスクがあり、かつ、河川上流の森林域において荒廃渓流や荒廃森林が面的にみられる区域

渓流沿いの危険木の除去

河川の通水が阻害されないよう流木の発生、流出を抑制

治山ダム(流域治水対策型)



下流河川への洪水ピーク流量を軽減

本数調整伐等・筋工

保水力を有する森林土壌の保持形成により洪水緩和機能を維持向上

治山ダム(流域治水対策型)とは

水抜管等により常時の排水を行いつつ、豪雨時には、ダム上流や副ダムとの間に設けた堆水区域を使って、下流河川へのピーク流量を低減させるタイプのダム

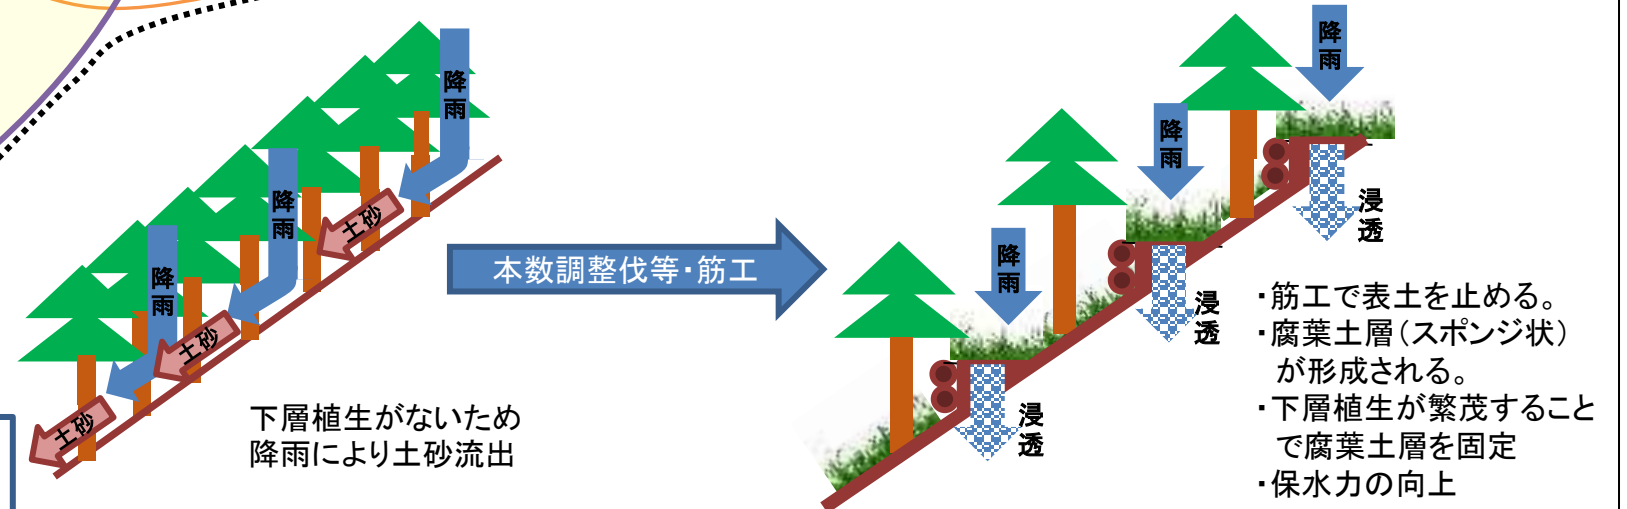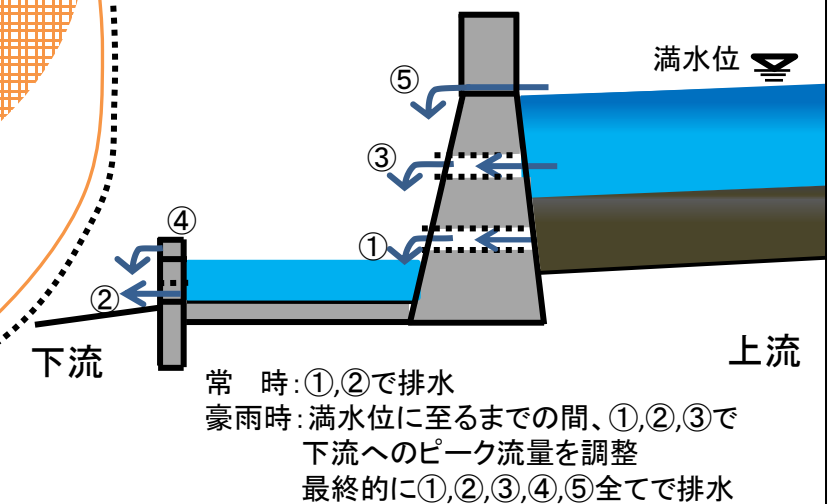


気候変動による山地災害の激甚化・形態変化



降水形態の変化により土砂流出量の増加、流木化リスクの高まり


洪水被害の甚大化の恐れ

出典: (林野庁HP)
令和4年度森林及び林業の動向

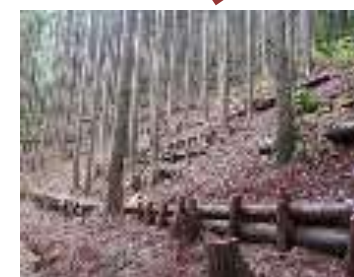


集水域(森林区域)における流域治水対策 選定地区

No.	市町村	地区名	水系ブロック	河川名
1	能勢町	長谷	猪名川上流	長谷川
2	箕面市	上止々呂美ほか	猪名川下流	余野川
3	高槻市	原ほか	淀川右岸	芥川
4	高槻市	出灰	淀川右岸	芥川
5	高槻市	川久保	淀川右岸	水無瀬川
6	交野市	星田ほか	淀川左岸	天野川
7	四條畷市	南野ほか	寝屋川	権現川
8	東大阪市	善根寺町ほか	寝屋川	日下川、音川
9	太子町	山田	石川	飛鳥川
10	河南町	平石ほか	石川	梅川
11	千早赤阪村	水分	石川	水越川
12	河内長野市	清水ほか	石川	天見川
13	河内長野市	加賀田ほか	石川	加賀田川
14	河内長野市	日野ほか	石川	石川
15	和泉市	仏並町	大津川	槇尾川
16	和泉市	父鬼町	大津川	父鬼川
17	岸和田市	大沢町	大津川	牛滝川
18	貝塚市	蕎原	近木川	近木川
19	泉佐野市	大木	樫井川	樫井川
20	泉南市	信達葛畑	男里川	金熊寺川
21	阪南市	桑畑	男里川	菟砥川
22	岬町	淡輪	番川	番川
23	岬町	多奈川西畑	東川	西川

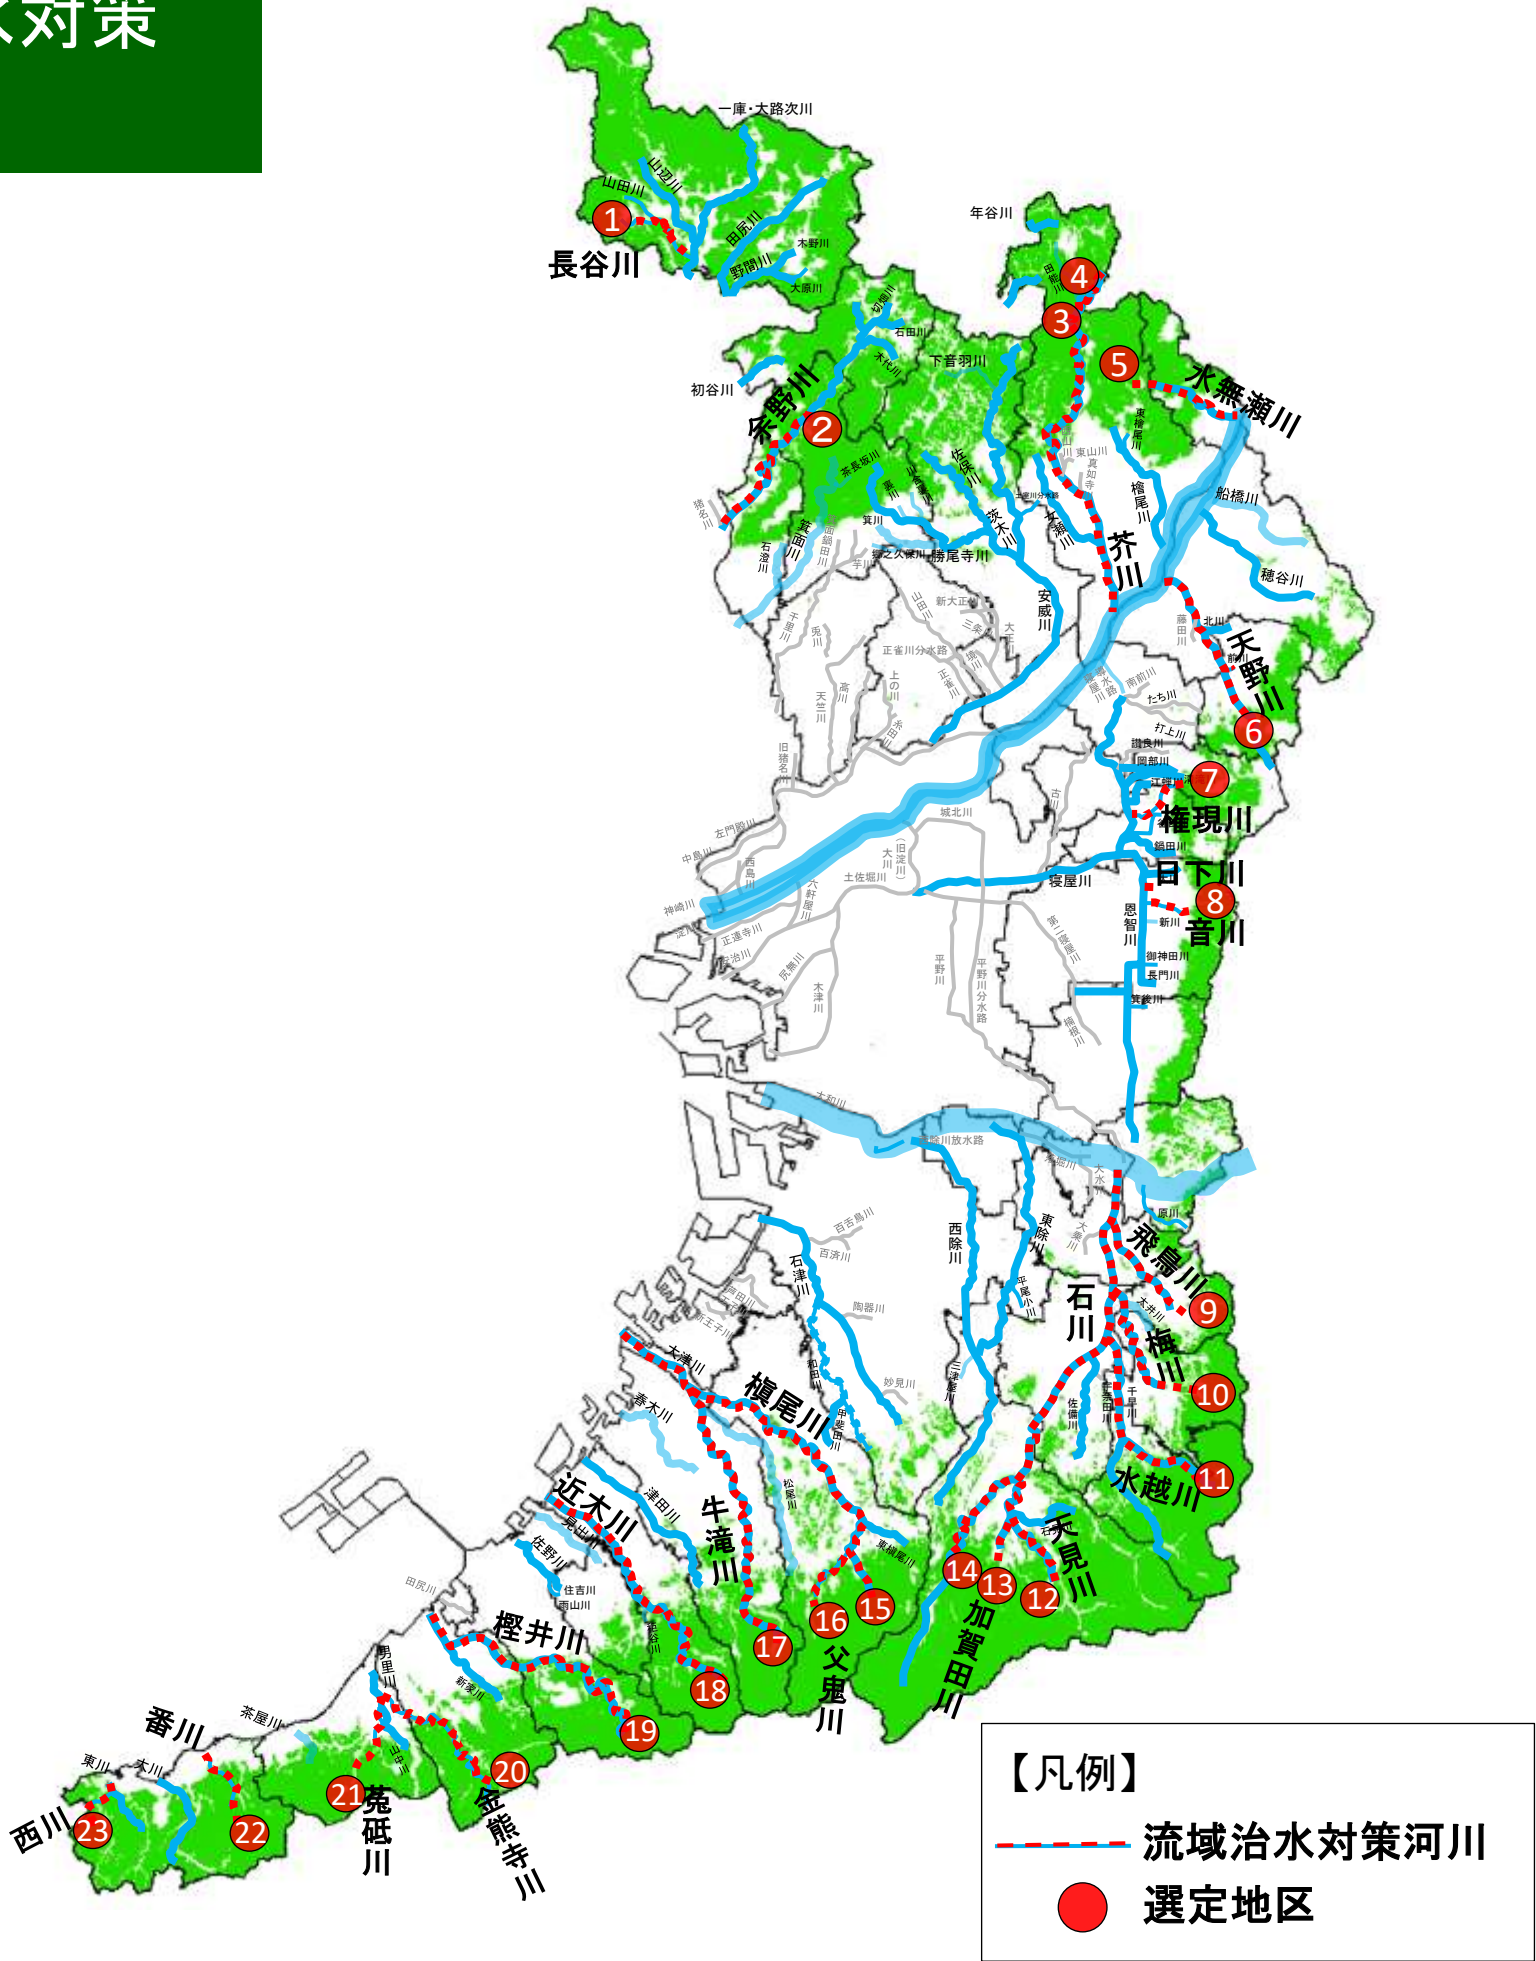

令和7年度 流域保全森林防災事業実績


箇所名	新規・継続	計画数量			実績数量			
		全体計画策定	山地保水力向上対策		土砂・流木流出抑制対策	山地保水力向上対策		土砂・流木流出抑制対策
			治山ダム(基)	森林整備(ha)		治山ダム(基)	森林整備(ha)	
(1) 能勢町長谷 (ながたに)	継続	—	—	8.6	—	—	8.6	—
(2) 箕面市上止々呂美ほか (かみとどろみ)	継続	—	—	3.9	—	—	3.9	—
(3) 高槻市原ほか (はら)	継続	—	2	1.9	—	2	1.9	—
(4) 高槻市出灰 (いずりは)	継続	—	—	3.2	—	—	3.2	—
(5) 高槻市川久保 (かわくぼ)	継続	—	—	2.1	—	—	2.1	—
(6) 交野市星田ほか (ほしだ)	継続	—	1	3.5	100	1	3.5	100
(7) 四條畷市南野 (みなみの)	継続	—	—	0.0	—	—	0.0	—
(8) 東大阪市善根寺町ほか (ぜんこんじちょう)	継続	—	—	6.5	—	—	6.5	—
(9) 太子町山田 (ひやまだ)	新規	○	—	2.0	—	○	1.8	—
(10) 河南町平石ほか (ひらいし)	継続	—	1	0.0	—	1	0.0	70
(11) 千早赤阪村水分ほか (すいぶん)	継続	—	1	0.0	100	1	0.0	100
(12) 河内長野市清水ほか (しみず)	新規	○	—	3.0	—	○	2.8	—
(13) 河内長野市加賀田ほか (かがた)	継続	—	2	8.0	100	2	8.3	150
(14) 河内長野市日野ほか (ひの)	新規	○	—	3.0	—	○	3.3	—
(15) 和泉市仏並町 (ぶつなみちよう)	継続	—	—	8.1	—	—	8.1	—
(16) 和泉市父鬼町 (ちちおにちょう)	継続	—	—	8.0	—	—	8.0	—
(17) 岸和田市大沢町 (おおさわちよう)	新規	○	—	4.8	—	○	4.8	—
(18) 貝塚市そぶら (そぶら)	継続	—	1	6.8	200	1	7.0	200
(19) 泉佐野市大木 (おおき)	継続	—	—	10.6	—	—	10.6	—
(20) 泉南市信達葛畑 (しんだちつづらばた)	新規	○	—	2.2	—	○	2.2	—
(21) 岬町多奈川西畑 (たながわにしばた)	継続	—	—	9.2	—	—	9.2	—
21箇所		21	8	95.4	500	21	95.8	620

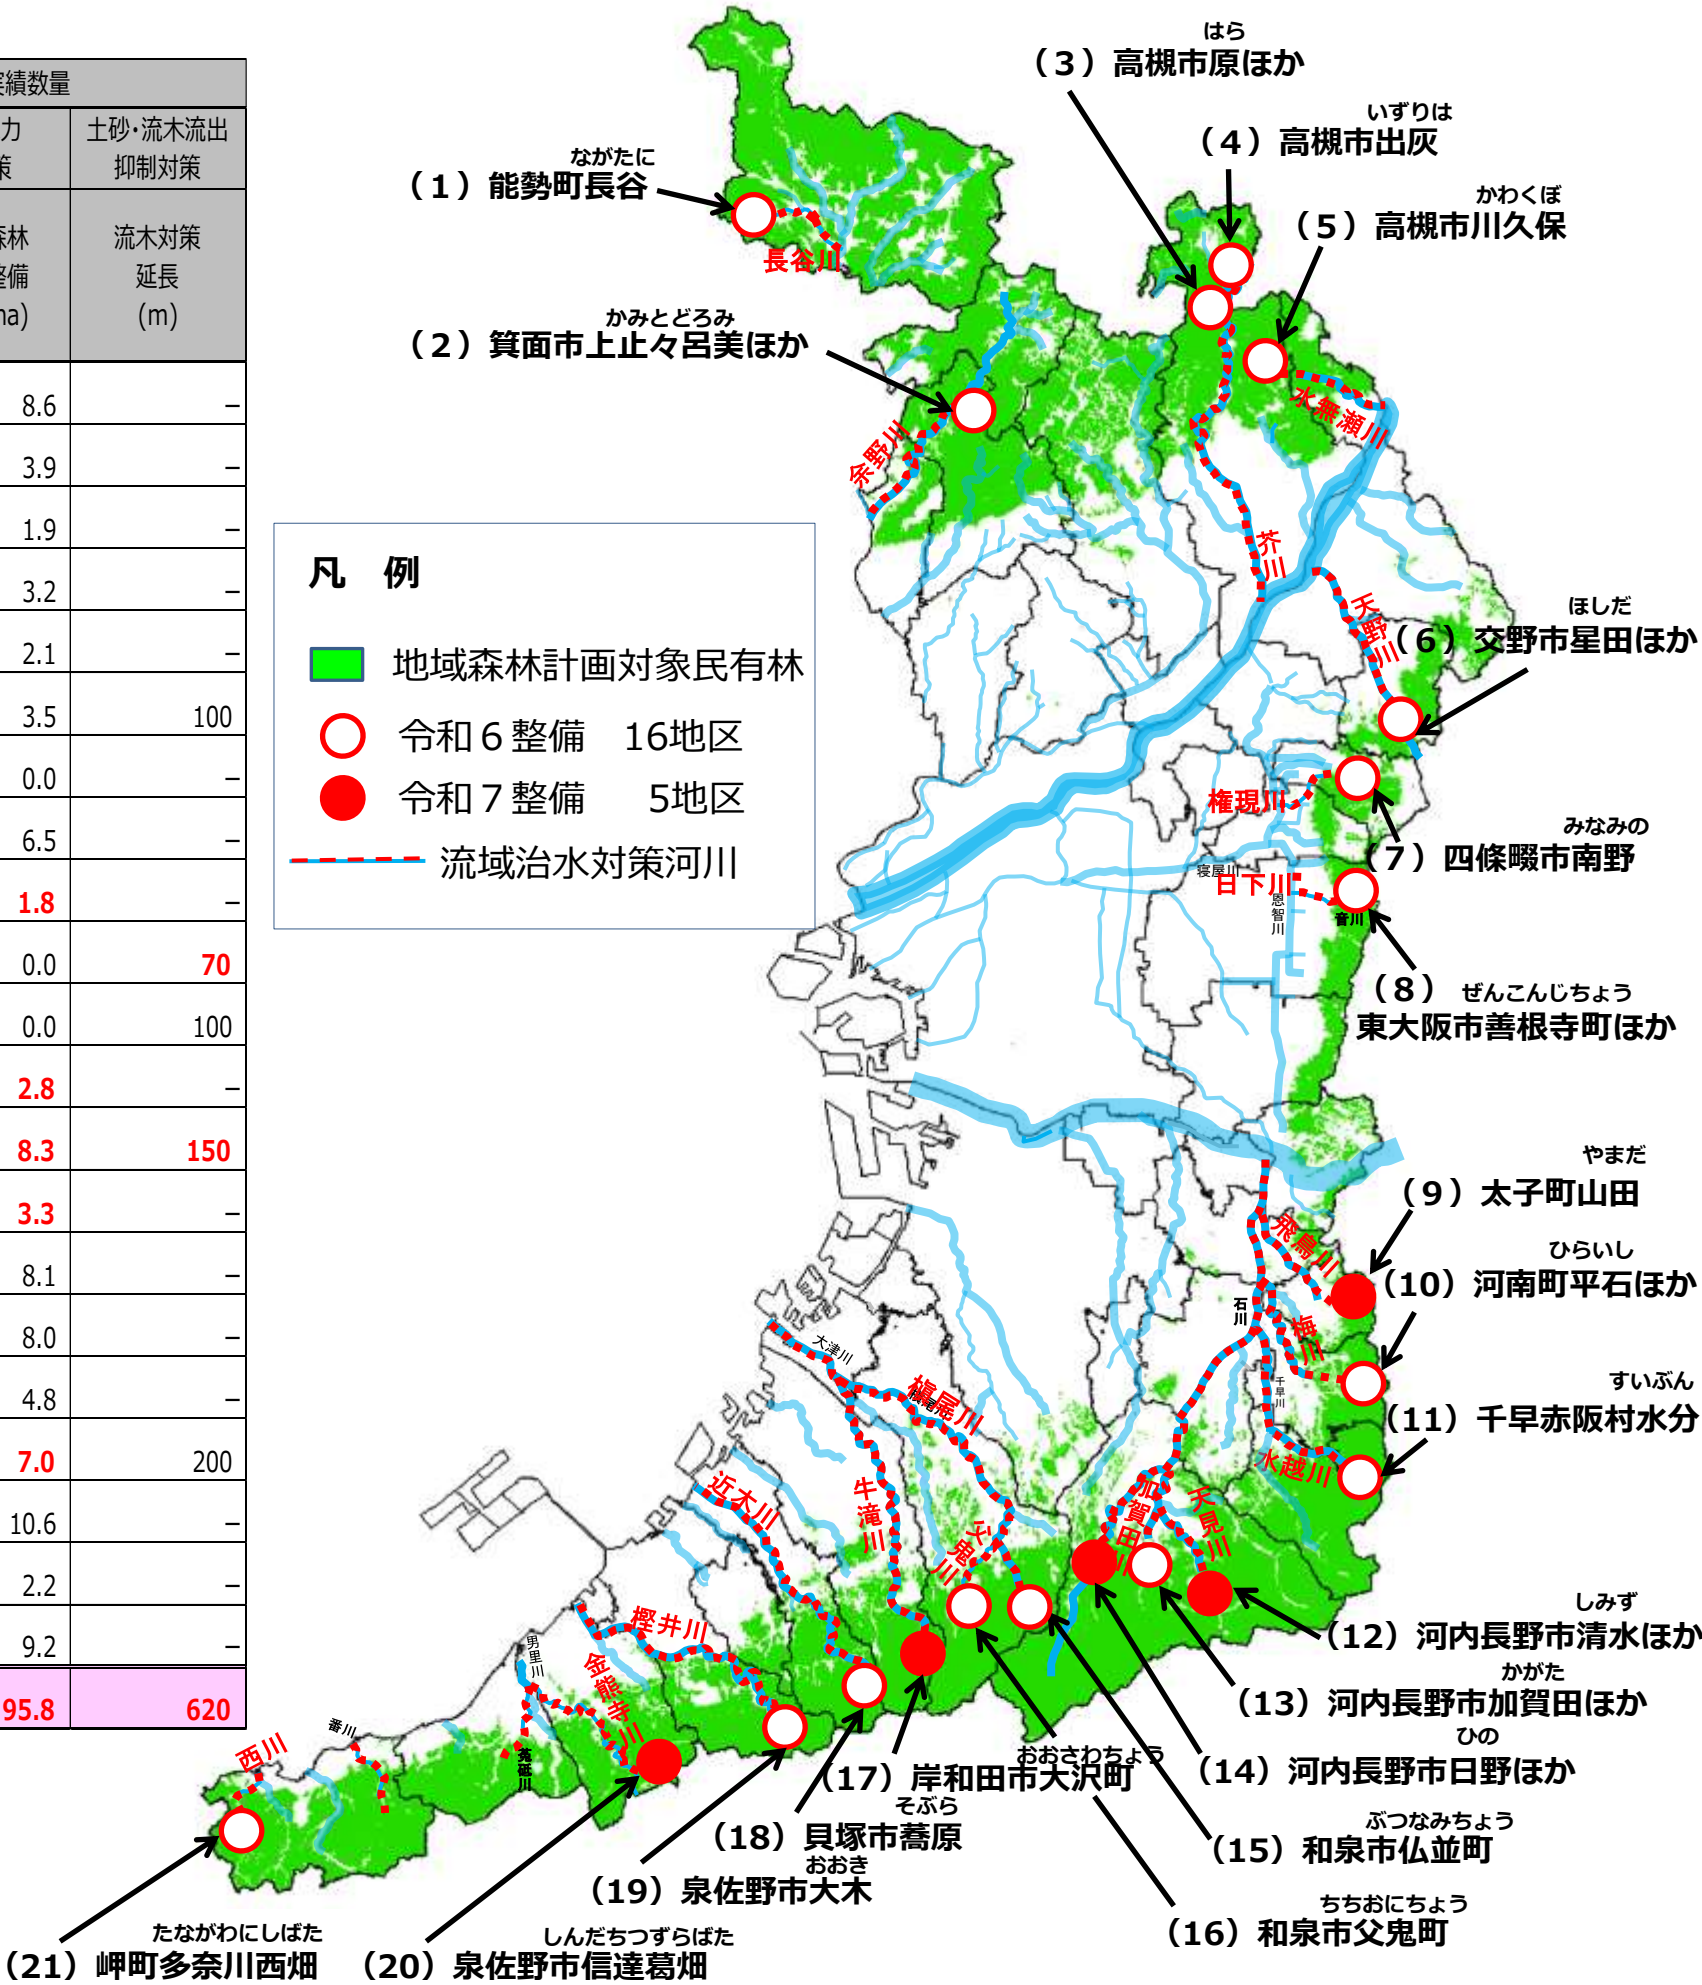

ながたに

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（1） 豊能郡能勢町長谷地区

【平面図】

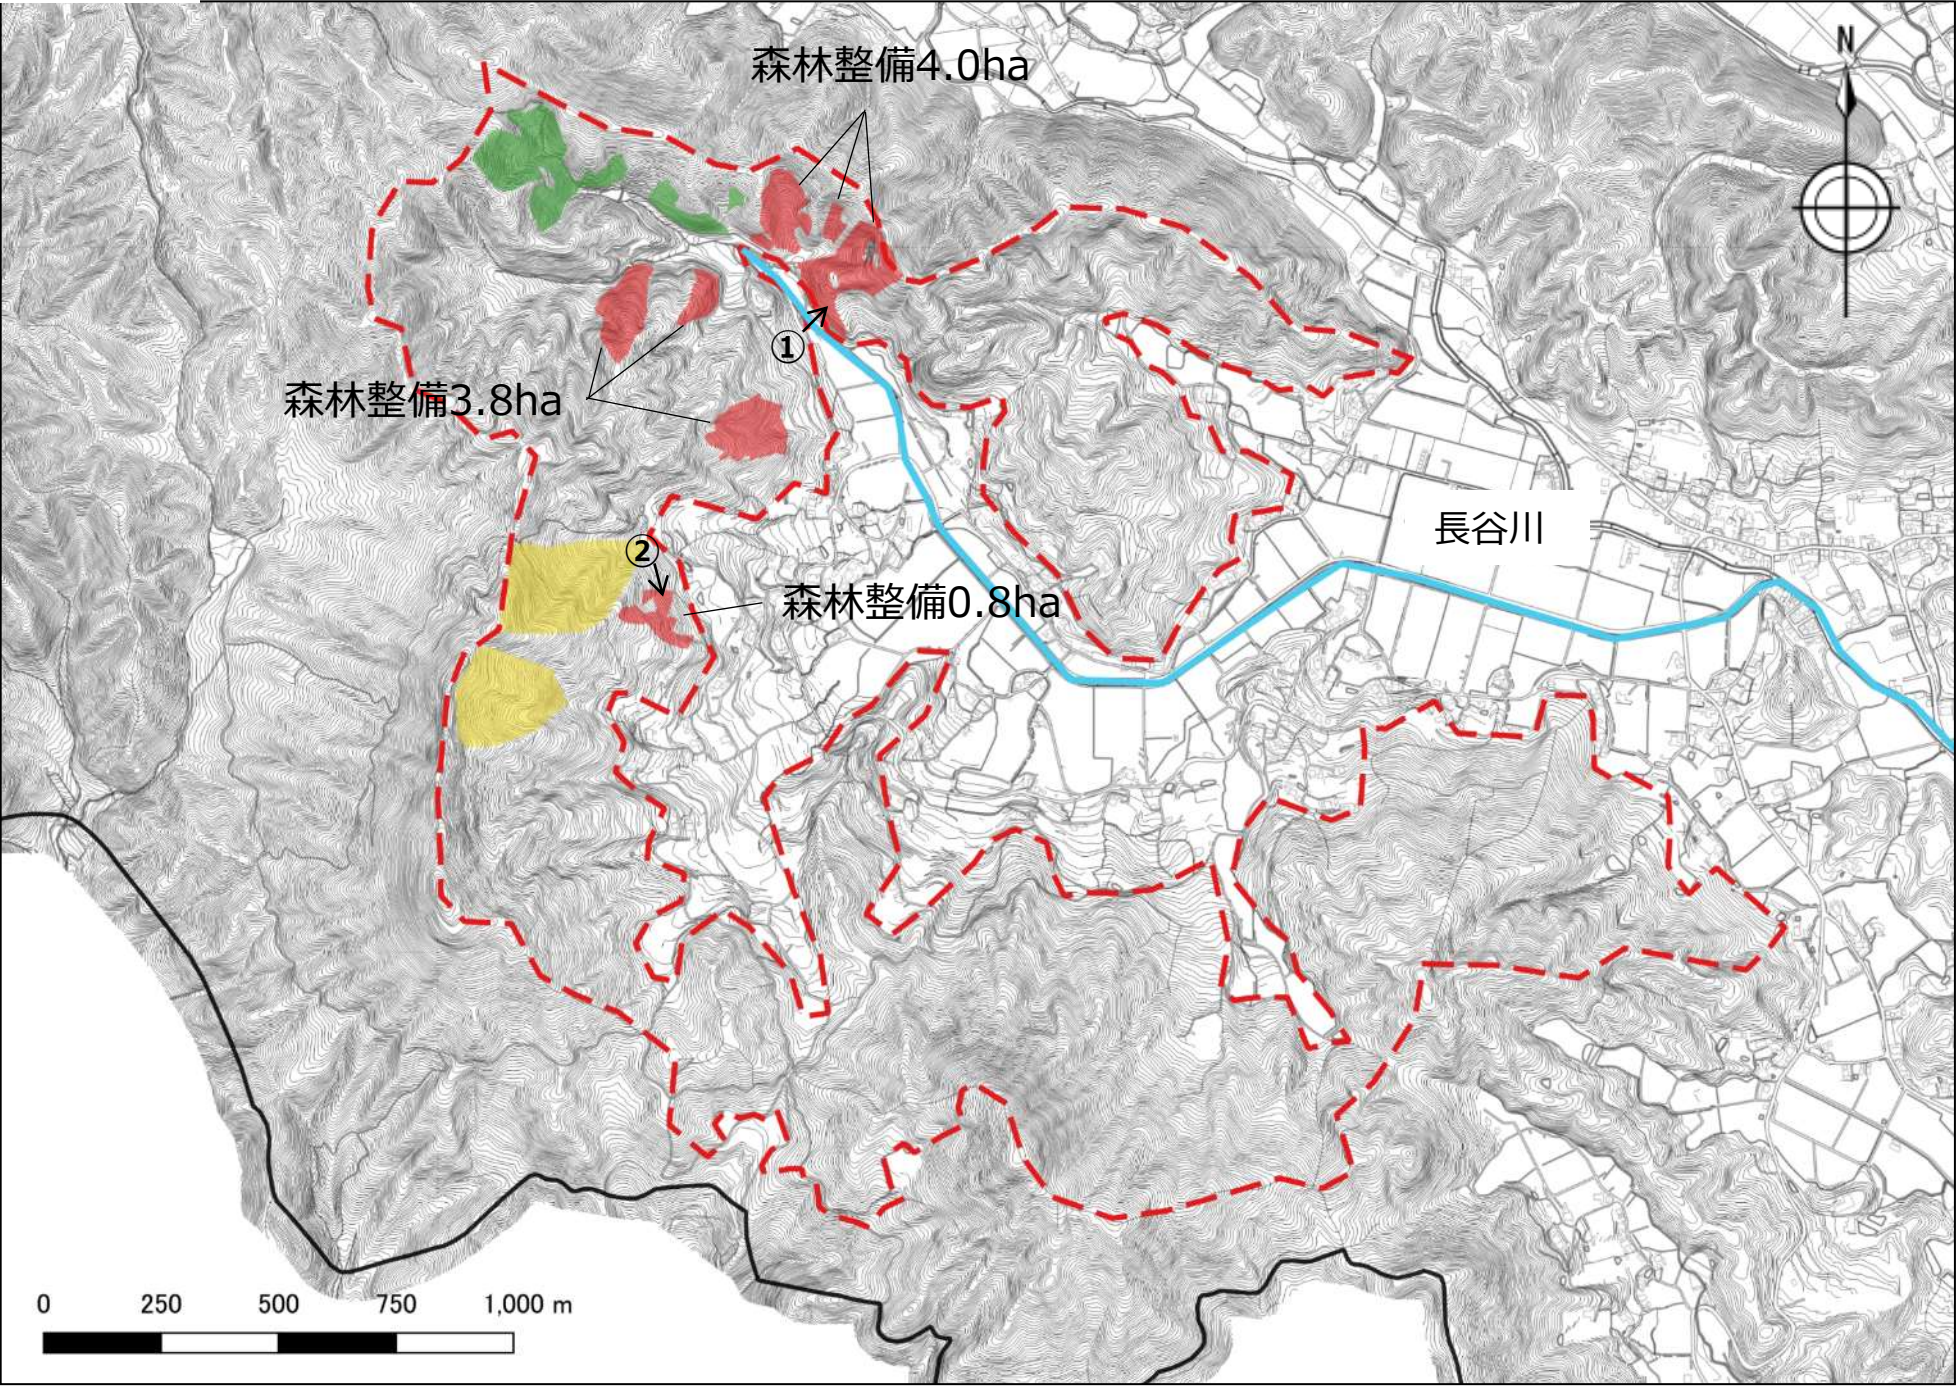

写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況




写真② 森林整備（筋工）の実施状況

【凡例】					
	事業対象区域		森林整備（R6）		森林整備（R7）
	流域治水対策河川		森林整備（R8）	→① 写真撮影位置	

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備（ha）	4.3	8.6	9.0	18.1	40.0

内 容	R7 計画	R7 実績	備 考
森林整備 (ha)	8.6	8.6	

とどろみ 令和7年度 流域保全森林防災事業実績（2） 箕面市止々呂美地区

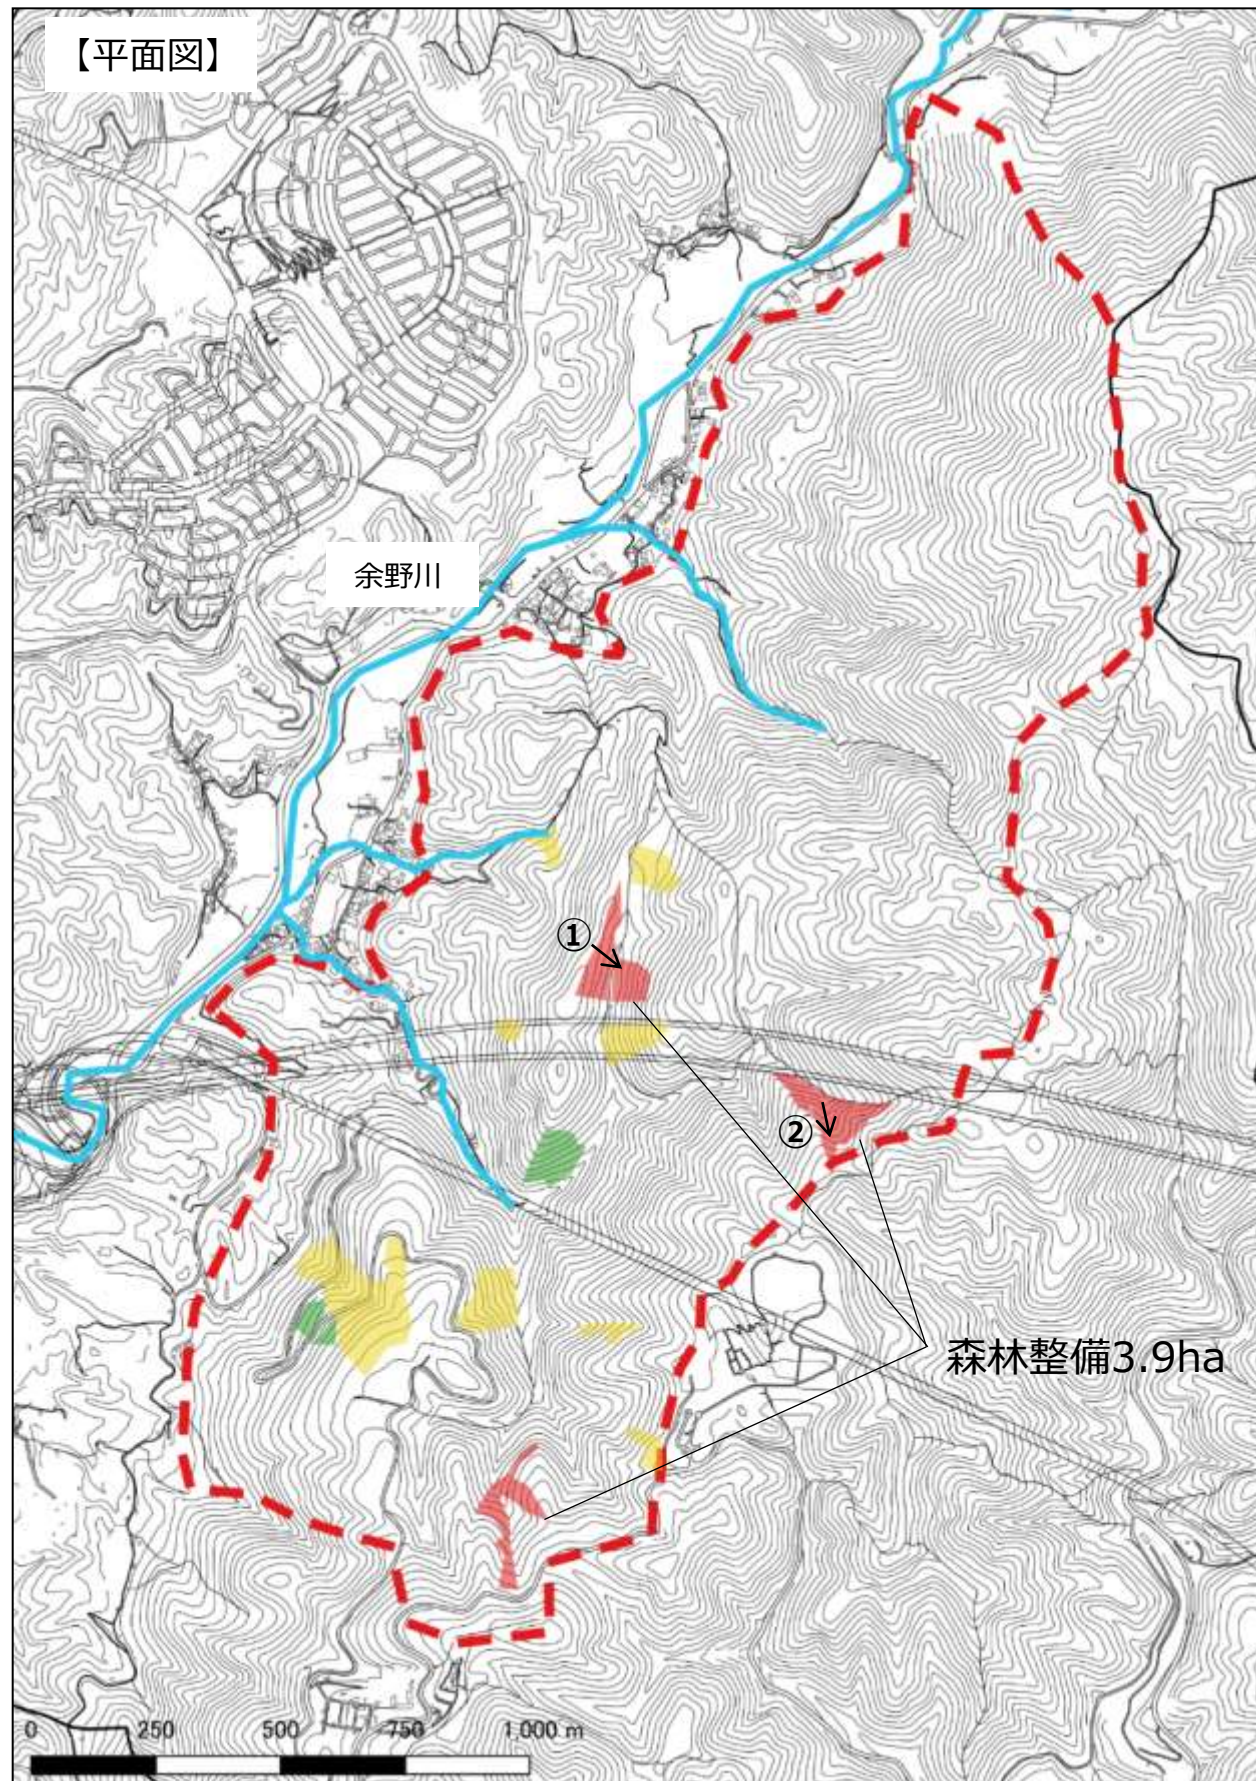

【凡例】


--- 事業対象区域
 — 流域治水対策河川
 ■ 森林整備（R6）
 ■ 森林整備（R7）
 ■ 森林整備（R8）
 →① 写真撮影位置



写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況



施工前



施工後


写真② 森林整備（筋工）の実施状況

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 (ha)	3.9	3.9	

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備 (ha)	1.4	3.9	8.0	14.7	28.0

はら

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（3） 高槻市原地区

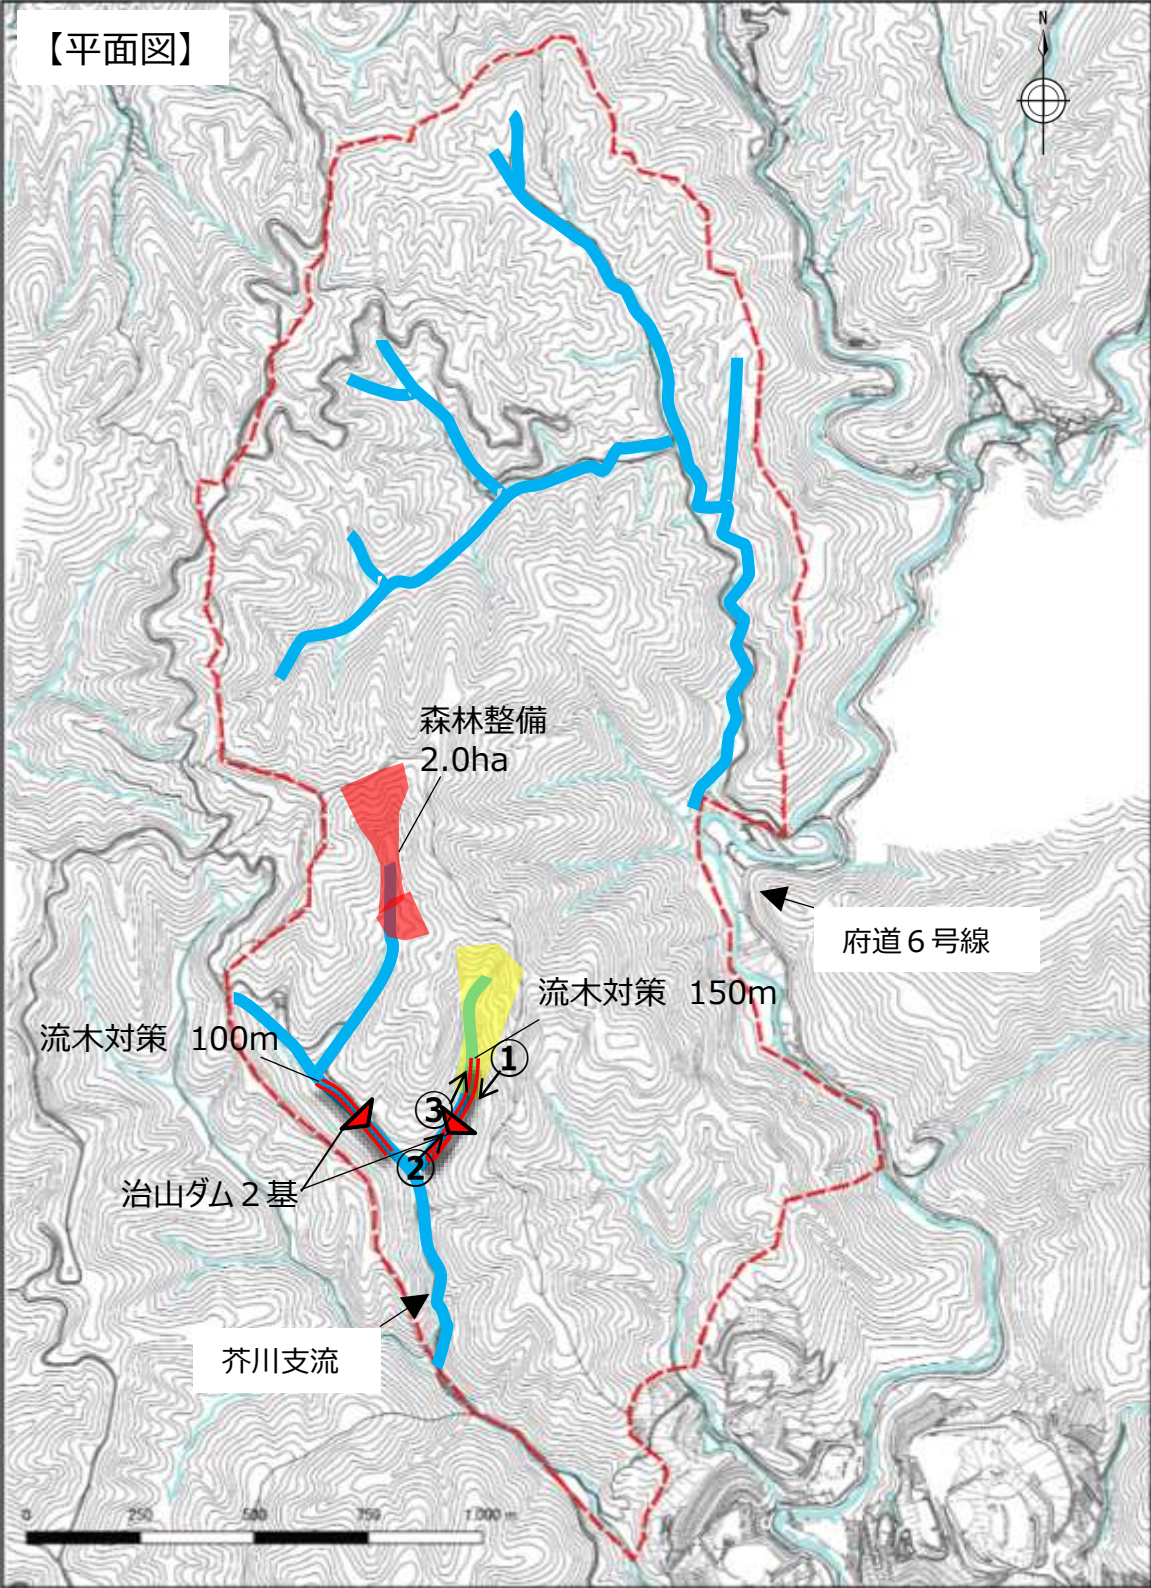

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備 (ha)	—	2.0	2.0	16.0	20.0
治山ダム (基)		2		1	

- 【凡例】
- 事業対象区域
 - 流域治水対策河川
 - ① 写真撮影位置
 - 治山ダム(R7)
 - 森林整備(R7)
 - 流木対策(R7)
 - 森林整備(R8)



写真① 施工前



写真② 施工後
治山ダム（鋼製）の設置状況




施工前



写真③ 流木対策工の実施状況
施工後

内 容	R7 計画	R7 実績	備 考
森林整備 (ha)	2.0	2.0	
治山ダム (基)	2	2	
流木対策工 (m)	250	250	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（4） いずりは
高槻市出灰地区

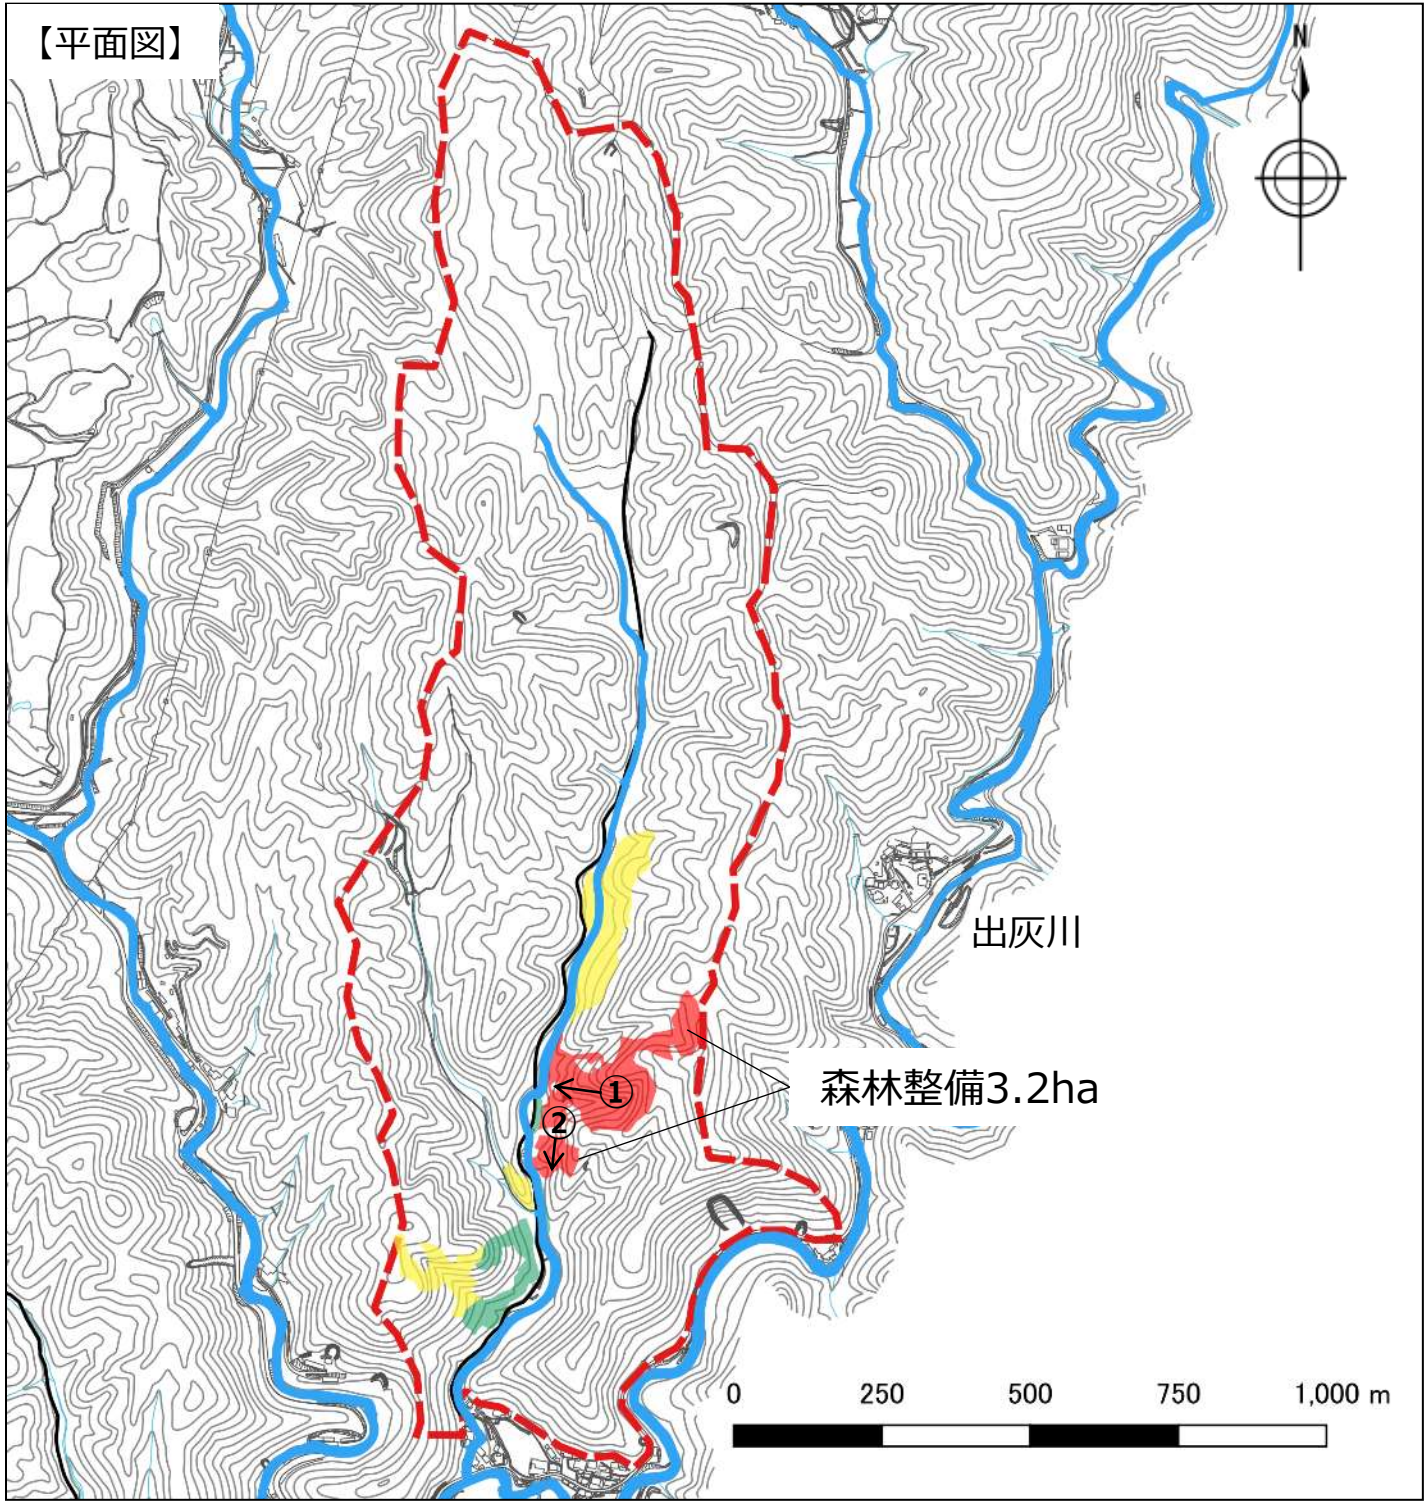

写真① 森林整備（風倒木処理）の実施状況



写真② 森林整備（風倒木処理）の実施状況


内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備 (ha)	1.2	3.2	3.0	4.6	12.0
治山ダム (基)				2	

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 (ha)	3.5	3.2	

かわくぼ

令和7年度 流域治水対策事業実績（5） 高槻市川久保地区

【平面図】

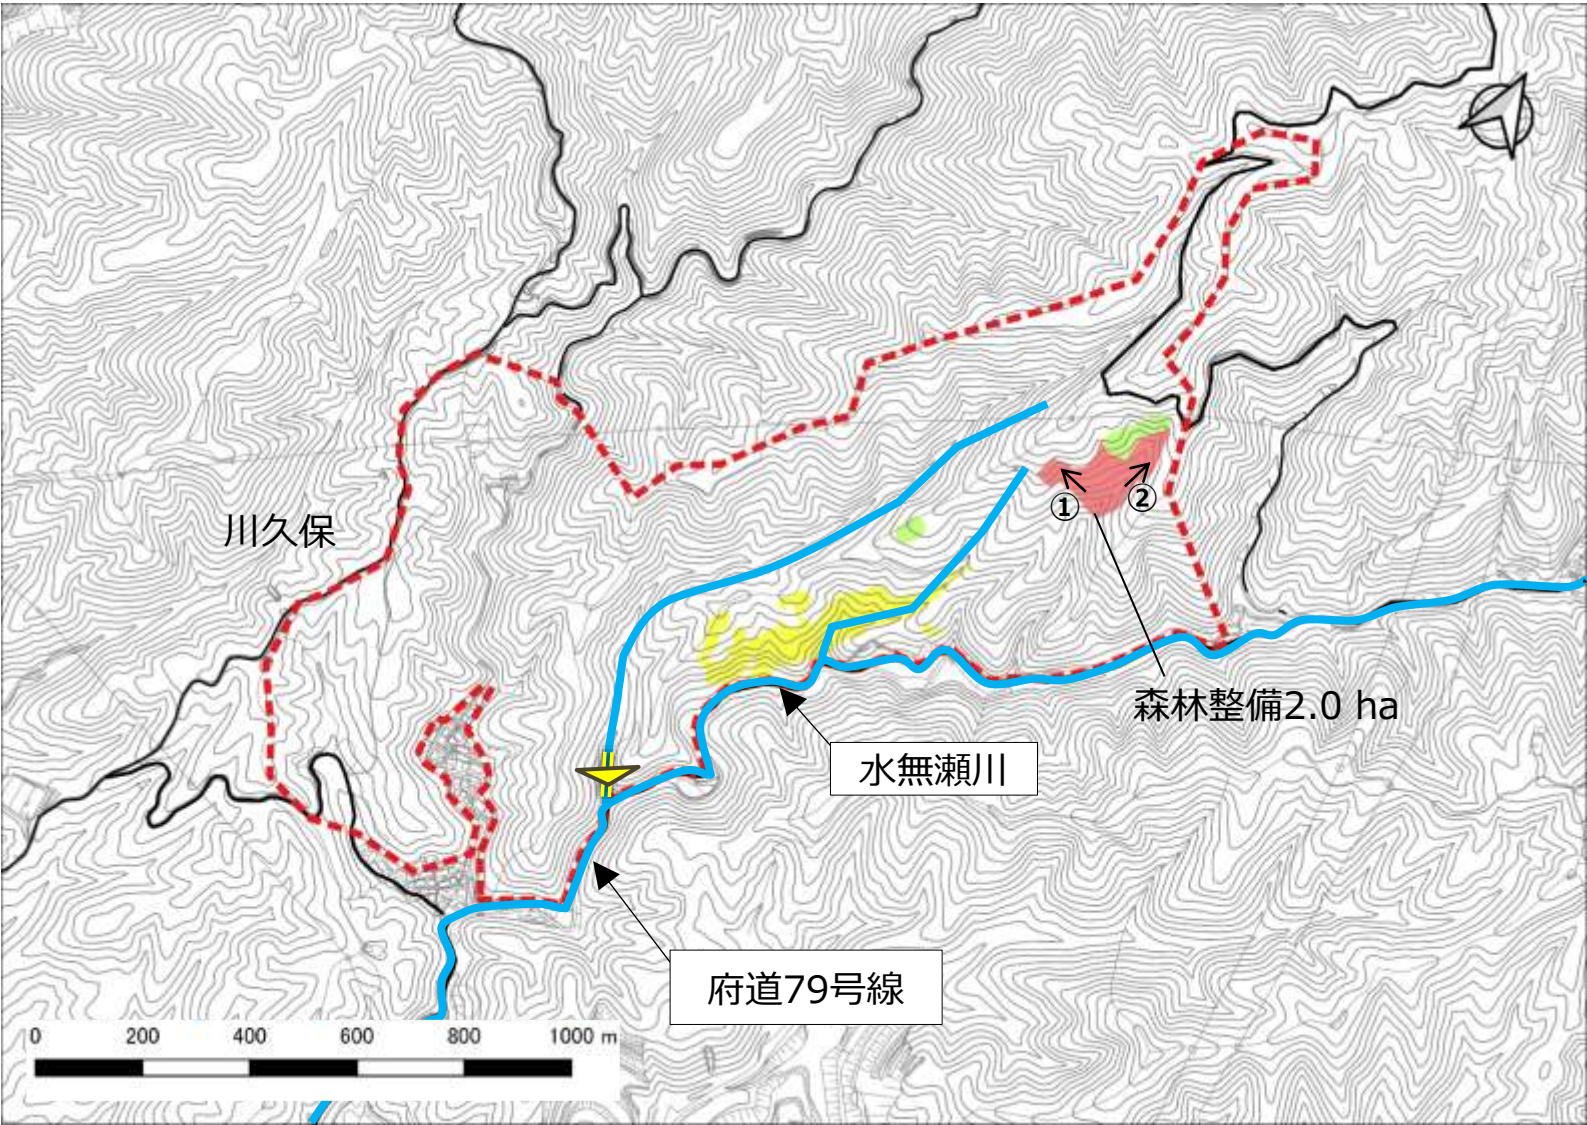

【凡例】					
	事業対象区域		森林整備（R6）		森林整備（R7）
	流域治水対策河川		治山ダム（R8）		森林整備（R8）
			流木対策（R8）		写真撮影位置

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備（ha）	0.5	2.0	3.5	15.0	21.0
治山ダム（基）			1	1	2



写真① 森林整備（風倒木処理）の実施状況




写真② 森林整備（風倒木処理）の実施状況

内容	R7計画	R7実績	備考
森林整備（ha）	2.1	2.0	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（6）

ほしだ 交野市星田地区

【平面図】

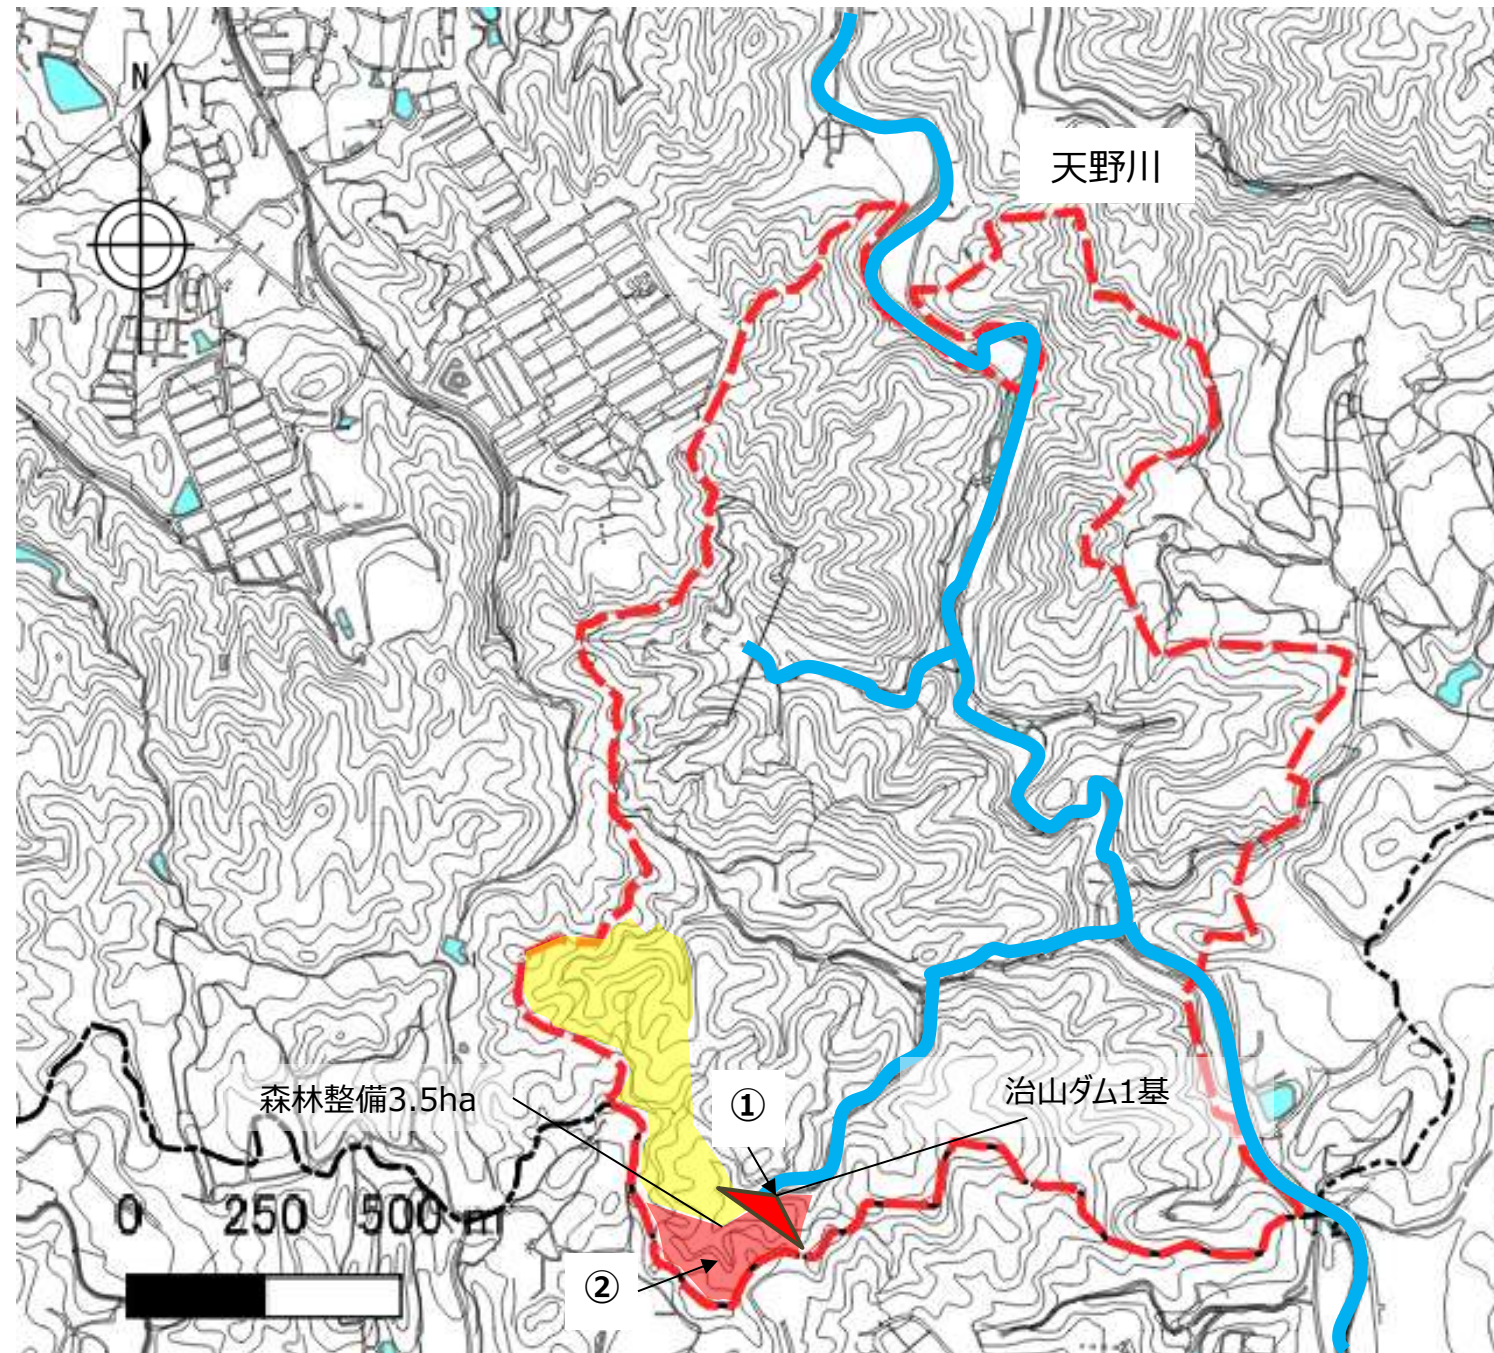

内容	R7計画	R7実績	備考
森林整備 (ha)	3.5	3.5	
治山ダム (基)	1	1	
流木対策 (m)	100	100	

事業対象区域	森林整備 (R7)
流域治水対策河川	治山ダム (R7)
→① 写真撮影位置	森林整備 (R8)

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備 (ha)	-	3.5	8.0	15.0	26.5
治山ダム (基)	-	1	0	0	1

【R7年度の施工状況】



撮影日：R6.7.22

施工前



撮影日：R8.4.24

写真① 治山ダム（鋼製）の設置状況



撮影日：R6.7.22

施工前



撮影日：R8.3.26

施工後

写真② 森林整備（筋工）の実施状況


中部農と緑の総合事務所

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（8）

東大阪市善根寺町ほか地区

ぜんこんじちょう

【平面図】

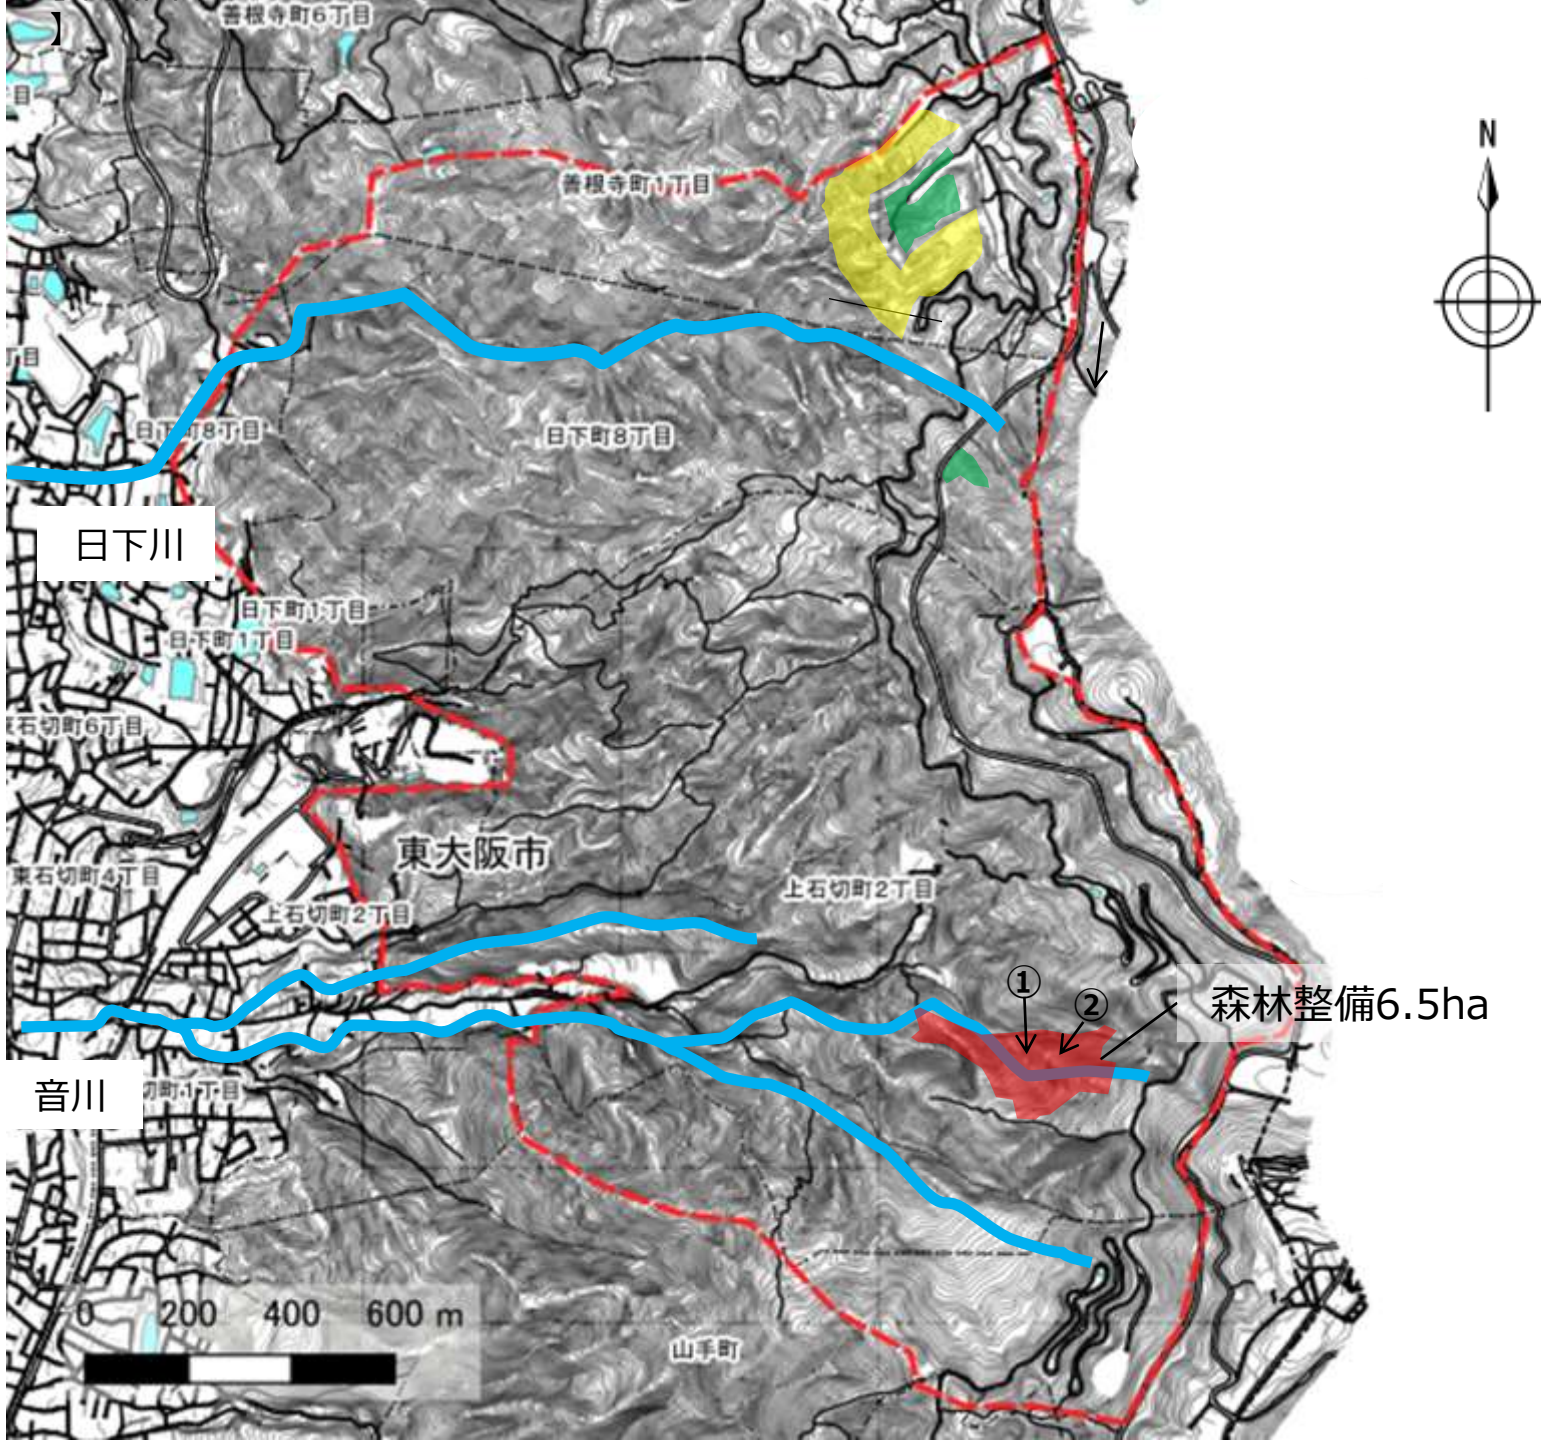

【凡例】					
	事業対象区域		森林整備（R6）		森林整備（R7）
	森林整備（R8）		流域治水対策河川	→① 写真撮影位置	

内容	R6 （実績）	R7 （実績）	R8 （計画）	R9～10 （予定）	合計
森林整備（ha）	3.0	6.5	9.0	17.5	36.0



撮影日：R8.2.27

写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況




撮影日：R8.2.27

写真② 森林整備（筋工）の実施状況

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 （ha）	6.5	6.5	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（9） やまだ 南河内郡太子町山田地区

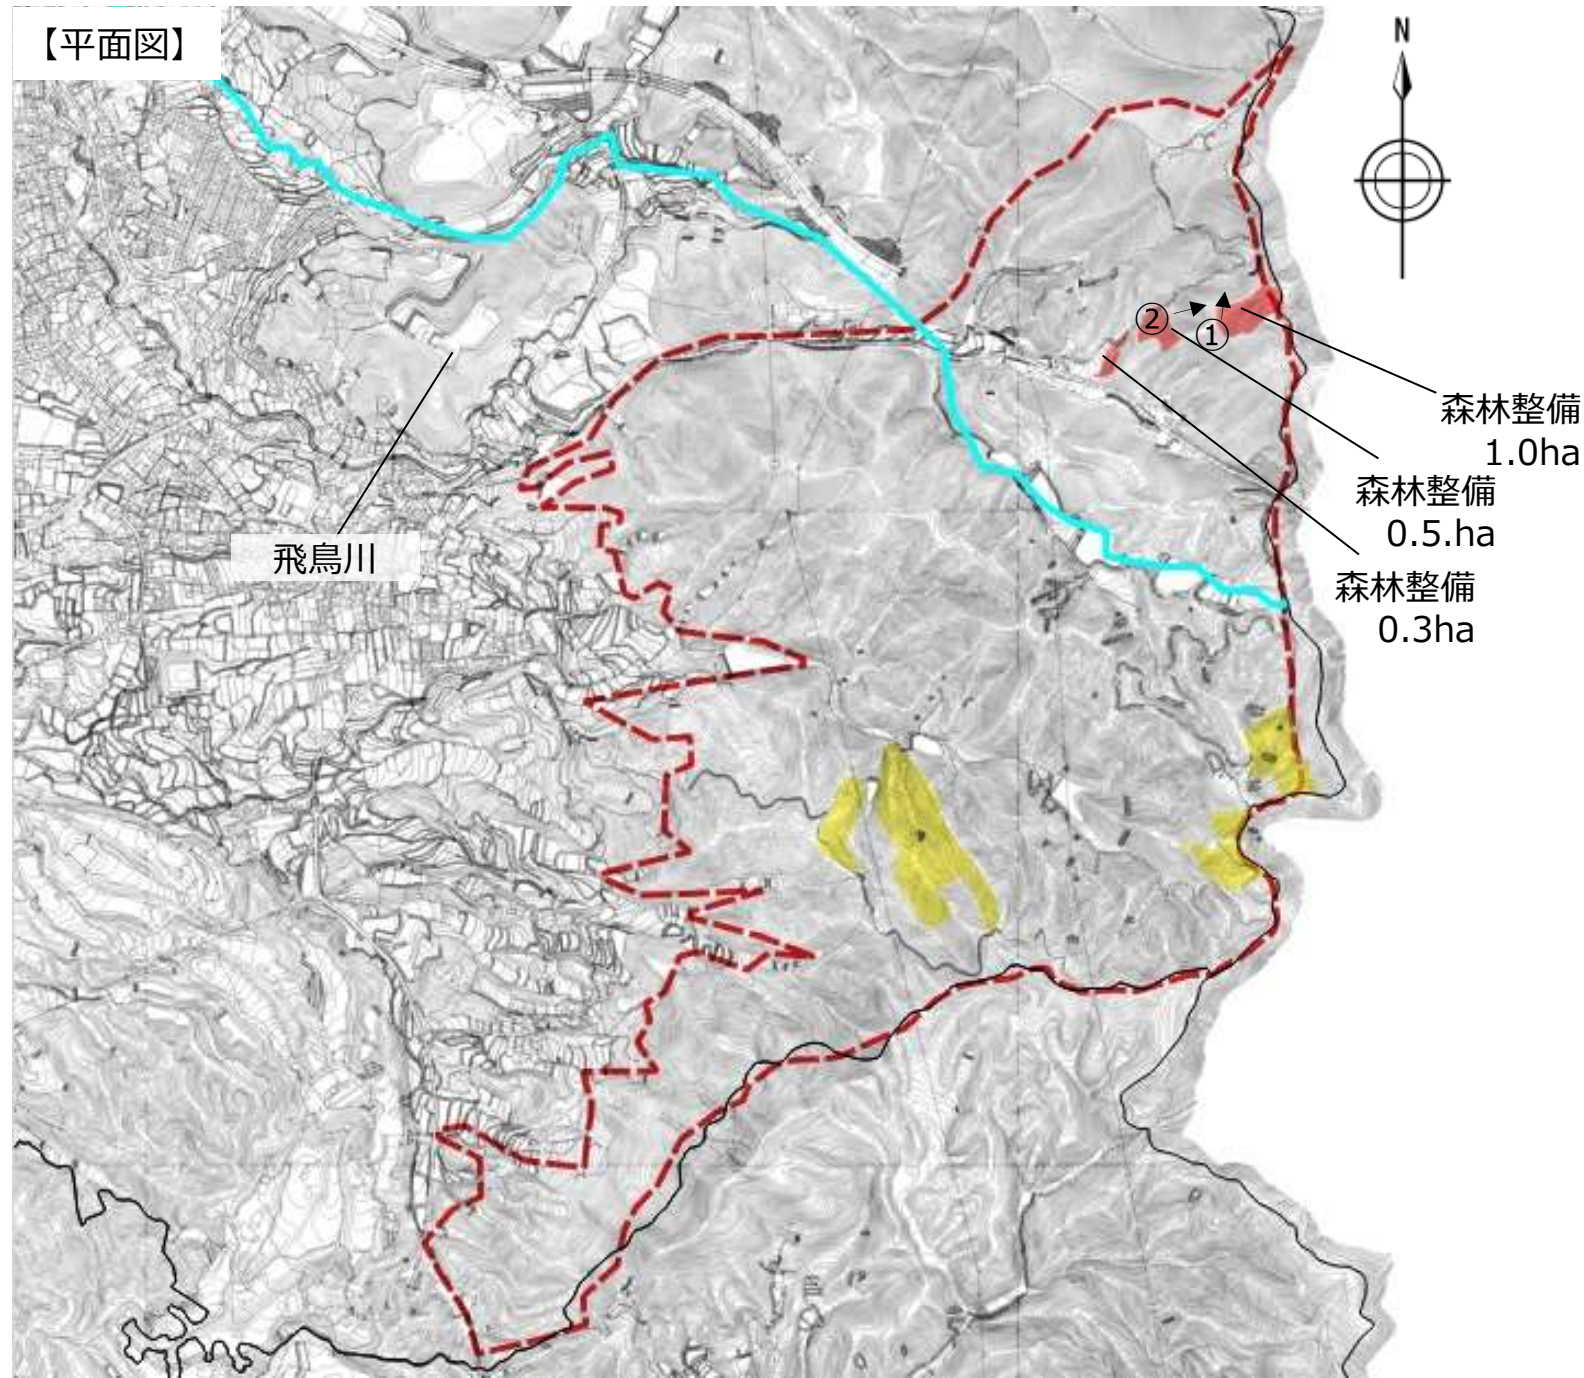

【凡例】

---	事業対象区域	■	森林整備（R7）	■	森林整備（R8）
---	流域治水対策河川	①→	写真撮影位置		

内 容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合 計
森林整備 (ha)	—	1.8	8.7	17.4	28.0



写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況




写真② 森林整備（筋工）の実施状況

内容	R7計画	R7実績	備考
森林整備 (ha)	1.8	1.8	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（10）

南河内郡河南町平石^{ひらいし}ほか地区

【平面図】

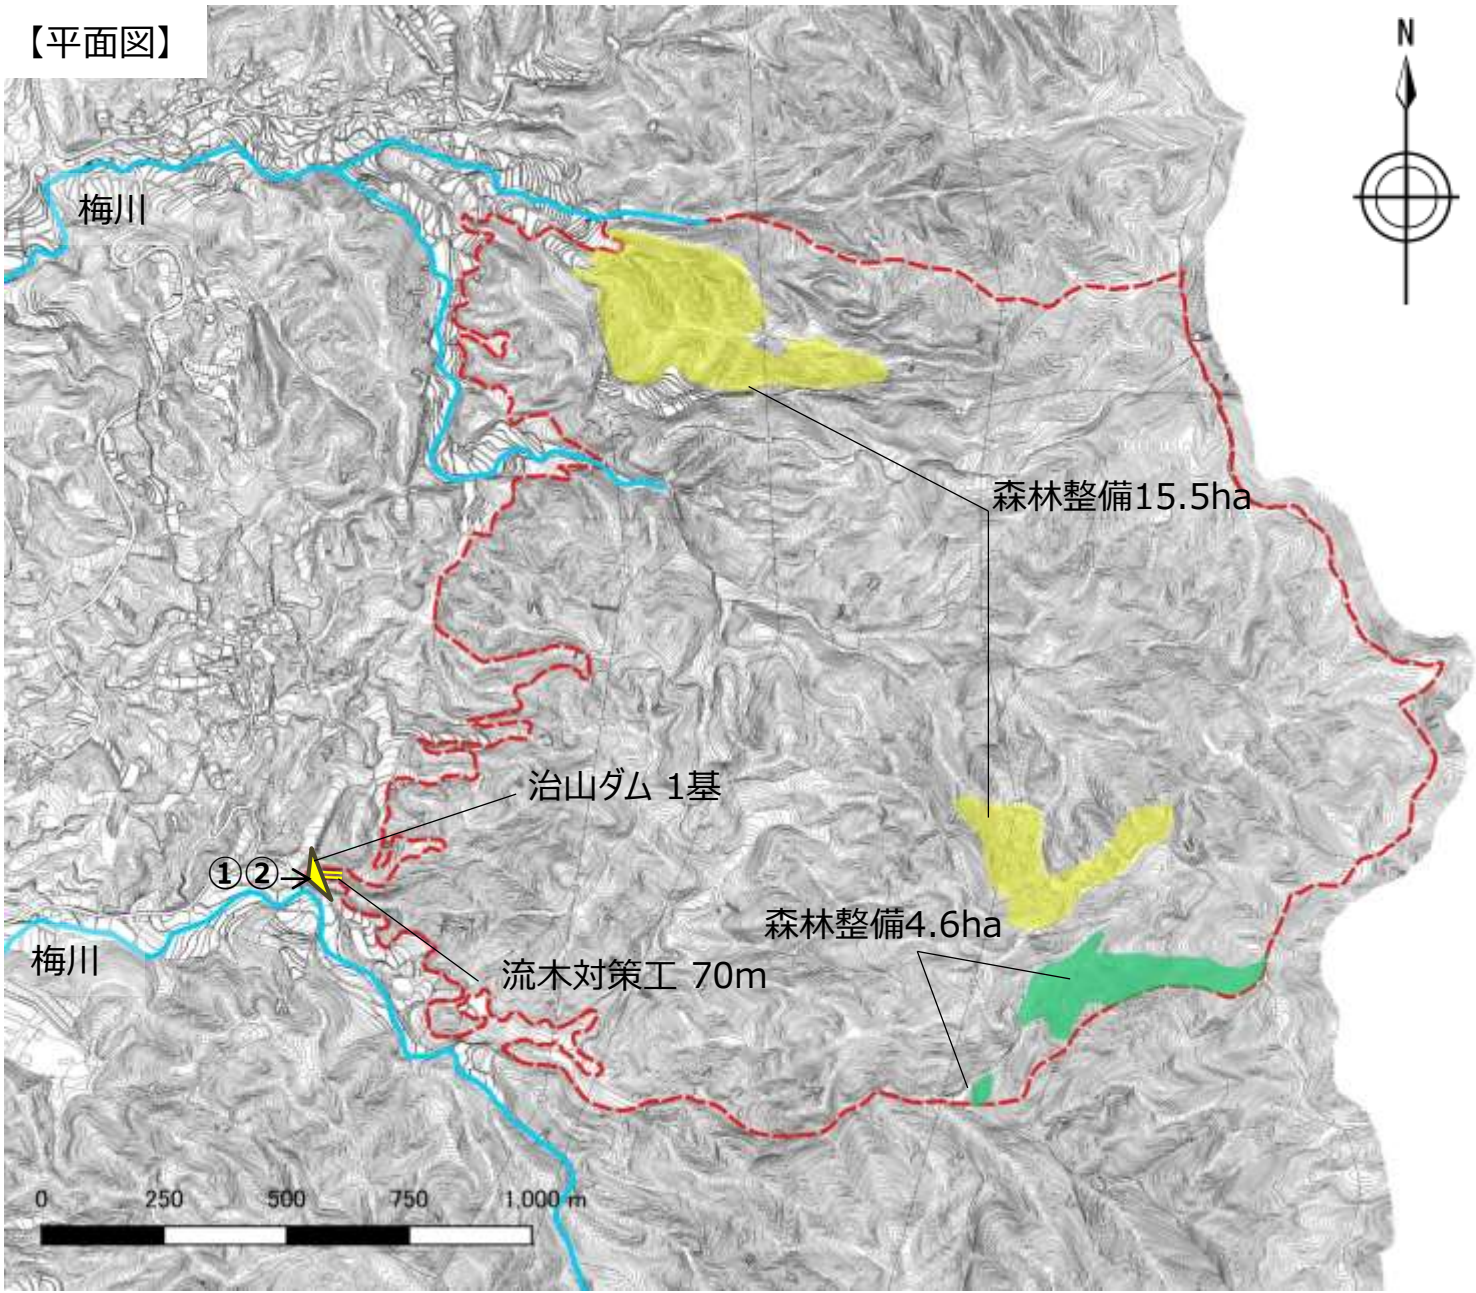

【凡例】
■ 森林整備（R6） ■ 森林整備（R8）
--- 事業対象区域 ■ 治山ダム（R7）
--- 流域治水対策河川 ①→ 写真撮影位置 ■ 流木対策（R7）

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9 (予定)	合計
森林整備 (ha)	4.6	—	15.5	4.9	25.0
治山ダム (基)	—	1	—	3	4

施工前



撮影日：R7.8.5

写真① 治山ダムの設置状況



撮影日：R8.5.11

施工前



撮影日：R7.8.5

写真② 流木対策工の実施状況




施工後

撮影日：R8.2.5

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備（ha）	10.5	—	入札不調のため
治山ダム（基）	1	1	
流木対策工（m）	—	70	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（11） 南河内郡千早赤阪村水分地区

【平面図】

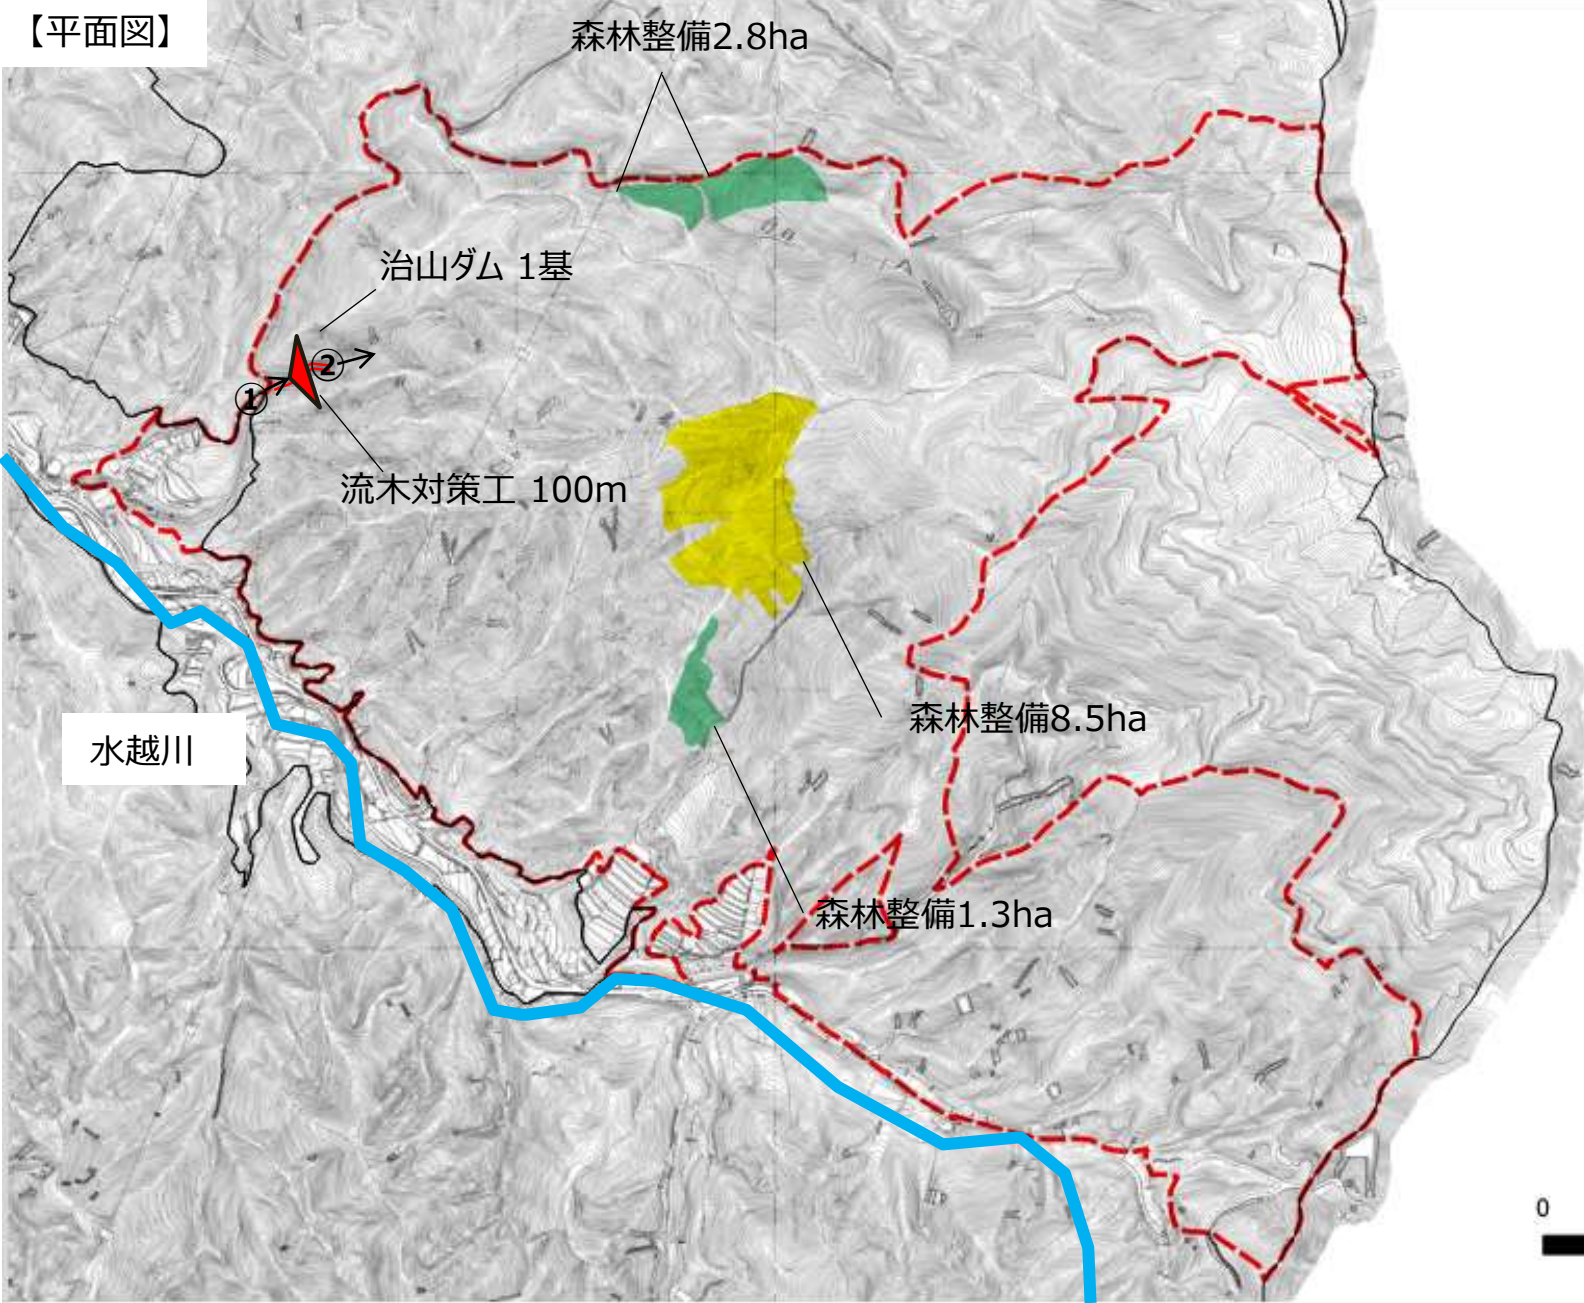

【凡例】		森林整備（R6）	森林整備（R8）
事業対象区域	治山ダム（R7）	① →	写真撮影位置
流域治水対策河川	流木対策（R7）		

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備 (ha)	4.1	—	8.5	25.4	38.0
治山ダム (基)	—	1(本堤)	(副堤)	—	1



写真① 治山ダムの設置状況



施工前




施工後

写真② 流木対策工の実施状況

内容	R7計画	R7実績	備考
森林整備(ha)	—	—	入札不調のため
治山ダム(基)	1	1	
流木対策工(m)	100	100	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（12） ^{しみず}河内長野市清水ほか地区

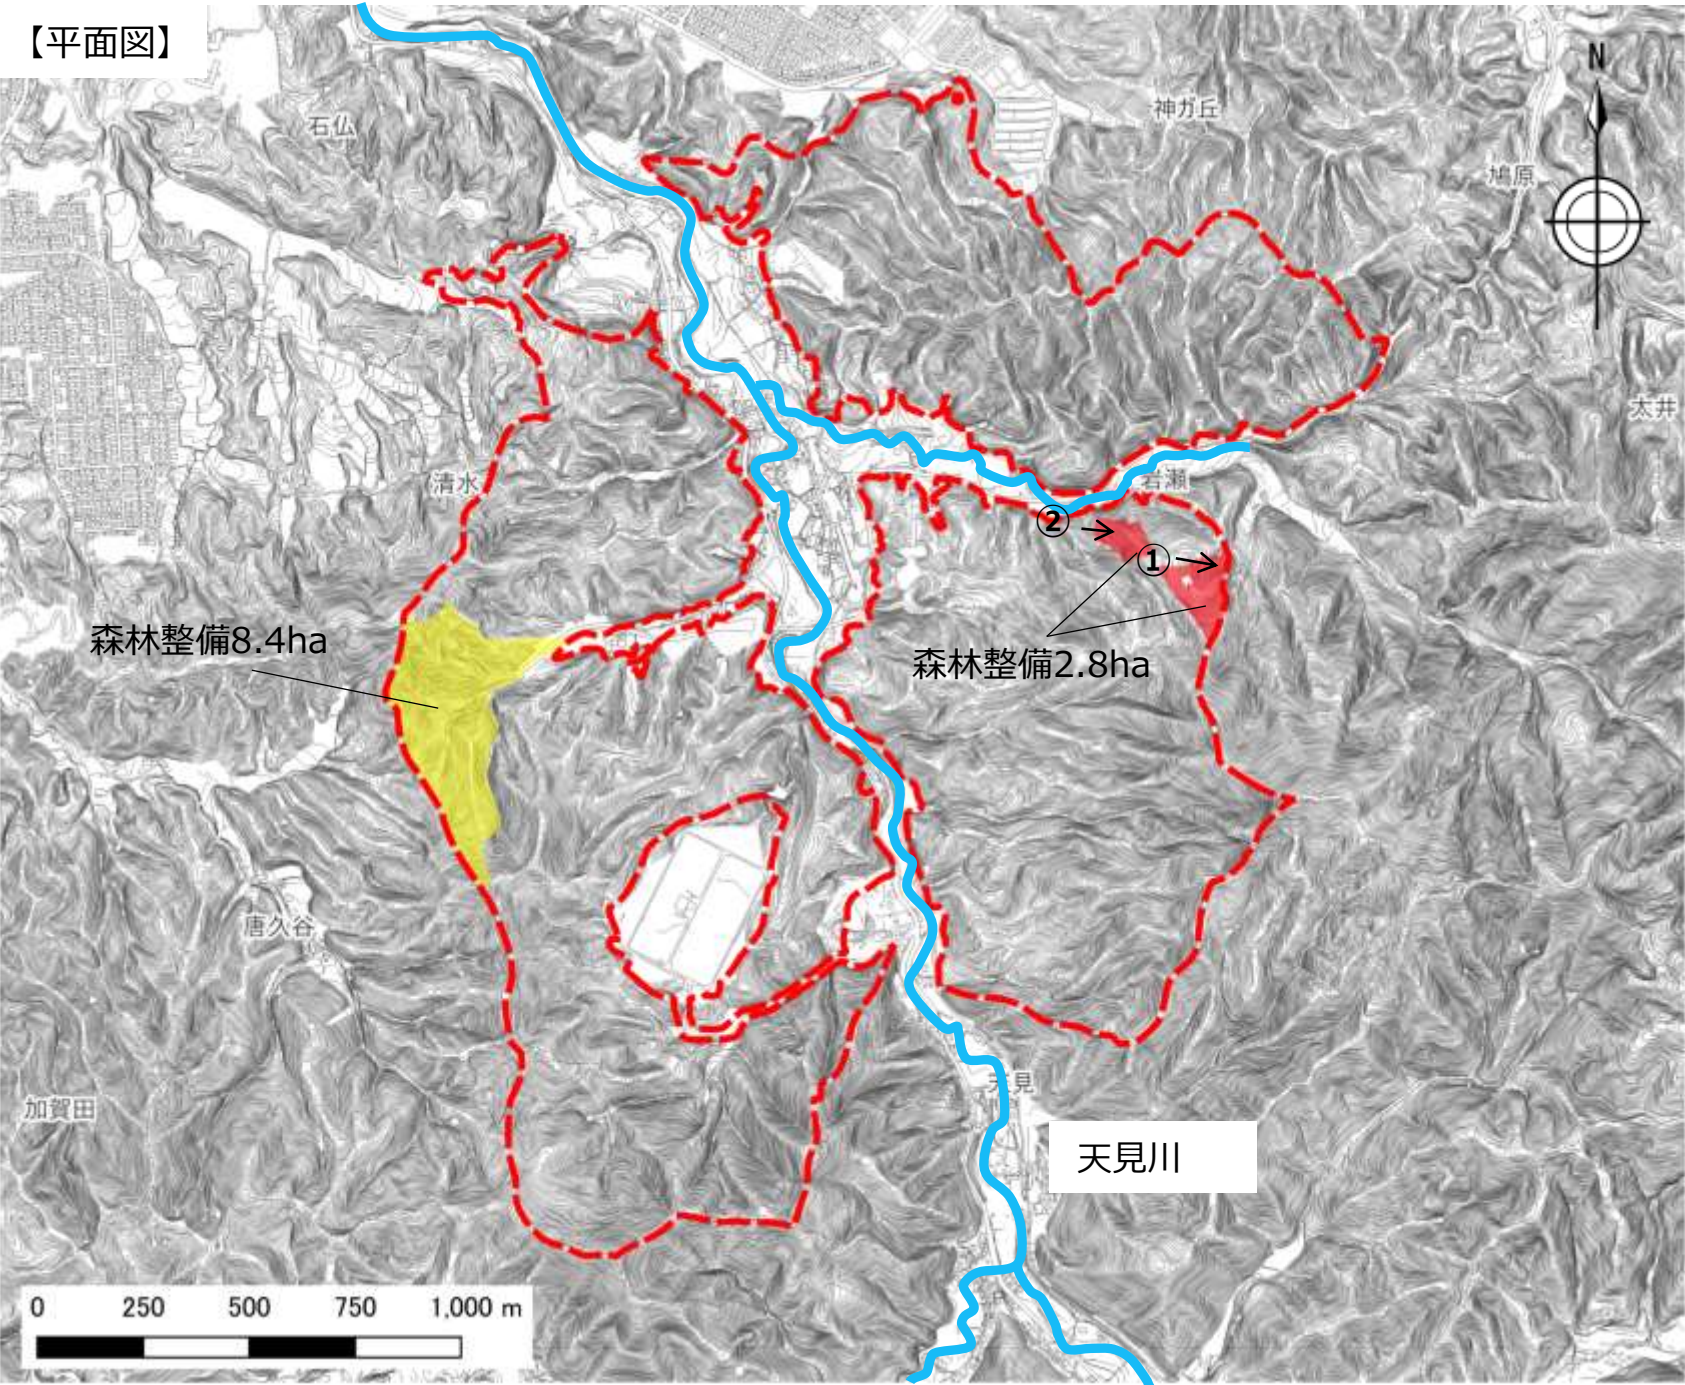

- 【凡例】
- 事業対象区域
 - 森林整備（R7）
 - 森林整備（R8）
 - ①→ 写真撮影位置
 - 流域治水対策河川

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備 (ha)	—	2.8	8.4	16.8	28.0



写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況




写真② 森林整備（筋工）の実施状況

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 (ha)	3.0	2.8	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（13） かがた 河内長野市加賀田ほか地区

【平面図】

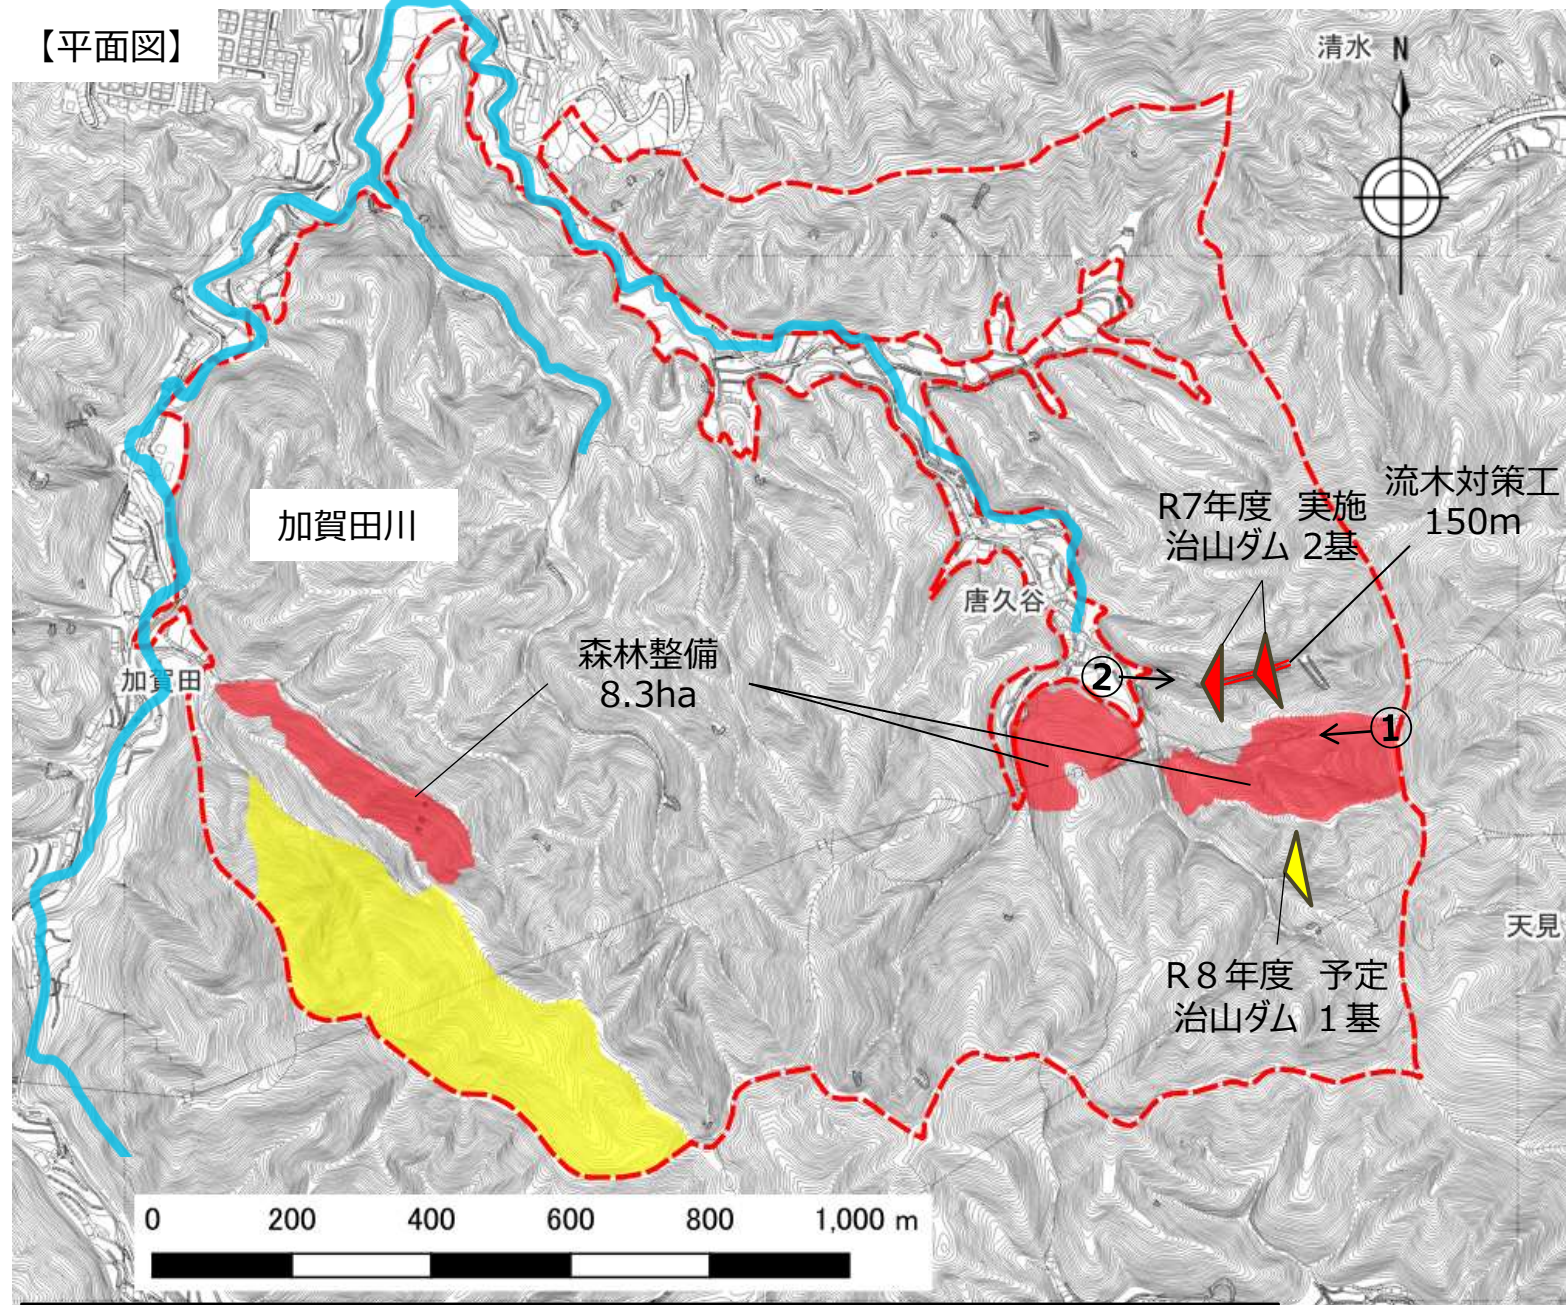

【凡例】		① →	写真撮影位置
---	事業対象区域	▲	治山ダム（R7）
---	流域治水対策河川	▲	治山ダム（R8）
---	流木対策（R7）	■	森林整備（R7）
		■	森林整備（R8）

内容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備 (ha)	2.9	8.3	5.6	11.2	28.2
治山ダム (基)	—	2	1	1	4



写真① 森林整備(本数調整伐・
筋工)の実施状況

撮影日：R7.9.25



撮影日：R8.3.13



撮影日：R7.9.11

写真② 治山ダムの設置状況




撮影日：R8.3.4

内容	R7計画	R7実績	備考
森林整備 (ha)	8.3	8.3	
治山ダム(基)	2	2	
流木対策工 (m)	100	150	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（14） ^{ひの}河内長野市日野ほか地区

【平面図】

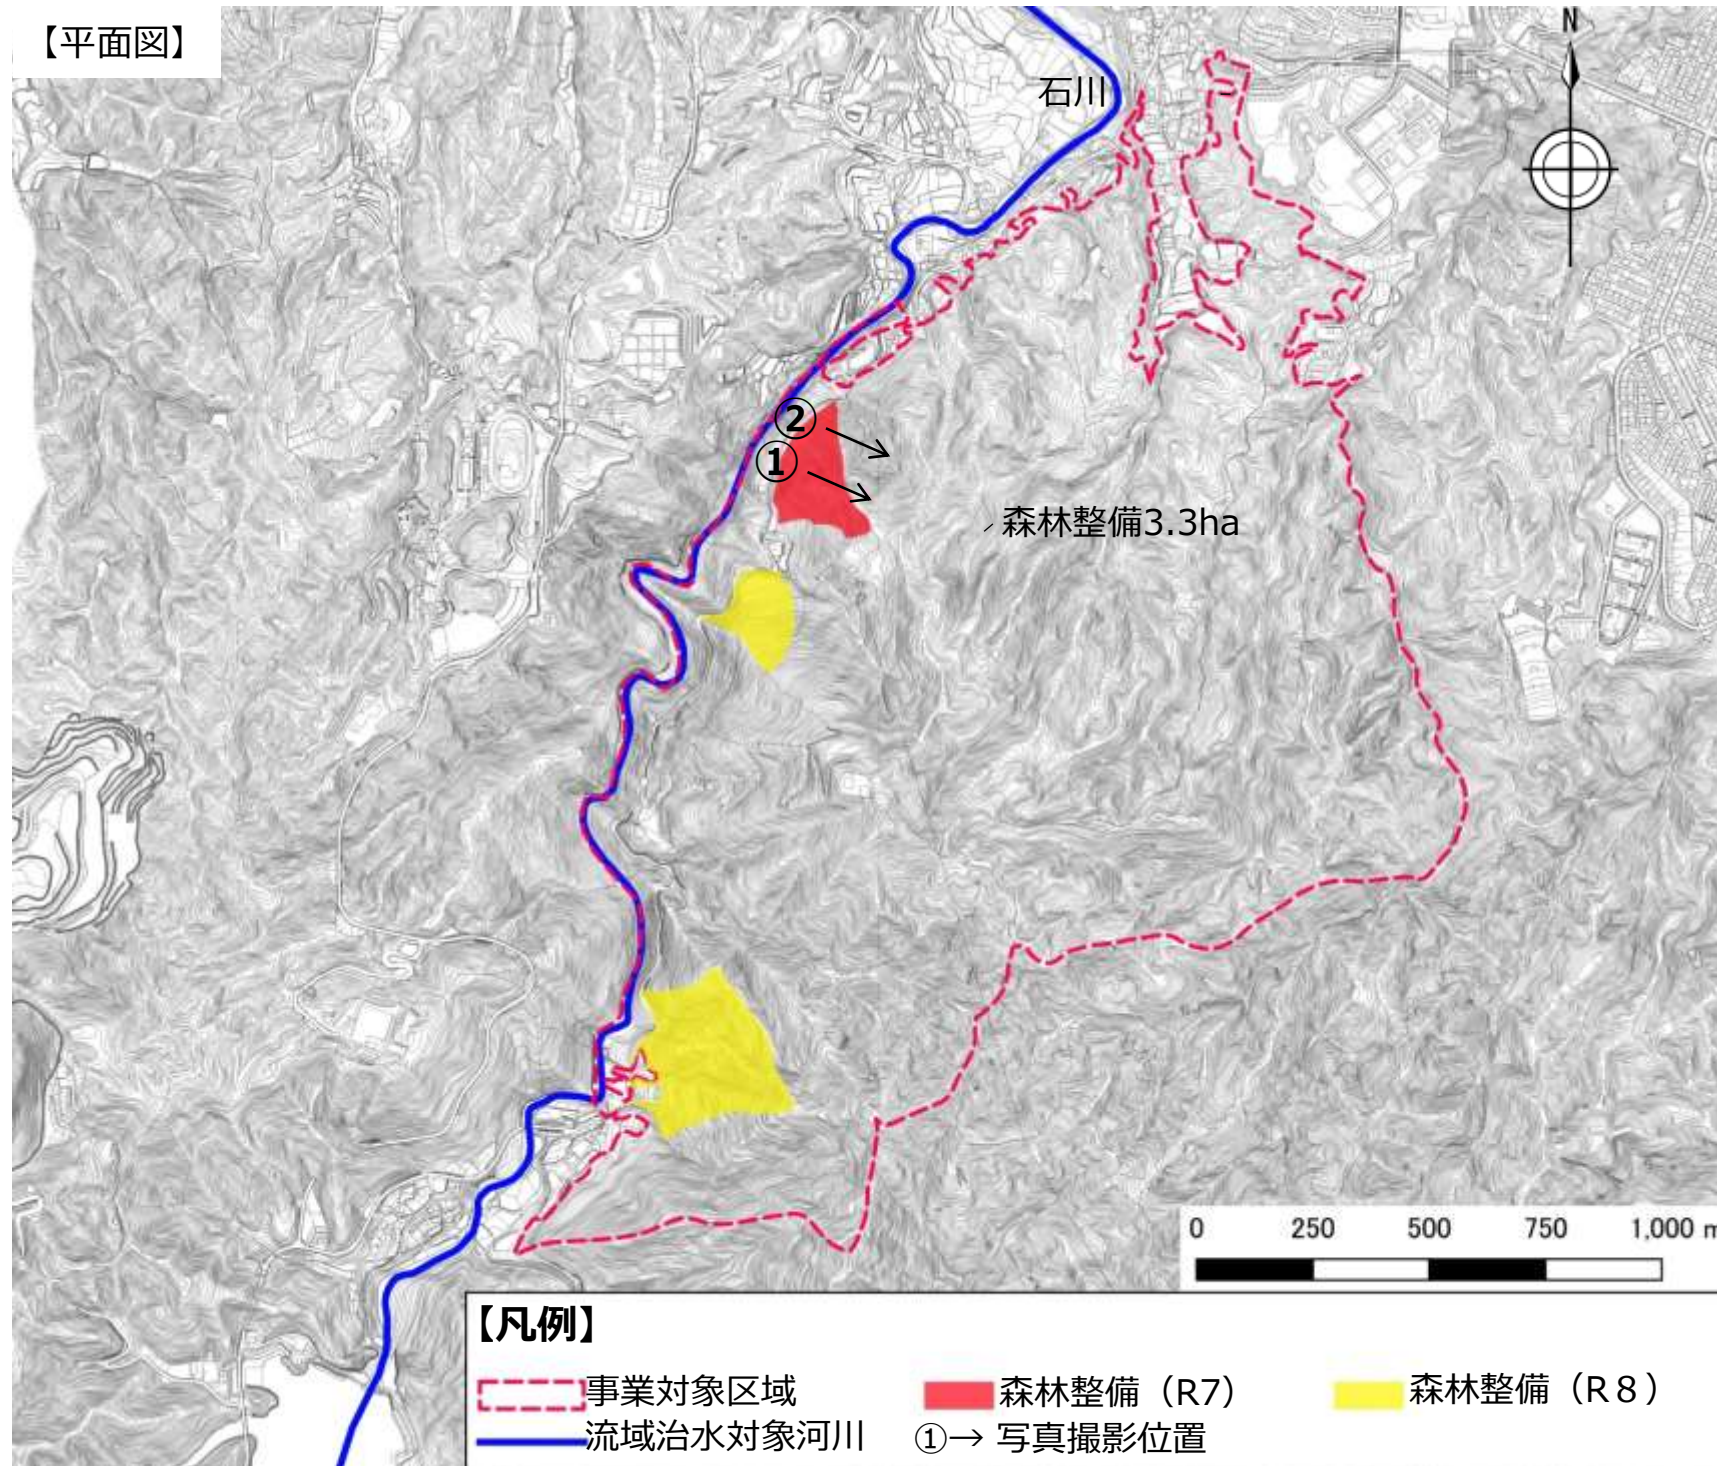

写真① 森林整備（本数調整伐・筋工）の実施状況



写真② 森林整備（本数調整伐・筋工）の実施状況


内 容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合計
森林整備 (ha)	—	3.3	8.6	17.1	29.0

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 (ha)	3.3	3.3	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（15）

和泉市^{ぶつなみちよう}仏並町地区

【平面図】

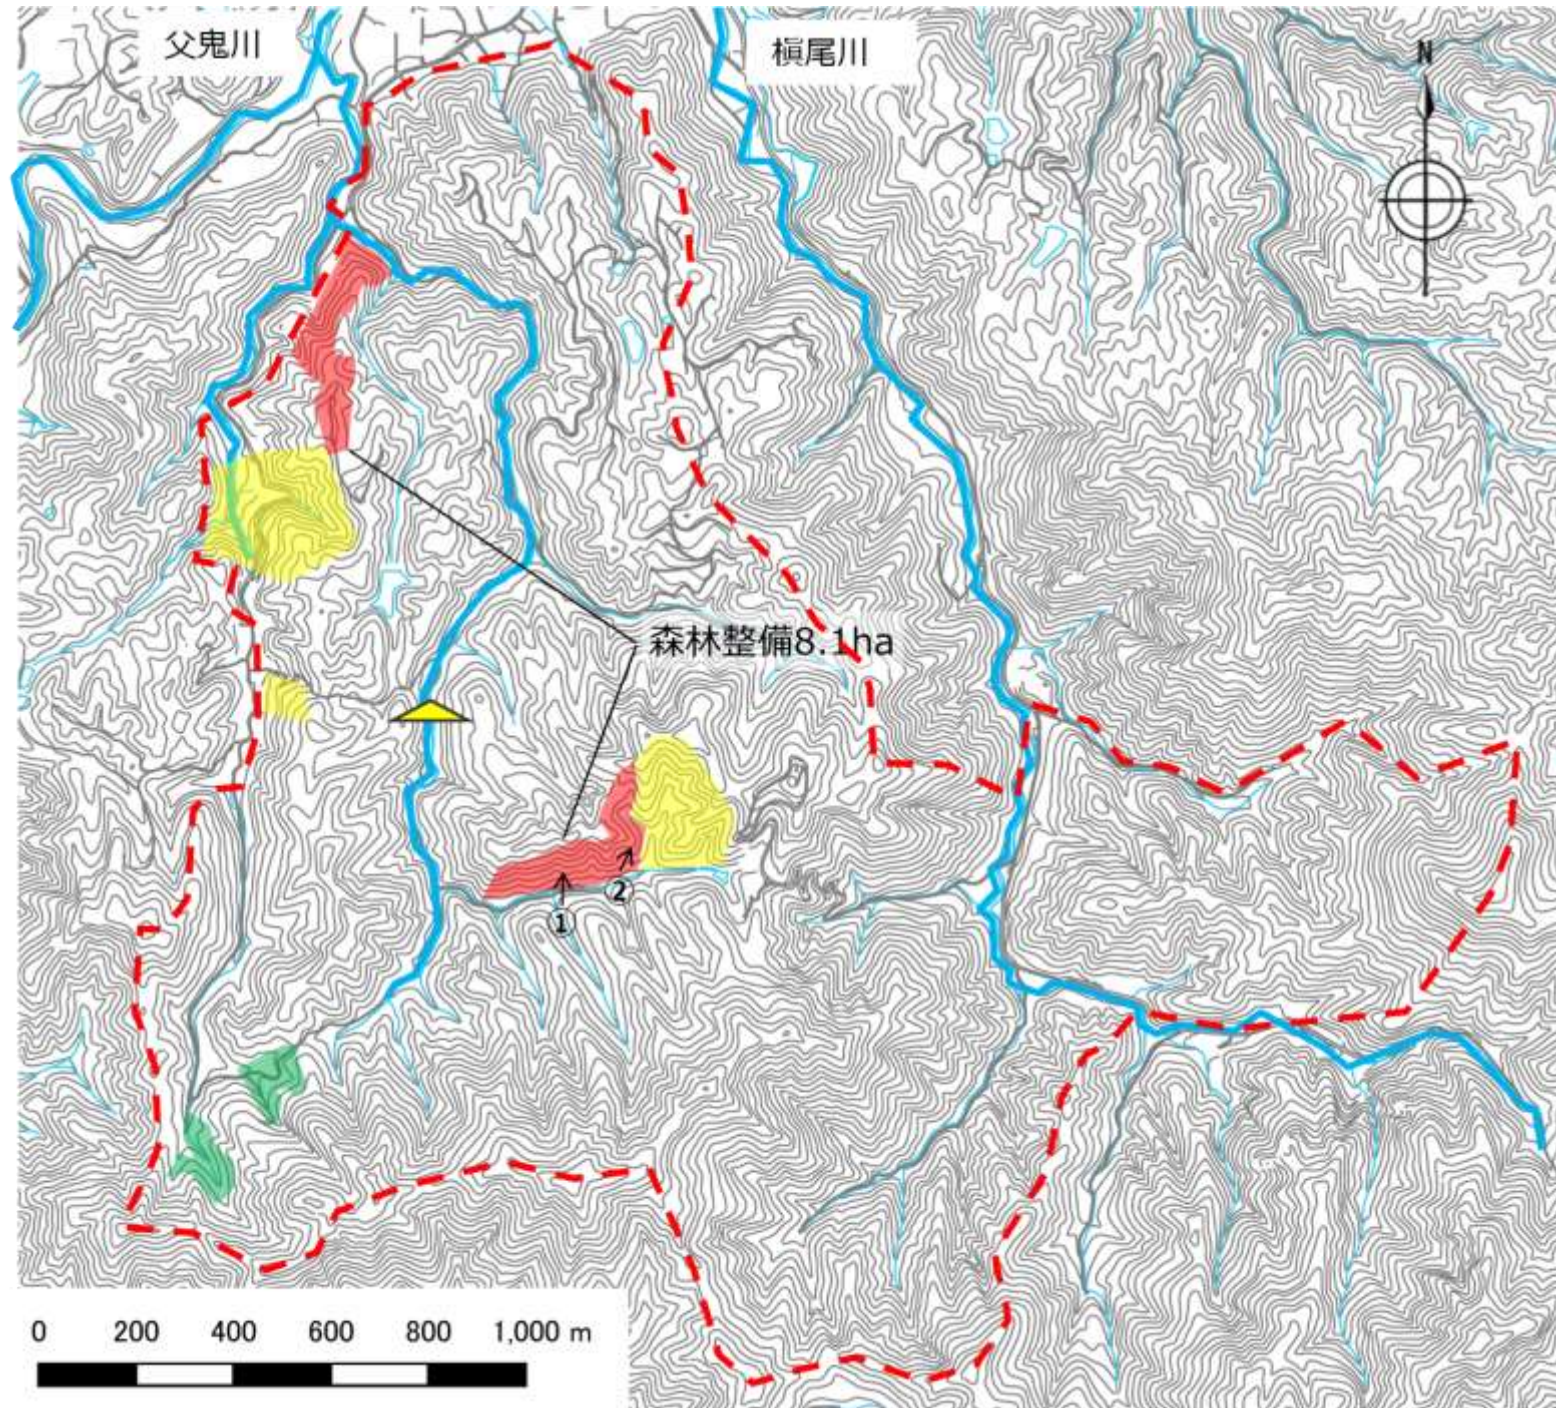

【凡例】					
---	事業対象区域	■	森林整備（R6）	■	森林整備（R7）
---	流域治水対策河川	■	森林整備（R8）	▲	治山ダム（R8）
	→①	写真撮影位置			

内 容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合 計
森林整備(ha)	2.1	8.1	10.0	9.8	30.0
治山ダム (基)	—	—	1	1	2



写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況




写真② 森林整備（筋工）の実施状況

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 (ha)	8.0	8.1	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（16）

ちちおにちょう 和泉市父鬼町地区

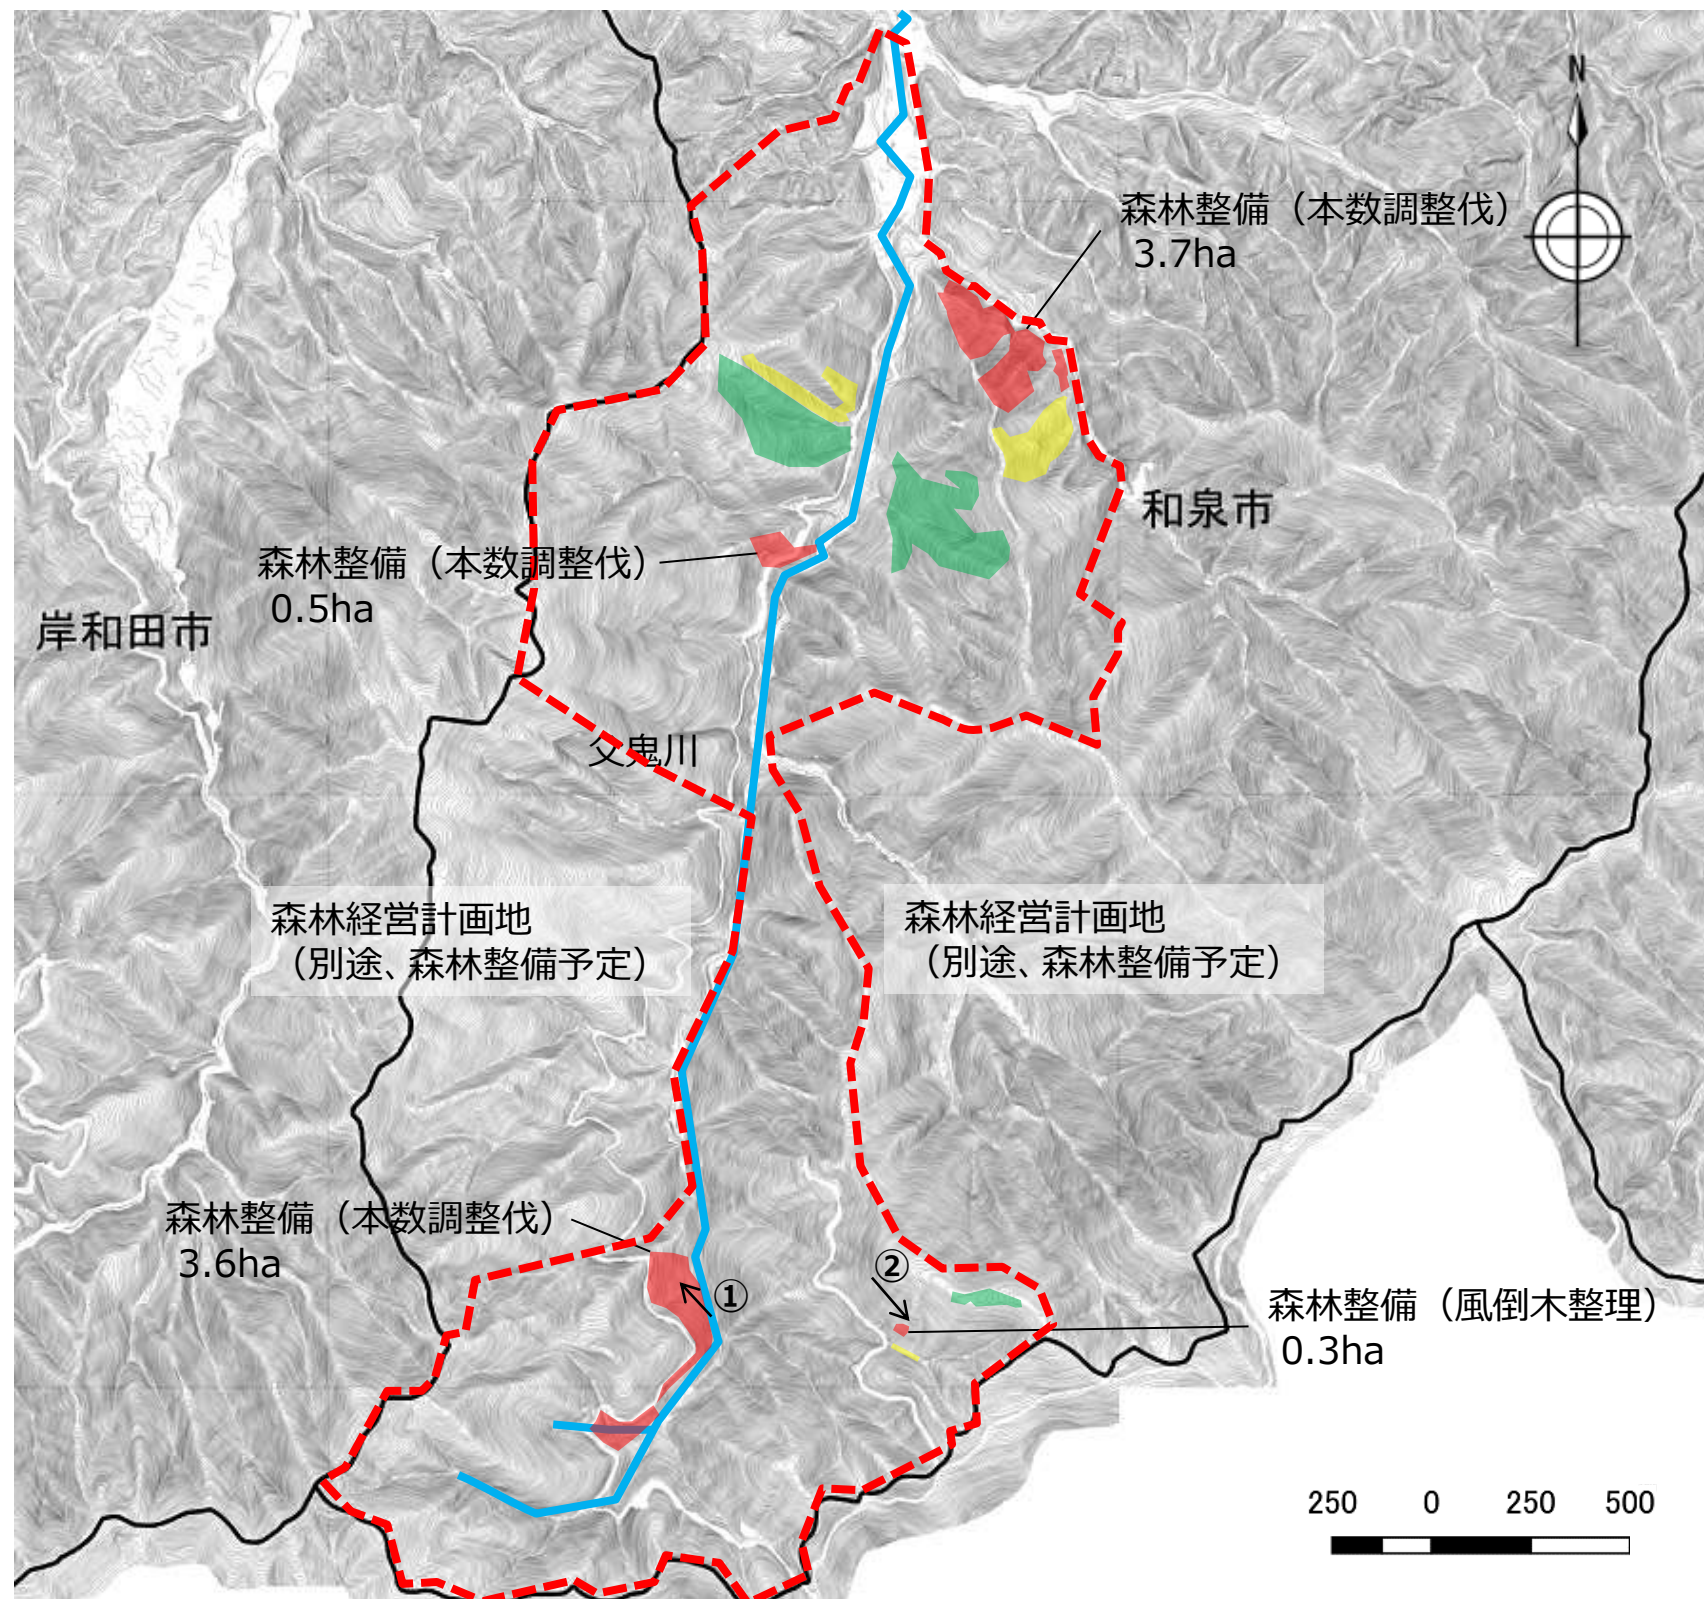

【凡例】

- 事業対象区域 (Red dashed line)
- 流域治水対策河川 (Blue line)
- 森林整備 (R6) (Green)
- 森林整備 (R7) (Red)
- 森林整備 (R8) (Yellow)
- ① 写真撮影位置 (Arrow pointing to photo location)

内 容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合 計
森林整備(ha)	9.3	8.0	4.5	—	21.8



撮影日：R8.2.24

写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況



撮影日：R8.1.9



撮影日：R8.3.5


写真② 森林整備（風倒木整理）の実施状況

内 容	R7 計画	R7 実績	備 考
森林整備 (ha)	8.0	8.0	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（17）

岸和田市大沢町地区

【平面図】

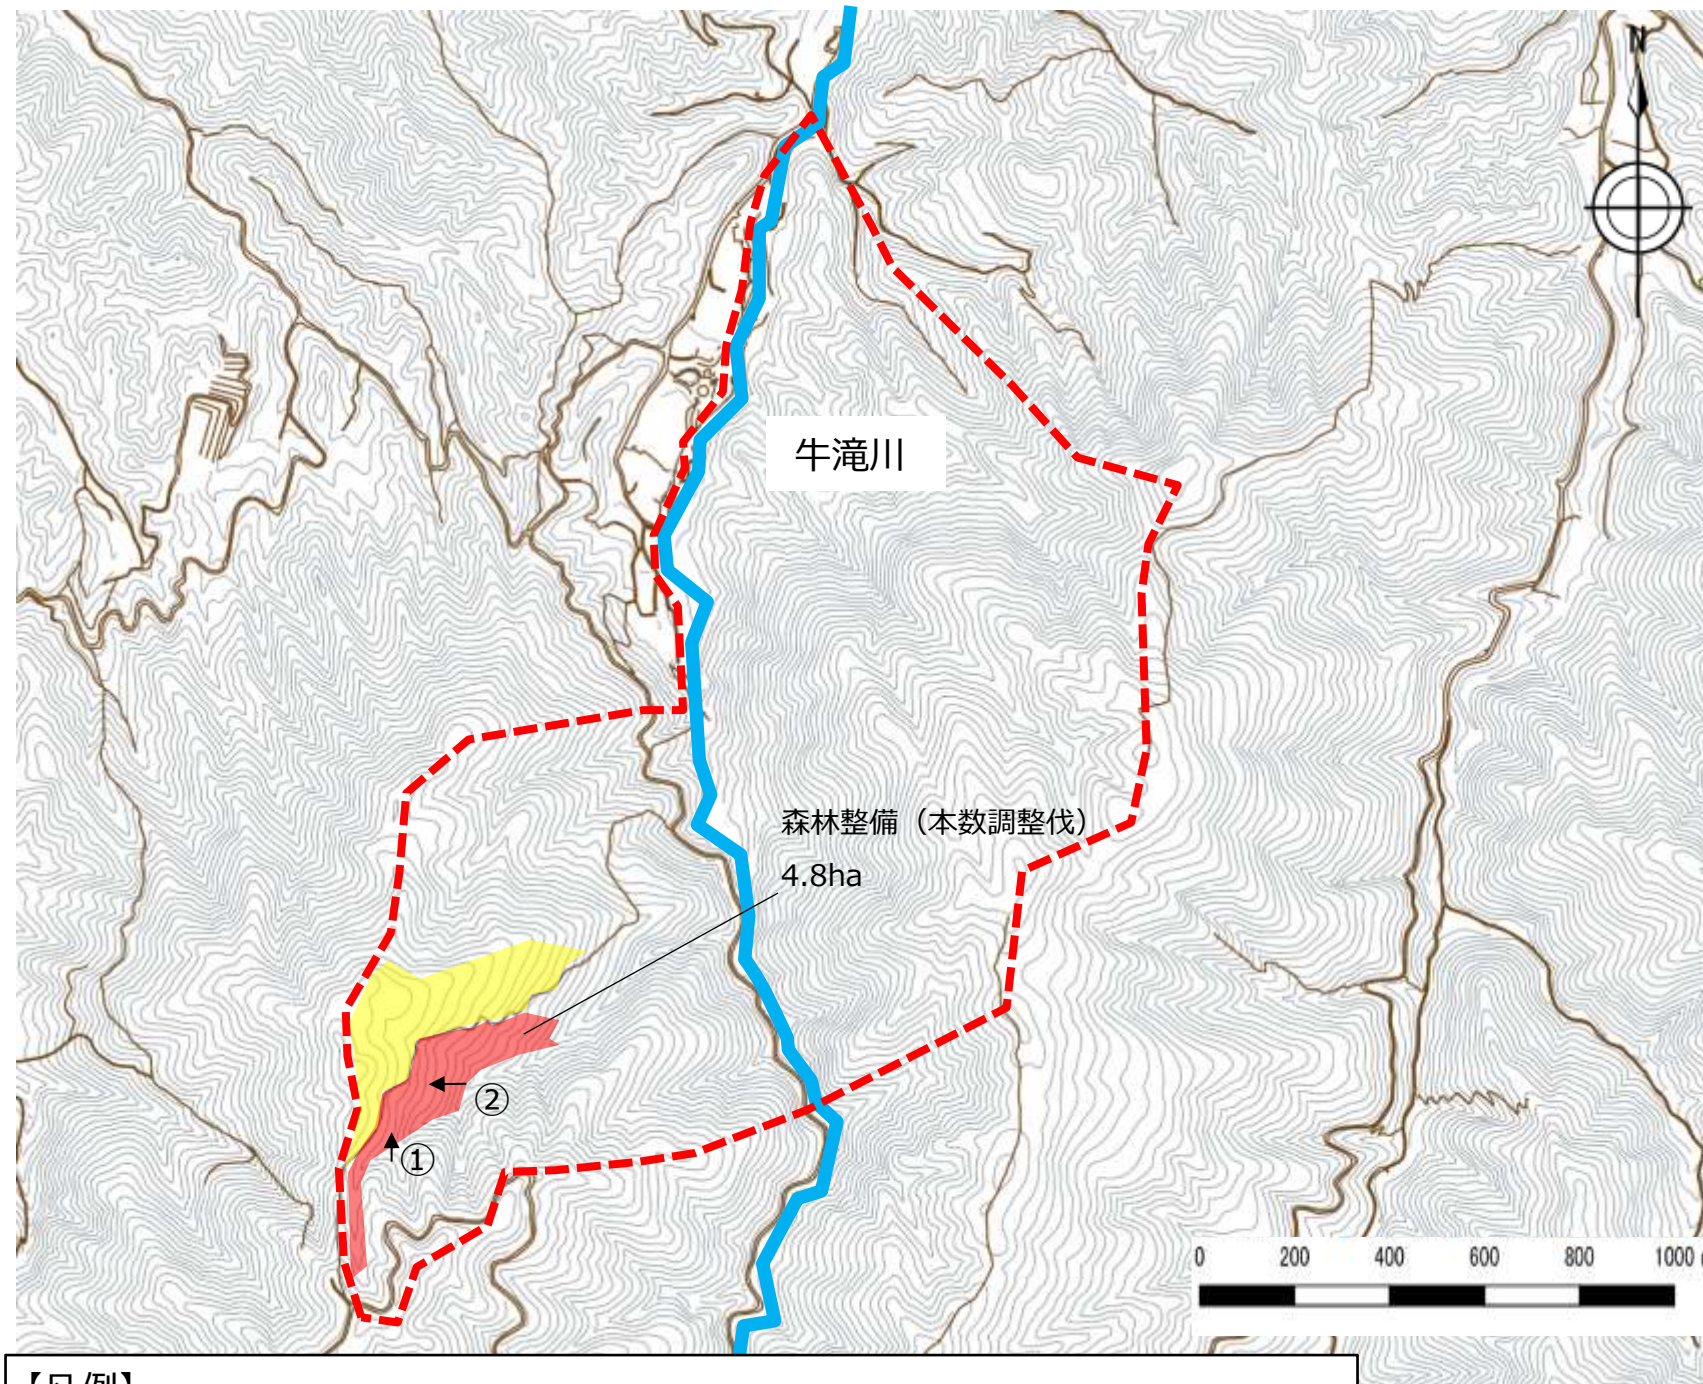

【凡例】
--- 事業対象区域
--- 流域治水対策河川
■ 森林整備（R7）
■ 森林整備（R8）
 →① 写真撮影位置

内 容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合 計
森林整備(ha)	—	4.8	5.0	10.2	20.0




写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況



写真② 森林整備（筋工）の実施状況

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 (ha)	4.8	4.8	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（18） 貝塚市蕎原地区

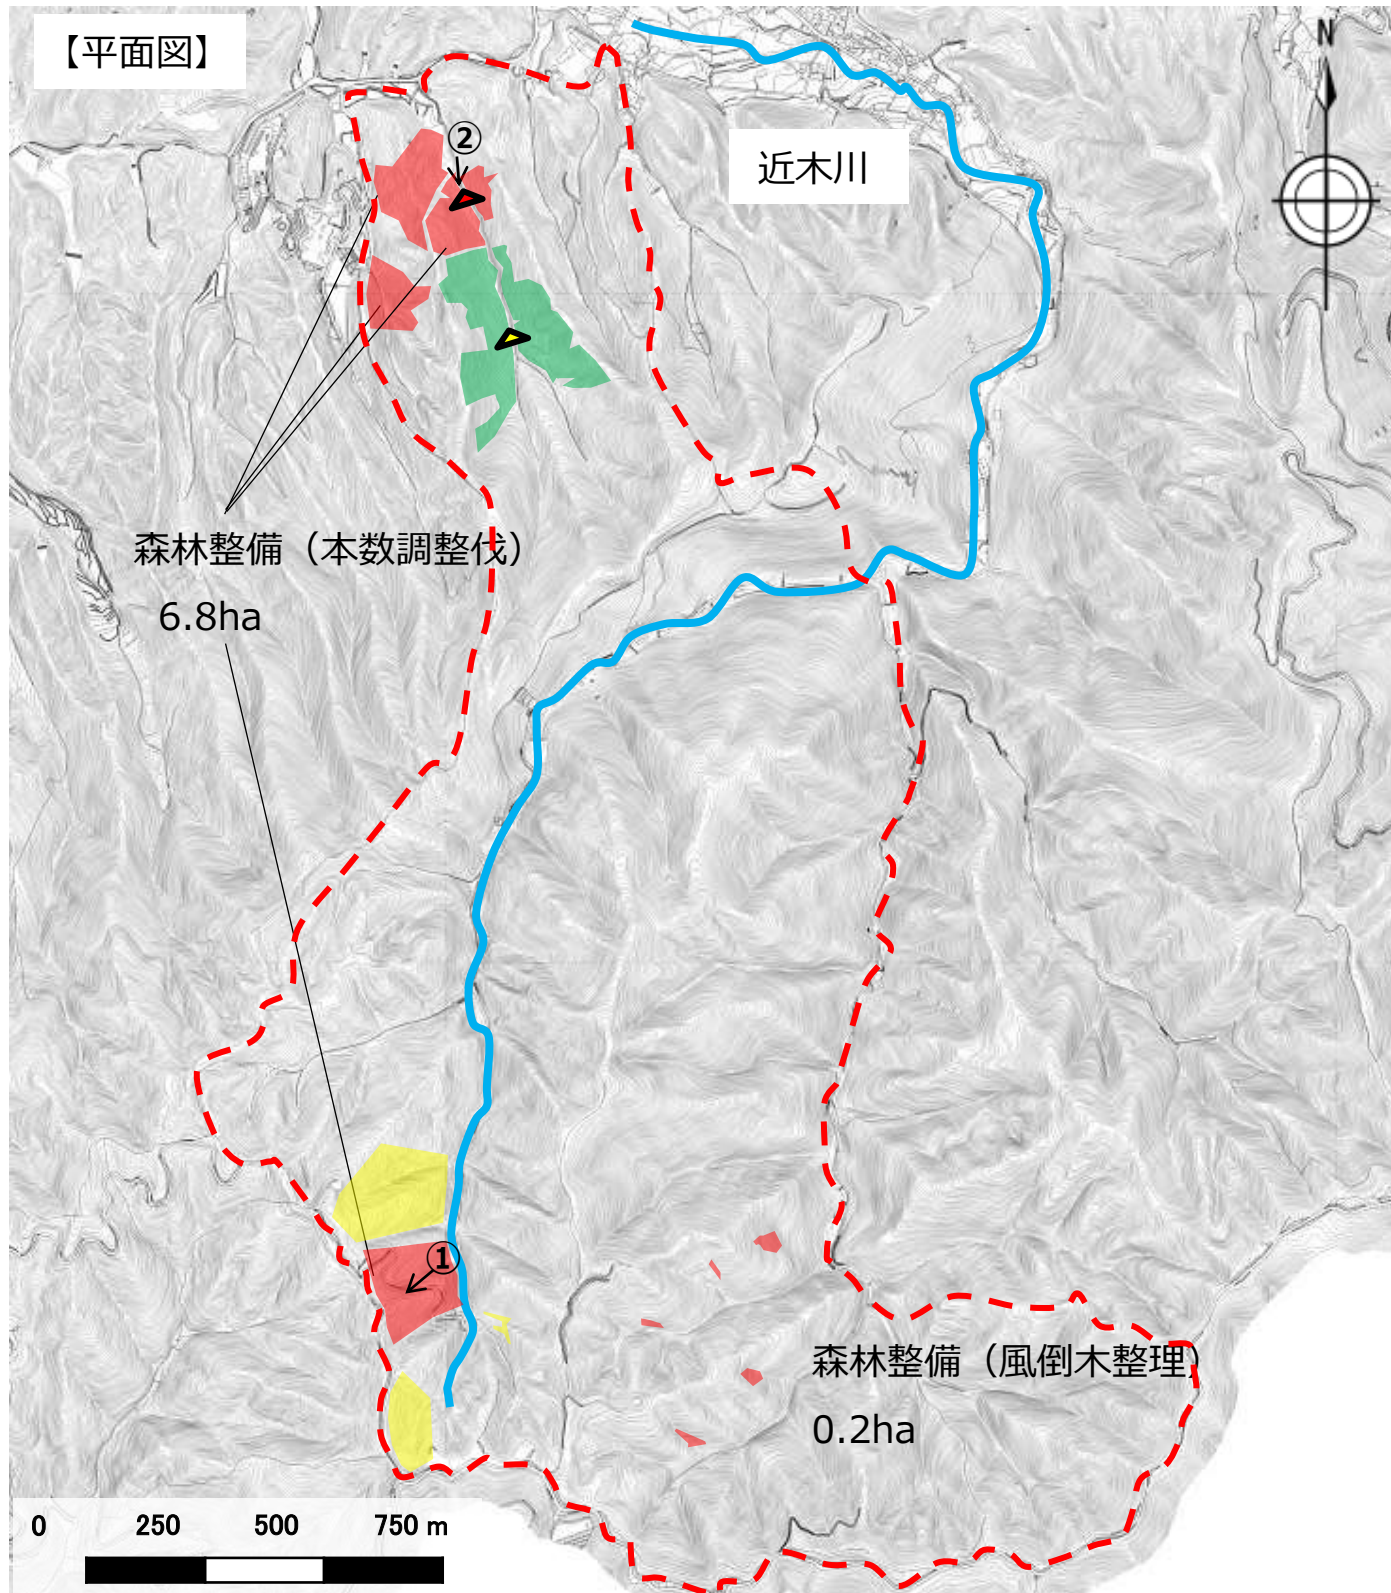

【凡例】

--- 事業対象区域
 ■ 森林整備（R6）
 ■ 森林整備（R7）
 ■ 森林整備（R8）
 → ① 写真撮影位置
 ▲ 治山ダム（R7）
 ▲ 治山ダム（R8）

— 流域治水対策河川

内 容	R6（実績）	R7（実績）	R8（計画）	R9～10（予定）	合 計
森林整備(ha)	7.2	7.0	8.0	7.8	30.0
治山ダム（基）	—	1	1	—	2



写真① 森林整備（本数調整伐・筋工）の実施状況




写真② 治山ダム（コンクリート）の設置状況

内 容	R7 計画	R7 実績	備考
治山ダム（基）	1	1	
森林整備（ha）	6.8	7.0	
流木対策(m)	200	200	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（19） 泉佐野市大木地区

【平面図】

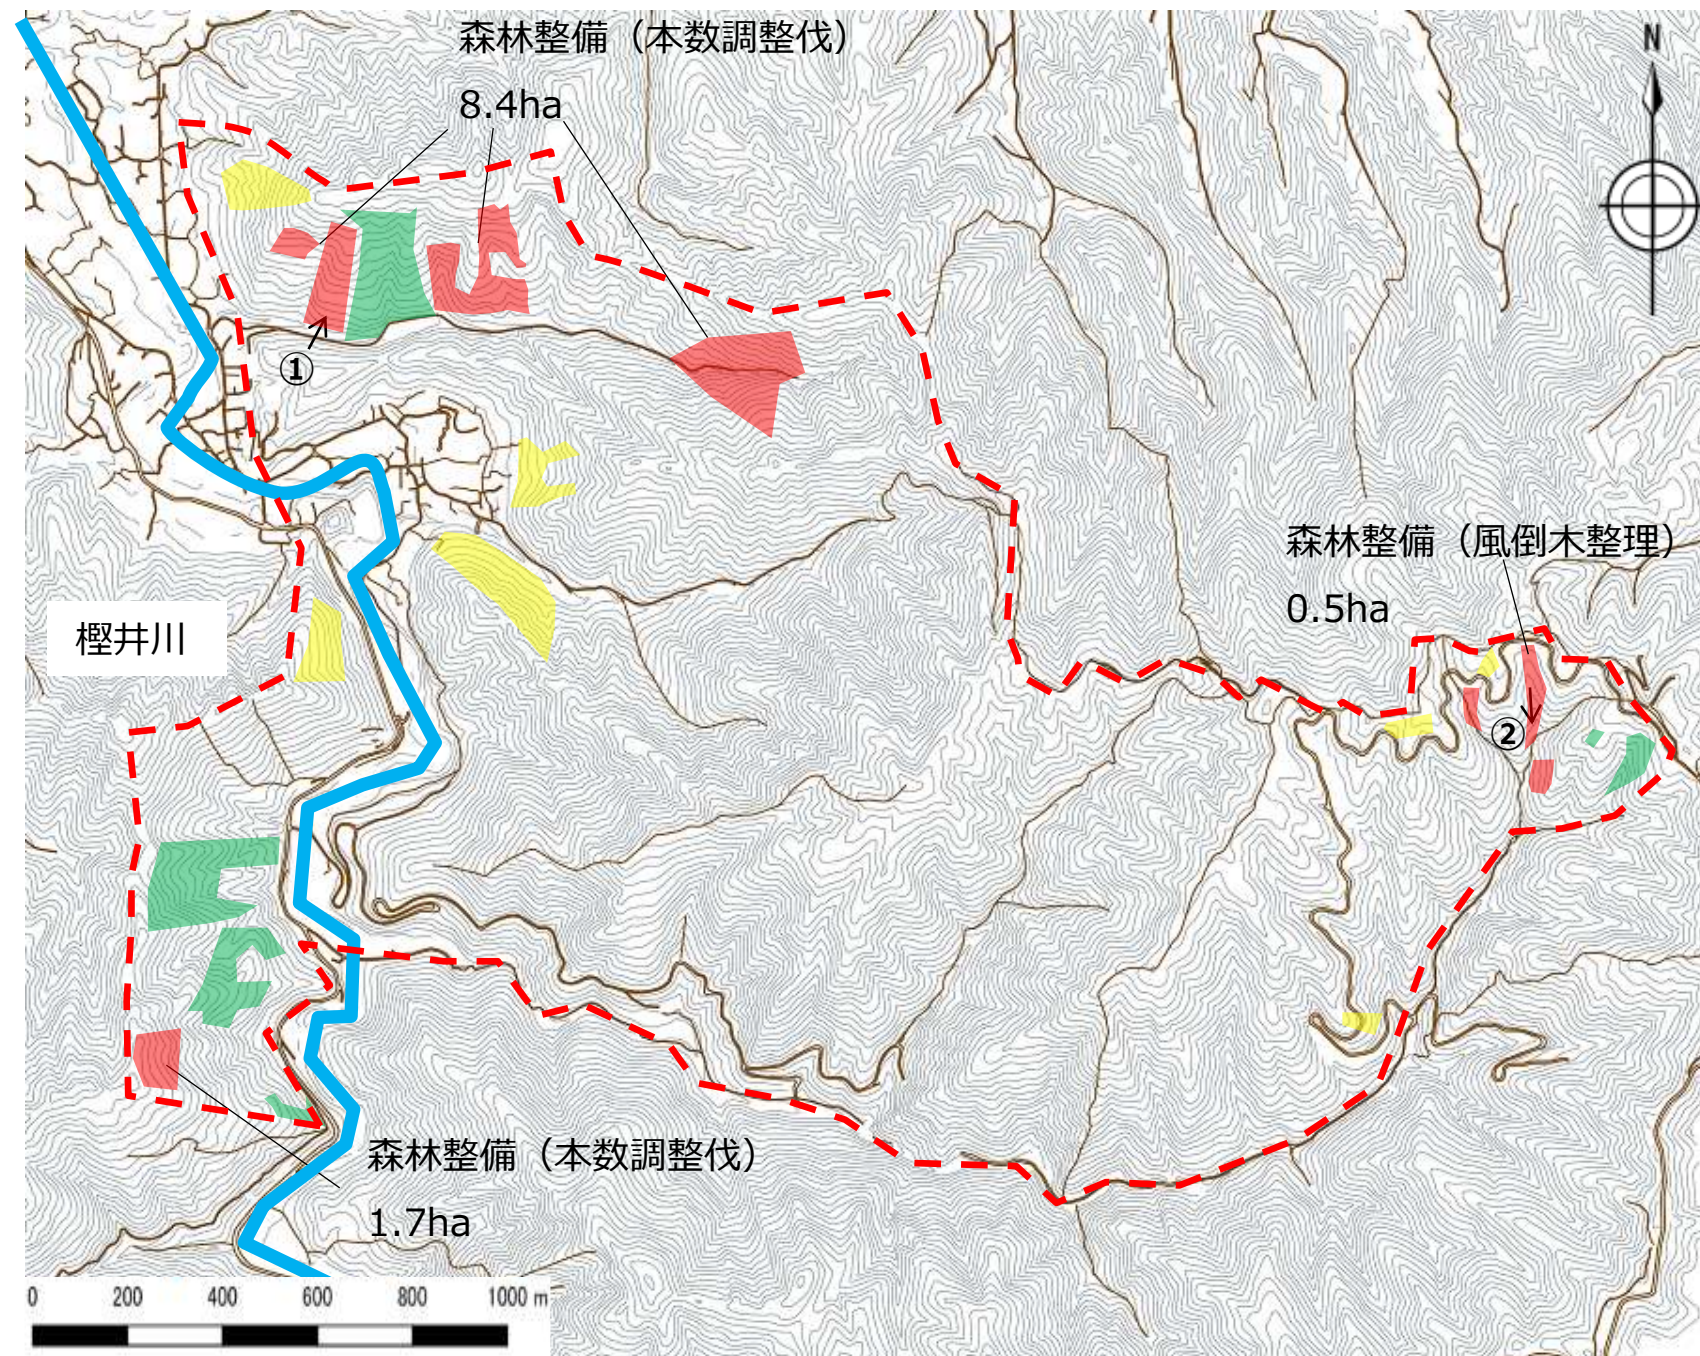

【凡例】
--- 事業対象区域 ■ 森林整備（R6） ■ 森林整備（R7） ■ 森林整備（R8）
--- 流域治水対策河川 →① 写真撮影位置

内 容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合 計
森林整備(ha)	9.0	10.6	7.5	0.9	28.0



写真① 森林整備（本数調整伐・筋工）の実施状況




写真② 森林整備（風倒木整理）の実施状況

内容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 (ha)	10.6	10.6	

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（20）

しんだちつづらばた
泉南市信達葛畑地区

【平面図】

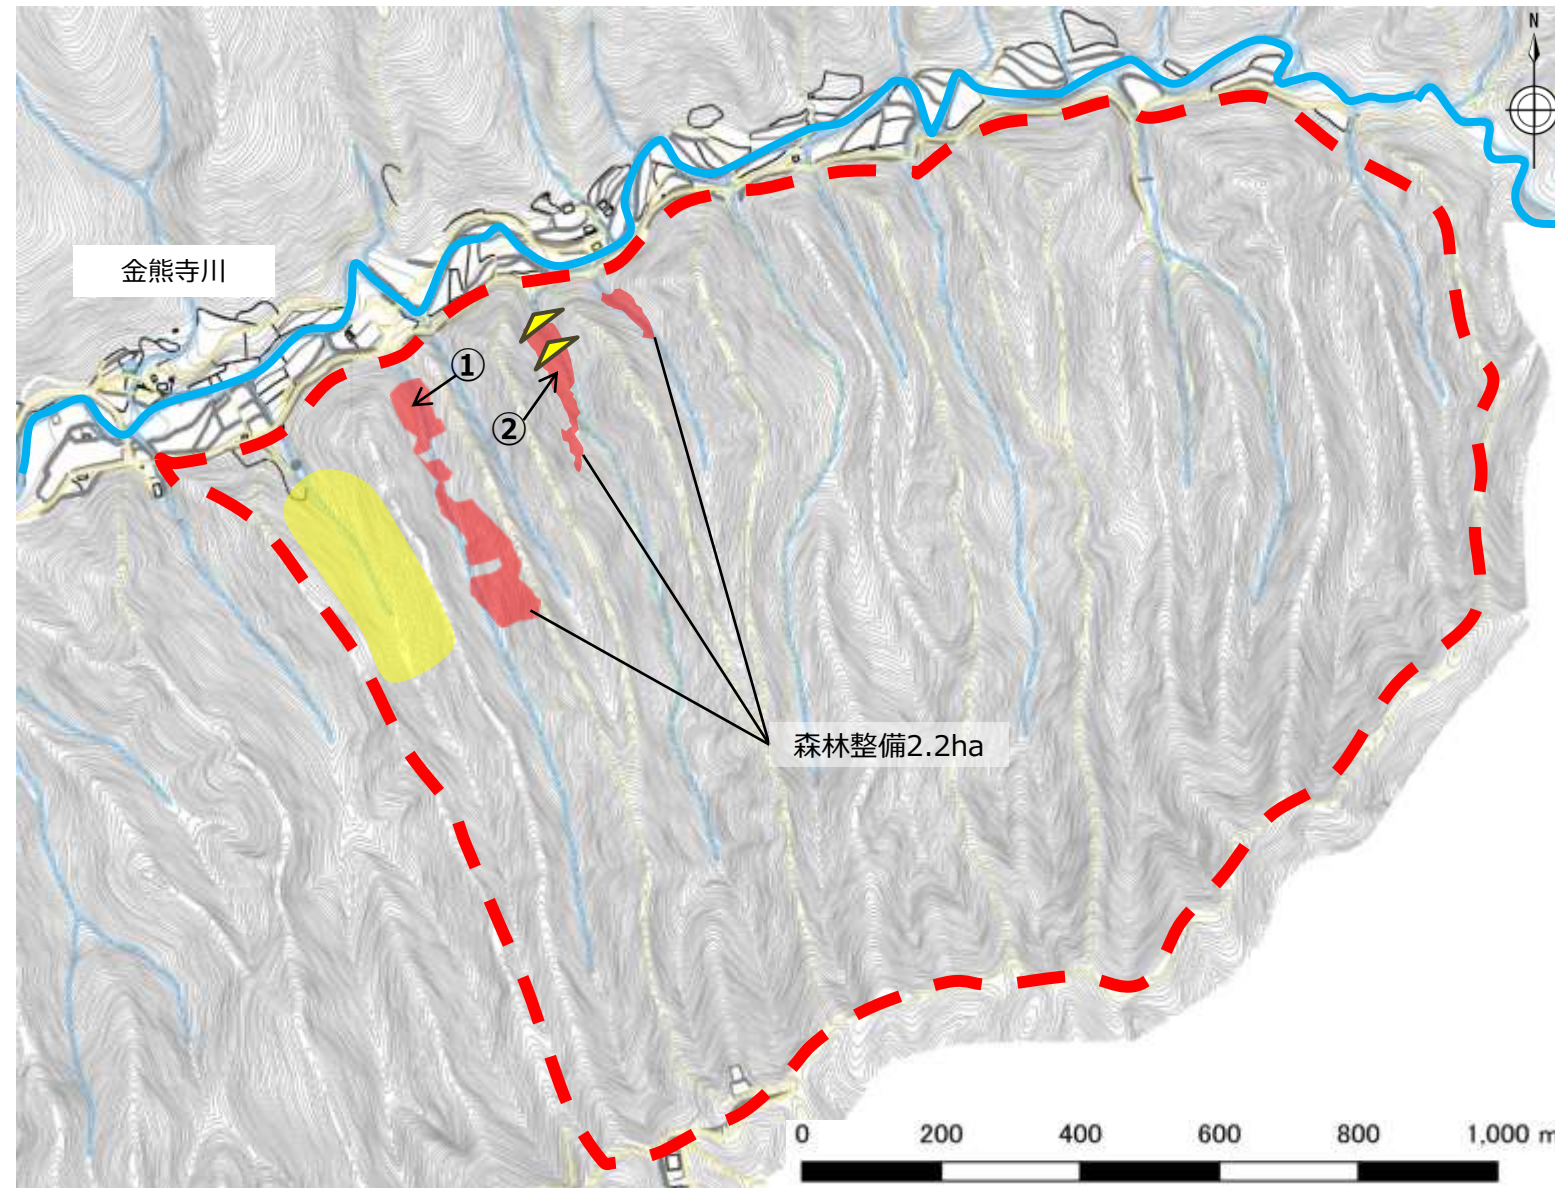

【凡例】

- 事業対象区域 森林整備（R7） 森林整備（R8）
--- 流域治水対策河川 →①・② 写真撮影位置 治山ダム（R8）



写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況



写真② 森林整備（筋工）の実施状況


内 容	R7 計画	R7 実績	備考
森林整備 (ha)	2.0	2.2	

内 容	R6 (実績)	R7 (実績)	R8 (計画)	R9~10 (予定)	合 計
森林整備 (ha)	—	2.2	3.0	4.8	10.0
治山ダム (基)	—	—	2	—	2

たながわ にしばた

令和7年度 流域保全森林防災事業実績（21） 泉南郡岬町多奈川西畑地区

【平面図】

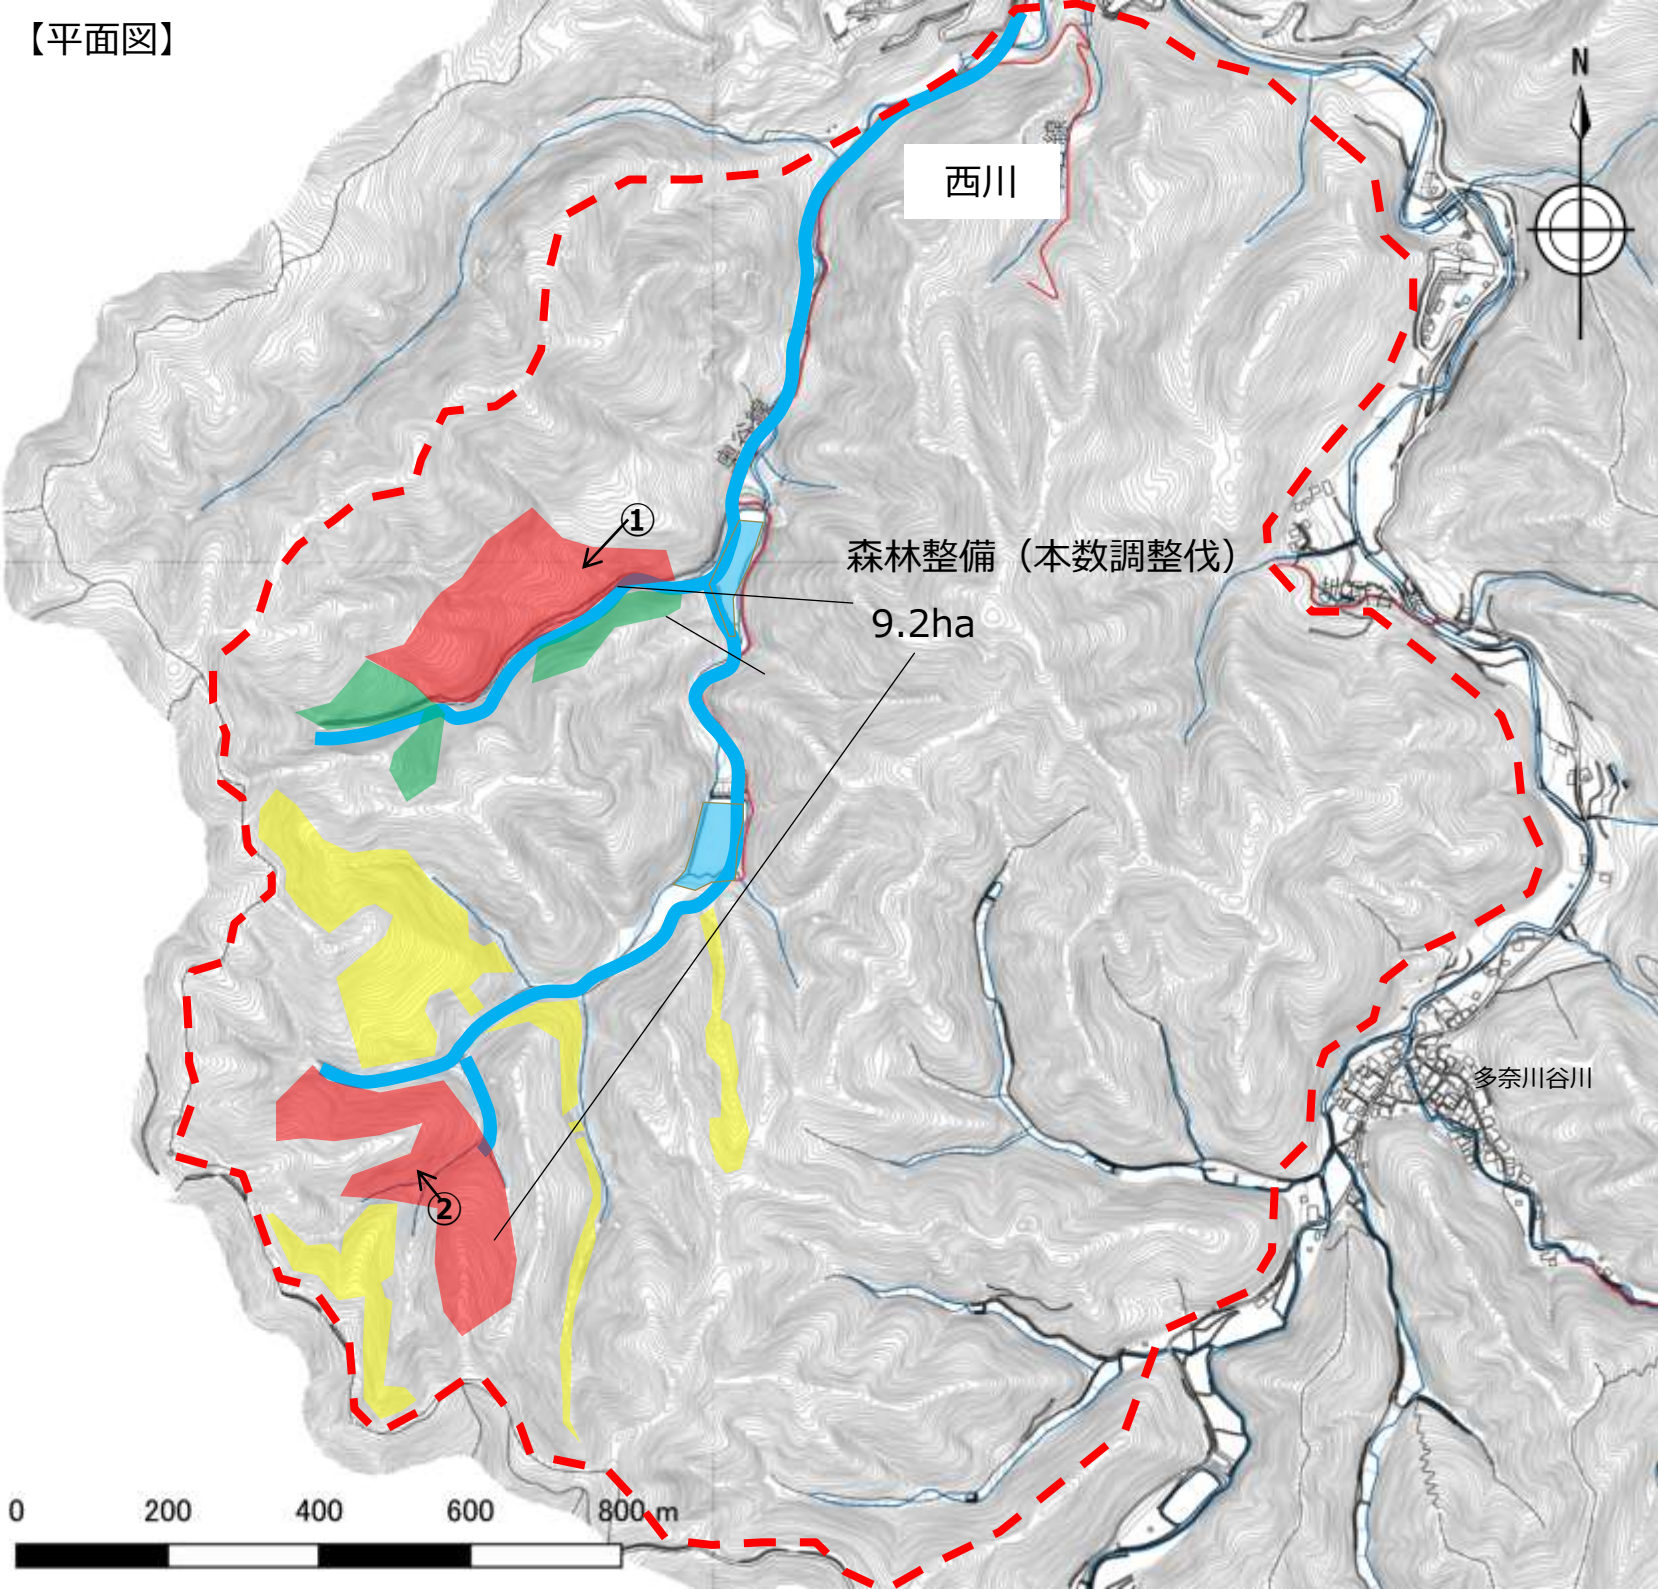

【凡例】					
事業対象区域		森林整備（R6）	森林整備（R7）	森林整備（R8）	
流域治水対策河川		→① 写真撮影位置			

内 容	R6（実績）	R7（実績）	R8（計画）	R9～10（予定）	合 計
森林整備(ha)	2.3	9.2	9.5	—	21.0



写真① 森林整備（本数調整伐）の実施状況



写真② 森林整備（筋工）の実施状況

内容	R7計画	R7実績	備考
森林整備(ha)	9.2	9.2	

大阪府森林環境税の広報活動について（令和7年度までの実績）

R6年度の取組

森林環境税の取組を紹介する幅広い広報
森林環境税を活用した流域治水対策PR動画 1本（6分）及びショート動画4本（各15秒）
【PR動画の短編、流域治水対策、森林管理施設、猛暑対策】を作成



PR動画: 3,400回再生 (6月末日時点)

ショート動画 (短編)

ショート動画 (流域治水・森林管理施設・猛暑対策)

R7年度の取組内容



作成した動画を活用し、都市部において、幅広く広報活動を実施


- イベントブース×10回での放映
- 民間事業者との包括連携協定等を活用したデジタルサイネージでの放映×6社
- 鉄道会社との連携×2社
- 小学校等への出前授業の実施×9回



R8年度～の予定

- 引き続き、民間事業者との包括連携協定を活用したデジタルサイネージでの放映や各種イベントでの放映等を積極的に行い、森林環境税の取組を広く周知
- 今年度、治山ダム（流域治水対策型）及び猛暑対策事業の実績紹介動画を作成予定
- 実際に府民を現場に案内する現場ツアーの開催を検討

【令和8年事業 実施予定地区】

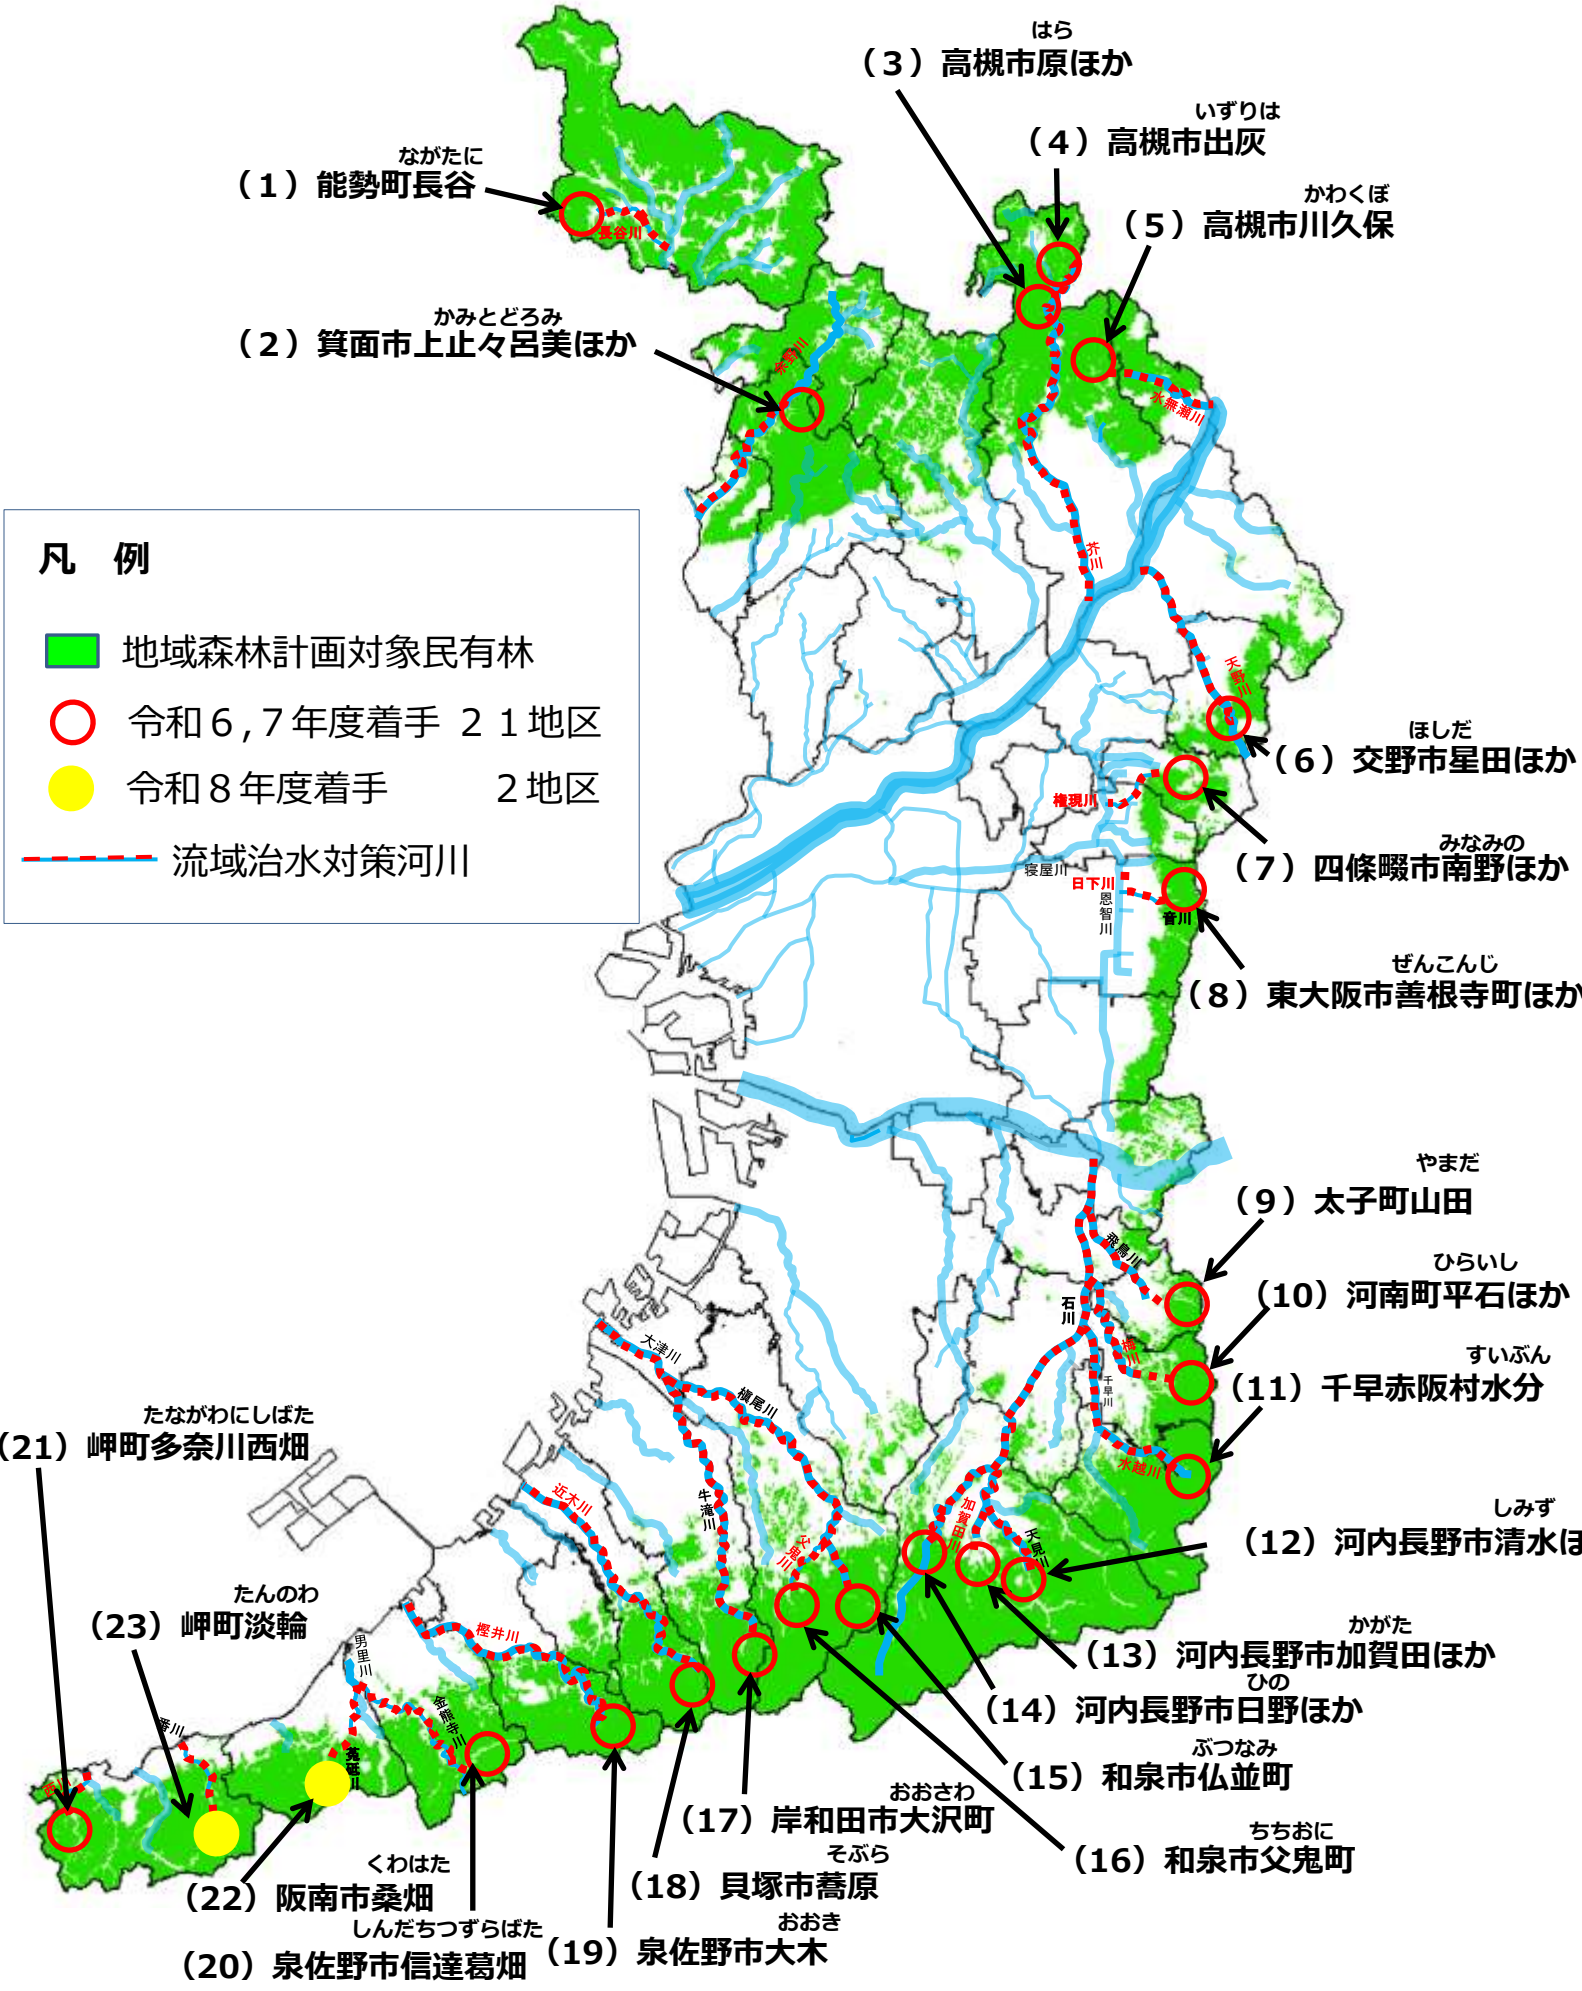

		令和8年度 23地区				
地区名		新規／ 継続	全体計画 策定（○）	治山 ダム (基)	溪流 延長 (m)	森林 整備 (ha)
(1)	能勢町長谷（ながたに）	継続	R6済	—	—	9.0
(2)	箕面市上止々呂美ほか（かみとどろみ）	継続	R6済	—	—	8.0
(3)	高槻市原ほか（はら）	継続	R6済	—	—	2.0
(4)	高槻市出灰（いずりは）	継続	R6済	—	—	4.5
(5)	高槻市川久保（かわくぼ）	継続	R6済	1	—	3.5
(6)	交野市星田ほか（ほしだ）	継続	R6済	—	—	9.7
(7)	四條畷市南野ほか（みなみの）	継続	R6済	1	—	6.3
(8)	東大阪市善根寺町ほか（ぜんこんじ）	継続	R6済	—	—	9.0
(9)	太子町山田（やまだ）	継続	R7済	—	—	8.7
(10)	河南町平石ほか（ひらいし）	継続	R6済	—	—	10.5
(11)	千早赤阪村水分（すいぶん）	継続	R6済	1	—	8.7
(12)	河内長野市清水ほか（しみず）	継続	R7済	—	—	8.4
(13)	河内長野市加賀田ほか（かがた）	継続	R6済	1	50	5.6
(14)	河内長野市日野ほか（ひの）	継続	R7済	—	—	8.6
(15)	和泉市仏並町（ぶつなみ）	継続	R6済	1	150	10.0
(16)	和泉市父鬼町（ちちおに）	継続	R6済	—	—	4.5
(17)	岸和田市大沢町（おおさわ）	継続	R7済	—	—	5.0
(18)	貝塚市蕎原（そぶら）	継続	R6済	1	200	8.0
(19)	泉佐野市大木（おおき）	継続	R6済	—	—	7.5
(20)	泉南市信達葛畑（しんだちつづらばた）	継続	R7済	2	100	2.0
(21)	岬町多奈川西畑（たながわにしばた）	継続	R6済	—	—	9.5
(22)	阪南市桑畑（くわはた）	新規	○	—	—	7.0
(23)	岬町淡輪（たんのわ）	新規	○	—	—	9.5
23地区			2	8	500	165.5

【スケジュール】

	新規 着手	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
令和6年度着手	16地区	16	16	16	14	11
令和7年度着手	5地区		5	5	5	5
令和8年度着手	2地区			2	2	2
合 計	23地区	16地区	21地区	23地区	21地区	18地区

令和7年度 大阪府森林環境整備事業 評価シート

担当課名	みどり推進室森づくり課
担当グループ名	森林整備グループ
連絡先	(06)6210-9559

1 事業概要

(単位:千円)

①概要等	事業実施年度	令和7年度
	評価年月日	令和8年7月9日
	施策区分	自然災害から府民の暮らしを守る取組み
	事業名	流域保全森林防災事業
	事業概要	集水域(森林区域)における流域治水対策
	事業開始年度	令和6年度
②事業の目的	集水域である森林区域において、流域治水の考え方にに基づき、森林の土砂流出防止及び洪水緩和機能の維持向上を図り、地球温暖化に伴う気候変動に起因する、想定を超える豪雨や台風等による洪水被害の軽減・防止を目的とする。	

③事業費	年度別推移	R6	R7	R8	R9	R10	合計
	当初計画	422,600	665,000	710,000	1,205,000		3,002,600
	現計画	423,719	978,353	1,169,099	1,205,000		3,776,171
	執行額	321,484	786,818	－	－	－	1,108,302
④事業の内容	事業対象区域:流域治水上、緊急的に対策を必要とする森林 (流域治水プロジェクトの河川上流・洪水リスクがある河川の上流・既存の治山事業等に対応できない箇所)						
	事業箇所数:23箇所 事業内容: ①山地保水力向上対策 ピーク流量調整機能を付加した治山ダム(流域治水対策型)の整備 本数調整伐と筋工の組合せによる森林の面的整備 ②土砂・流木流出抑制対策 ・流木化の恐れのある倒木や立木の事前伐採、撤去 ・溪流の侵食や土砂流出を抑制する(流域治水対策型)の整備 事業の効果検証等						

2 自己評価

(1)事業実績

⑤実績検証の内容	指標・検証方法		計画	実績	評価区分	理 由	
	山地保水力 向上対策	指 標	治山ダム	8基	8基	■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない	計画通りに実施。 (※詳細については箇所別個票参照)
		検証方法	事業の完成検査				
		指 標	森林整備	95.4ha	95.8ha		
		検証方法	事業の完成検査				
	土砂・流 木流出 抑制対策	指 標	溪流延長	500m	620m		
		検証方法	事業の完成検査				

(2)事業効果(令和8年度に中間評価・令和11年度に最終評価予定)

指標・検証方法			計画	実績	評価区分	理 由	
⑥効果検証の内容	山地保水力向上対策	指 標	洪水ピーク流量の軽減	—	—	□ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない	
		検証方法	現地計測等による調査				
		指 標	斜面の流出量の抑制	—	—		
		検証方法	対照区との流出量の比較調査				
		指 標	林床被覆率の増加				
		検証方法	対照区との林床被覆率の比較調査				
		指 標	土壌の浸透能の向上				
		検証方法	対照区との土壌浸透能の比較調査				
	指 標	森林土壌の保持・増大	—	—			
検証方法	筋工有無の背面堆積厚を比較調査						
土砂・流木流出抑制対策	指 標	流木の発生の抑制	—	—			
	検証方法	対照区との流木発生の比較調査					

(3)自己評価(総合)(令和11年度に最終評価予定)

⑦自己評価	総合評価	理由
	□ 評価できる	
	□ 概ね評価できる	
	□ あまり評価できない	
	□ 評価できない	

3 第三者評価

⑧第三者評価	大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見	
	事業実績に対する検証、自己評価は妥当である。	
