



パビリオン建設促進の取組み



2023(令和5)年9月27日(水)

公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会


タイプA建設促進についての現状など

現状

- 国内パビリオン（協会発注・政府・自治体・企業など）は着々と進捗中
 - ※ 協会発注の主な施設は契約済であるが、若手建築家による「休憩所」「トイレ」等小規模な施設は今後発注・契約の見込
- 協会発注のタイプB・Cパビリオンも同様に進捗中であり、24年7月に完工予定。
- 一方、公式参加国が建設するタイプAパビリオンについては、様々な要因から進捗に差があり、準備段階の国も多い。（国により事情は異なる）

要因（海外パビリオン遅れと言われることの要因分析）

- ドバイ万博の開催が1年後ろ倒しになり、準備が遅れたこと
- 国内建設市場が引続き需給逼迫しており、それに関する認識の違いも一部あったこと
- 外国の発注主体と折衝することが、中小施工事業者等にとって、受注実績や商習慣の違い、言語の関係で困難であること



これらをふまえ、次ページで紹介する様々な情報発信や意見交換などの取り組み、また、建設の円滑化に向けた改善案を関係者で協議・調整した

タイプA建設促進についての取り組み

1. 参加国への発信

- I P Mで、タイプA参加国と施工事業者とのマッチング会合（2022.10）
- 参加国に対して、日本の建設市場を説明早期対応等を継続要請（2023.2～）
- 政府から参加国への発信に併せ、協会からも改めて各国に詳細な説明（6/19～）
- 万博本部の年次総会で、参加国に対して早急な対応を要請（6/20）
- 協会から参加国へのオンライン説明会（6/15、7/7、9/15）

2. 建設業界への情報提供・協力依頼

- 日建連から国交省への要望に伴い、協会と工区ゼネコンとの意見交換（2022.9）
- 協会から建設業界へ参加国入札情報・FAQ更新・会場全体施工ルールなどの情報提供(2023.2～)
- 協会がゼネコン各社からヒアリング（5/23～6/7）
- 国交省から建設業界への協力要請（6/23）を踏まえて、協会とゼネコン各社との面談（7/3～7/10）
- 協会会長と日建連会長が意見交換（7/18）
- 参加国からゼネコン等へのオンライン情報提供会（7/21）
- 協会からゼネコン等への説明会（4/20・4/28、8/7）

3. 発注・受注業務支援

- C M業務支援の強化
- 協会内に相談窓口を設置（9/1 建築実務精通かつ語学堪能な専門家も配置）
- F A Qの随時更新
- マッチング支援のための情報提供

4. 自国建設が難しい参加国への支援

- 協会発注による簡易工法（タイプX）の提案（7/7）

タイプA建設促進についての取組み

5. 手続きの簡素化・迅速化


- 仮設建築物許可
- 海外企業への建設業許可


6. 施工ルールの見直し

- 監理技術者専任義務の緩和

7. 施工環境の改善

- 工事車両アクセス（夢洲へのアクセス、夢洲内の移動）
 - 交通シミュレーション／道路構造改良／物流交通対策／工事用出入口の増設
- バックヤードの確保（大阪市等用地の活用）
 - 資材置場・仮設現場事務所・駐車場 等
- 供給処理施設の拡充・早期整備
 - 電気、給水、排水、通信
- 労働環境の向上
 - 売店・休憩所、共同会議室・トイレ、通勤バス 等

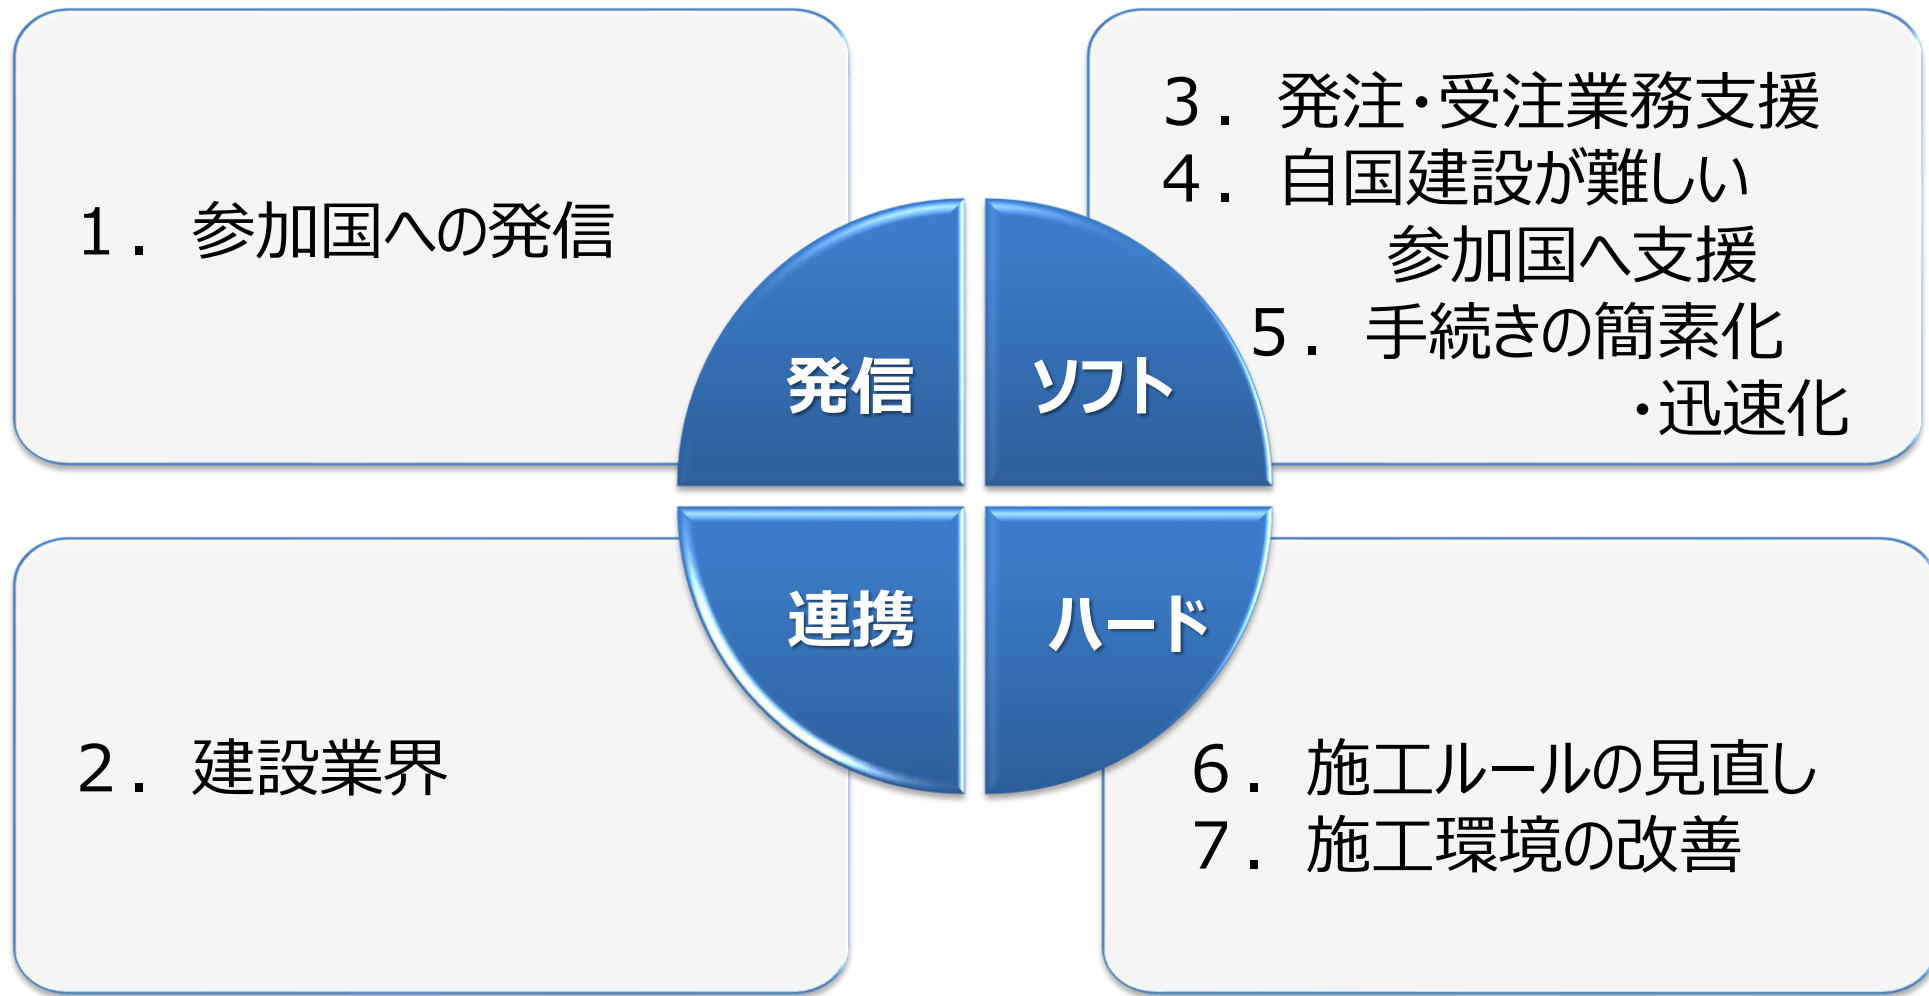

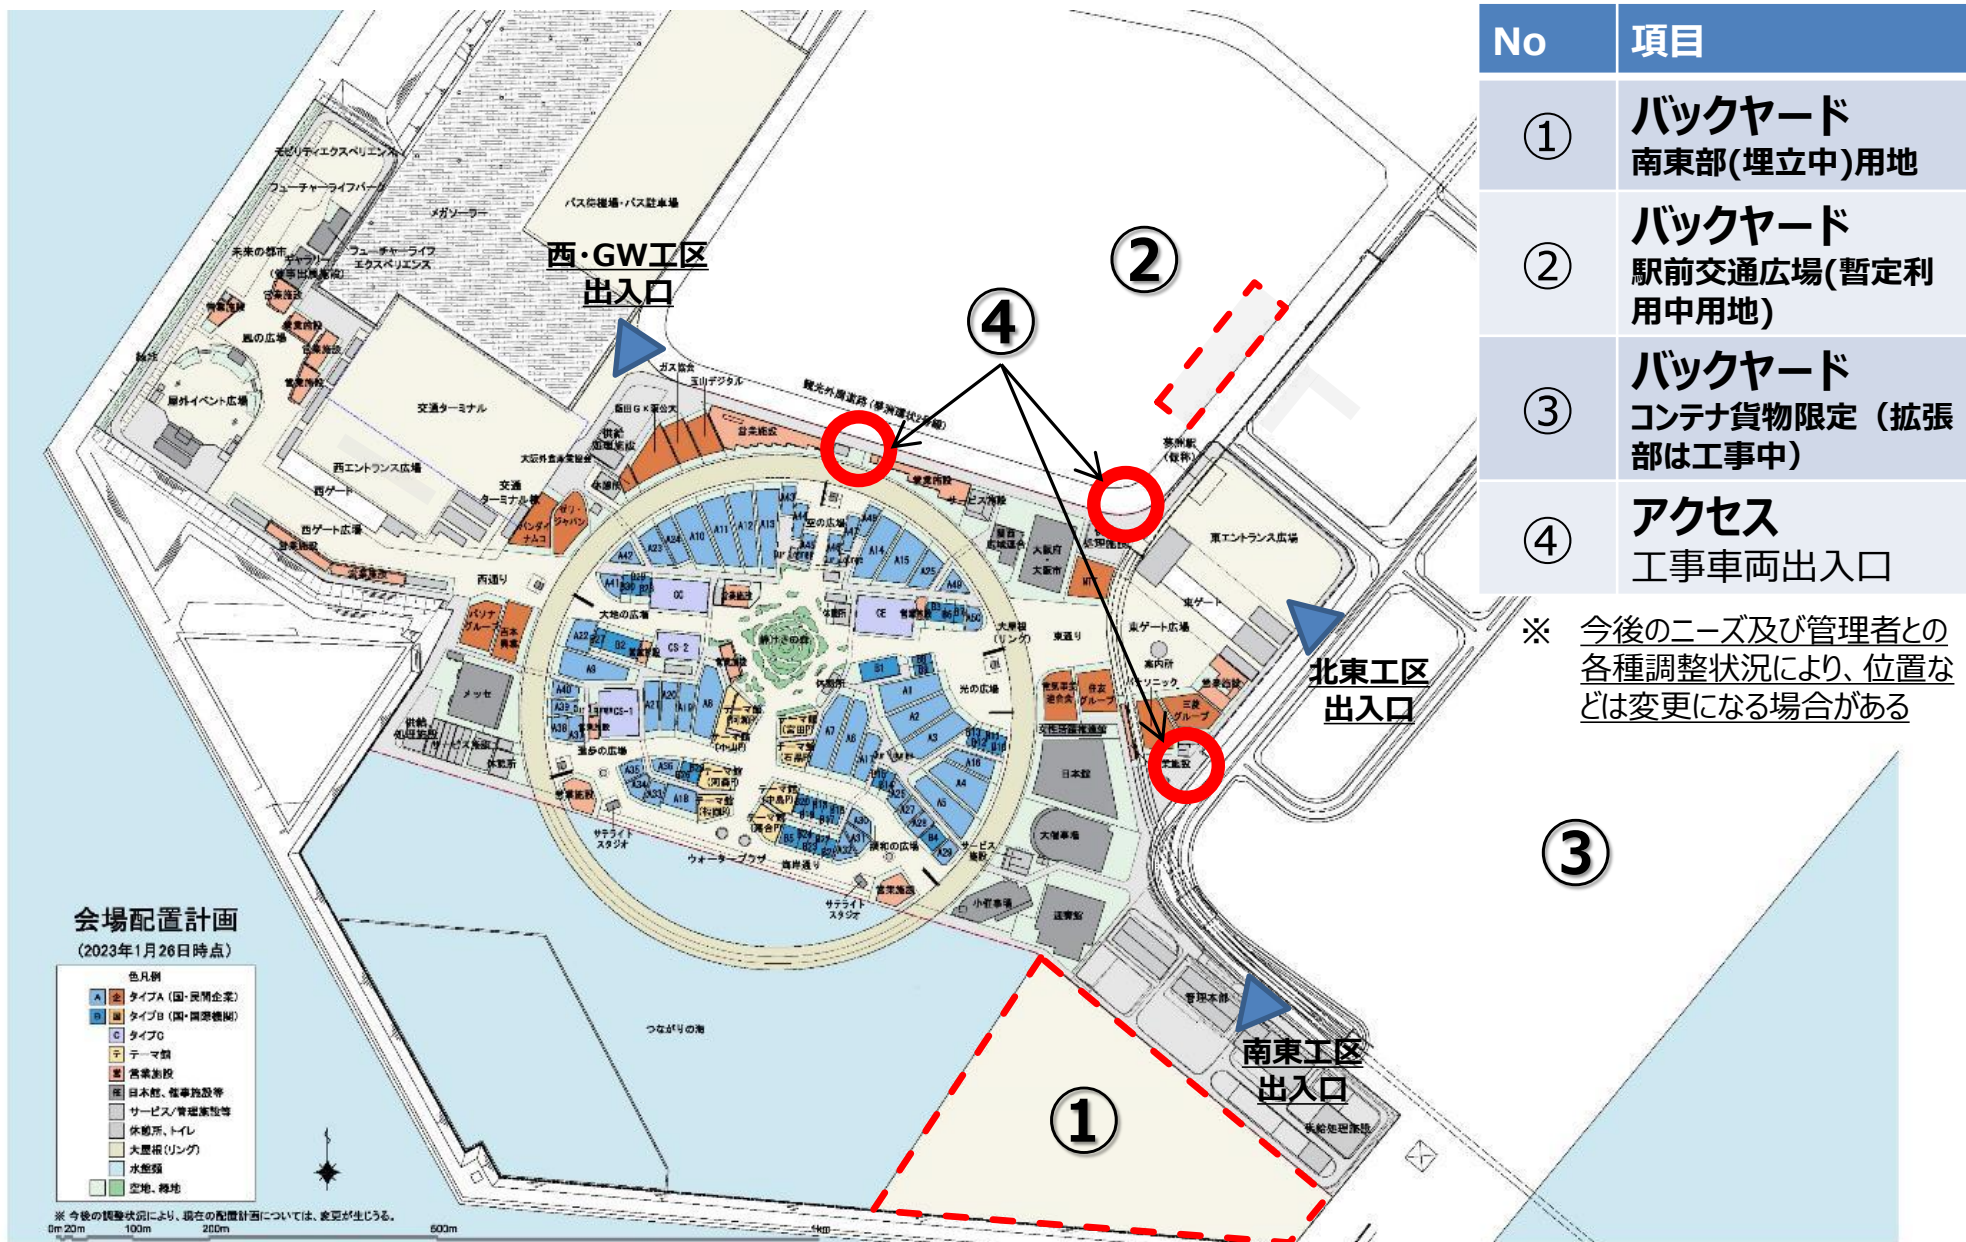

No	項目
①	バックヤード 南東部(埋立中)用地
②	バックヤード 駅前交通広場(暫定利用中用地)
③	バックヤード コンテナ貨物限定(拡張部は工事中)
④	アクセス 工事車両出入口

※ 今後のニーズ及び管理者との各種調整状況により、位置などは変更になる場合がある

会場配置計画
(2023年1月26日時点)

- 色凡例
- A タイプA (国・民間企業)
- B タイプB (国・民間機関)
- C タイプC
- テーマ館
- 営業施設
- 日本館、権威施設等
- サービス/管理施設等
- 休憩所、トイレ
- 大屋根(リンク)
- 水盤類
- 空地、緑地

※ 今後の調整状況により、現在の配置計画については、変更が生じる。
0m 20m 100m 200m 500m 1km

2023.09.01

海外パビリオン建設相談窓口の開設について

このたび、海外パビリオン建設に関心のある建設事業者の方への各種情報提供とご質問への対応のため、相談窓口を開設しましたので、以下のとおりお知らせします。

ご質問の内容が多岐にわたる事が想定されますので、その内容を正確に把握するため、メールでのご連絡、ご照会をお願いいたします。

海外パビリオン建設相談窓口

担当部署：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 国際局国際部

Email：intldesk@expo2025.or.jp

※記載内容の確認のため、折り返しご連絡する場合がありますので、メールに電話番号の記載をお願いいたします。

<https://www.expo2025.or.jp/news/news-20230901-01/>より

パビリオン等の設計・建設に関するよくあるご質問 (FAQ)

協会HP

上：9月1日

下：9月12日

2023.09.12

よくあるご質問 (FAQ)

<https://www.expo2025.or.jp/association/maintenance/category/faq/>より



夢洲の現状報告




2023(令和5)年9月27日(水)

公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会

昨年秋 会場全体（南西から市内中心方向）

撮影日 2022/10/4

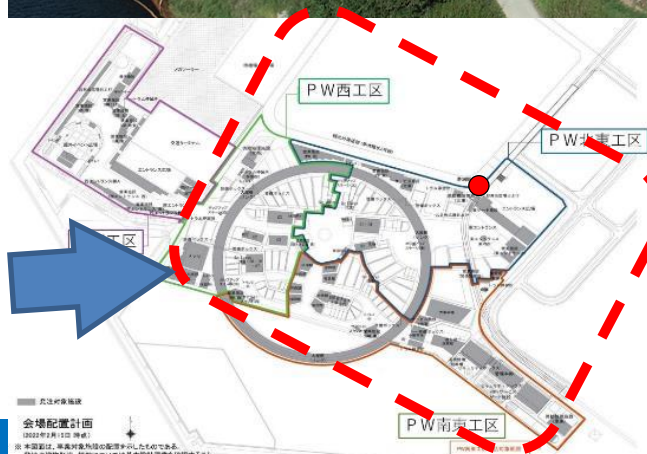

現在 会場全体（南西から市内中心方向）

撮影日 2023/09/05




現在 会場全体（南西から市内中心方向）

撮影日 2023/09/05



現在 会場全体（東から神戸方向）

撮影日 2023/09/05

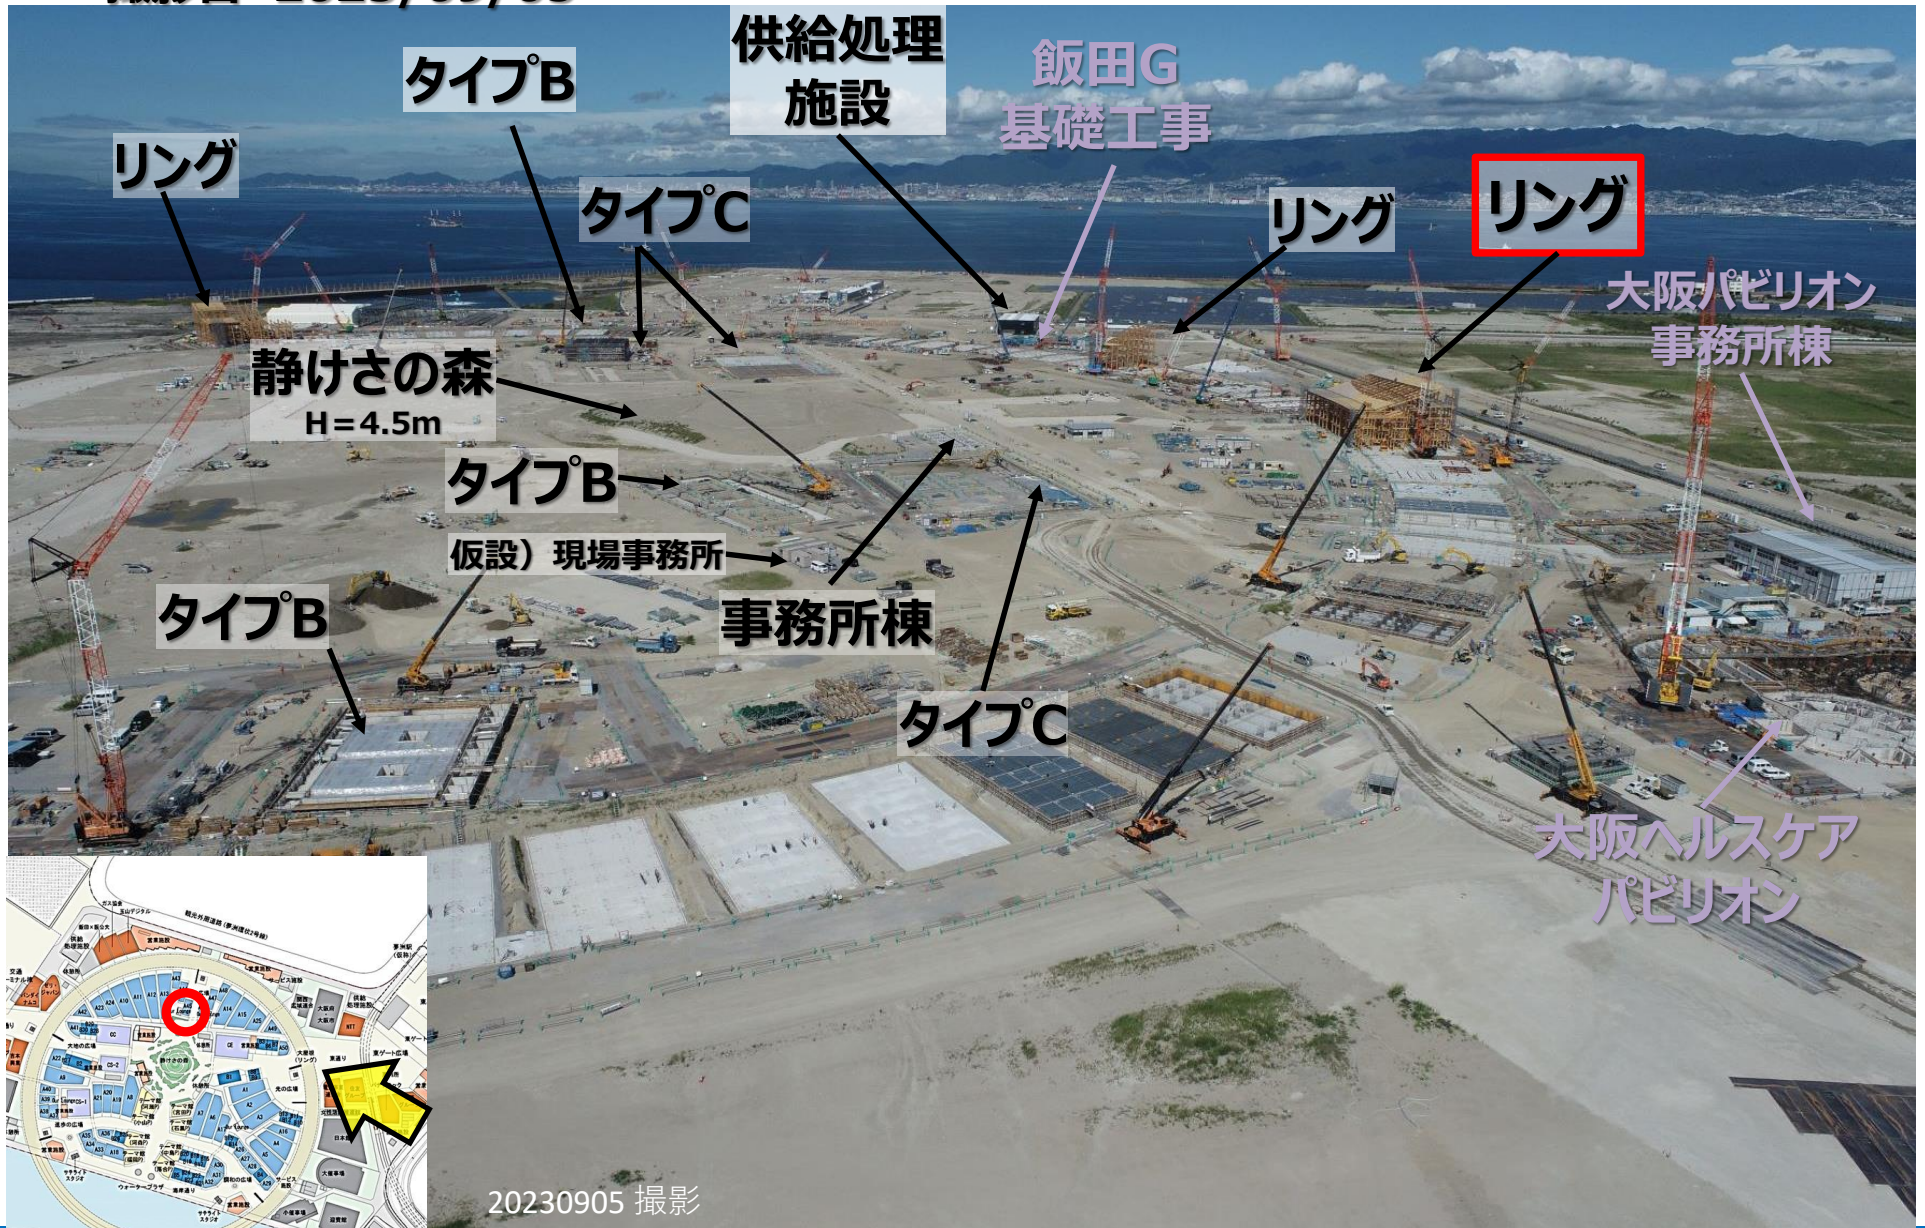


20230905 撮影

大屋根【リング】 23/6/30～ 建て方開始

万博協会
HP参照



撮影日 2023/8/18

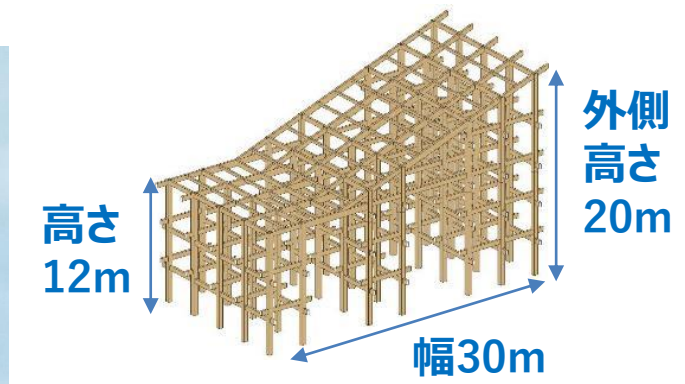

工事着手状況（土木工事などは除き建築工事の主なもの）



協会発注



協会発注外

2023/09/17現在

注) 協会発注工事は、建て方が現地で確認できるものを記載
協会発注外工事は、工事許可書発行済のものを記載



↓ハーバーレーダー
