

(仮称)

第3期大阪府ESCO  
アクションプラン

(素案)

大阪府

令和7年 月

## 【1】目的

本プランは、建築物の省エネルギー化、地球温暖化防止対策、光熱水費の削減を効果的に進めることのできるESCO（エスコと読む。Energy Service Company の略）事業を、広汎な府有施設へ効果的に展開（民間資金活用型ESCO事業）し、さらに大阪府内の市町村や民間へも普及啓発・促進していくため、その具体的な推進方法を定めるもので、今般、前プランの計画期間（2015（平成27）年度～2024（令和6）年度）満了に伴い改定されたものである。

### ESCO事業のスキーム

民間資金活用型ESCO事業とは、既存庁舎等を民間の資金とノウハウで省エネルギー化改修し、省エネルギー化による光熱水費の削減分で改修工事に係る経費等を償還し、残余を本府とESCO事業者の利益とする事業である。

民間資金活用で初期投資が不要であることに加え、光熱水費削減の枠内で改修費用を賄うため、実質的な後年度負担増もなく、

- ① 省エネルギー化により光熱水費が削減
- ② CO<sub>2</sub>排出量削減で地球温暖化対策に有効
- ③ 省エネルギーリニューアブル事業の創出

という一石三鳥の効果があり、以下の府主要施策にも位置付けられている。

- 「大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」  
（計画期間：2021年度～2030年度）
- 「ふちよう温室効果ガス削減アクションプラン  
（大阪府地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」  
（計画期間：2021年度～2030年度）
- 「おおさかヒートアイランド対策推進計画」  
（計画期間：2015年度から2025年度）
- 「大阪府ファシリティマネジメント基本方針」  
（計画期間：2016年度から2025年度）
- 「第2期大阪府まち・ひと・しごと創生総合戦略」  
（計画期間：2020年度から2024年度）
- 「住まうビジョン・大阪」  
（計画期間：2021年度～2030年度）

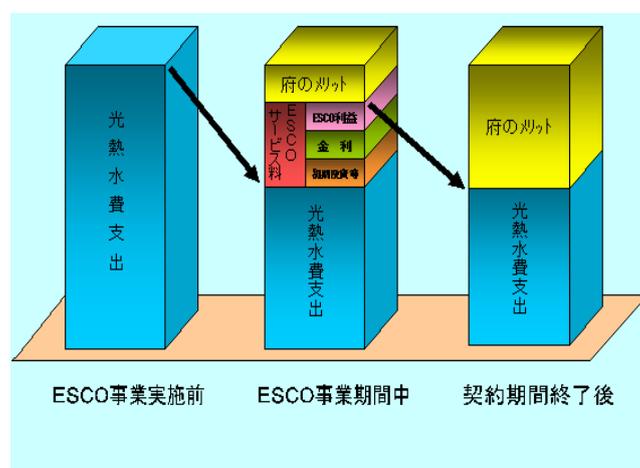


図-1 ESCO事業スキーム



図-2 ESCO事業の実施効果

## 【2】E S C Oアクションプランの達成状況とプラン改定の経緯

### （1）大阪府E S C Oアクションプランの達成状況と前回のプラン改定の経緯

「大阪府E S C Oアクションプラン」（以下「第1期計画」という。）は平成16年7月の策定から10年が経過し、計画期間が満了した。

E S C O導入効果として、導入施設（平成26年度までの契約分）33施設【目標は32施設】において、光熱水費削減額約51億円（約6.3億円/年【目標値は5.3億円/年】）、省エネ率平均（総量平均を言う。以下同じ）約23%、CO<sub>2</sub>排出削減量約128,000トン（約14,000トン/年【目標値は6,000トン/年】）を達成した（平成25年度末時点）。

また、その間には、

- ① L E D照明、空調の高効率化などの省エネ技術革新
- ② 住宅・建築物部門のエネルギー需要増大や原発事故後の節電取組み、エネルギー単価の上昇
- ③ 策定当時は築年数が浅かった施設や、E S C O導入済であるものの設備機器が更新されなかった施設での設備機器の経年劣化
- ④ 設備更新型E S C Oが国土交通省のE S C O導入マニュアルに位置づけられた

等の状況変化があり、第1期計画で対象外としていた施設や当時の省エネ技術では事業化がやや困難とされていた施設等でも事業化の可能性が出てきたため、第1期計画を再構築する必要性が生じた。

このため、最新省エネ技術など新たな知見に基づき、設備利用の実態調査や新たな省エネ手法の検討などE S C O導入の可能性を再検証し、第1期計画を改定したものである。

### （2）新・大阪府E S C Oアクションプランの達成状況と今回のプラン改定の経緯

#### ① 新・大阪府E S C Oアクションプランの達成状況

「新・大阪府E S C Oアクションプラン」（以下「第2期計画」という。）は策定から10年が経過し、計画期間（2015（平成27）年度～2024（令和6）年度）が満了した。

目標としていた82施設を上回る85施設で導入を達成した（令和6年度末：表-1）。

計画期間における導入効果は、光熱水費削減額約71.9億円【目標値は60億円】、省エネ率平均約29.5%【目標値は15%】、CO<sub>2</sub>排出削減量約16,200トン/年【目標値は8,700トン/年】、エネルギー削減量（原油換算）8,800キロリットル/年【目標値は4,700キロリットル/年】にのぼっている（令和5年度末時点）。

【参考：これまで（平成13年度～）のE S C O事業の累計実績】

- 事業化施設：延べ116施設（令和6年度までにE S C Oサービス開始した施設数）
- 省エネ効果（令和5年度末実績）
  - ・光熱水費削減額：累計123億円（6.7億円/年）
  - ・平均省エネ率：29.0%
  - ・CO<sub>2</sub>排出削減量：累計287,600トン
  - ・エネルギー削減量（原油換算）：累計133,000キロリットル

表-1 ESCO事業導入済施設（第2期計画）※1

ESCO サービス 開始年度	施設名	竣工年	延べ面積 (㎡)	省エネ率 (%)
平成27年度	りんくうタウン駅ビル	1996	15,320	31.2
平成27年度	中央図書館	1995	30,770	42.9
平成28年度	東警察署外7件(8)	1982～1997	43,034	35.1
平成28年度	泉北府民センタービル	1974	7,314	18.3
平成29年度	北野高等学校外7件(8)	1987～1999	113,213	20.9
平成29年度	中河内救命救急センター	1997	3,449	25.1
平成29年度	東成警察署外4件(5)	1981～1991	17,346	41.2
平成29年度	三島府民センタービル外1件(2) ※2	1972	14,966	35.8
平成30年度	天王寺高等学校外7件(8)	1985～1996	119,981	16.3
平成30年度	狭山池博物館	1999	4,948	43.2
平成30年度	都島警察署外4件(5)	1985～2000	21,846	50.9
平成30年度	泉南府民センタービル ※2	1971	7,783	33.4
令和元年度	四條畷高等学校外5件(6)	1985～2000	97,996	17.6
令和元年度	天王寺警察署外4件(5)	1975～2002	20,404	48.2
令和元年度	服部緑地外2件(3)	-	-	24.4
令和2年度	近つ飛鳥博物館	1994	5,925	26.9
令和2年度	国際会議場	1999	67,546	33.7
令和2年度	大淀警察署外4件(5)	1984～1989	14,317	41.1
令和2年度	浜寺公園外4件(5)	-	-	22.8
令和3年度	咲洲庁舎	1995	149,323	21.8
令和3年度	山田池公園外7件(8)	-	-	22.4
令和4年度	本庁舎別館	1964	29,499	11.7
令和4年度	教育センター ※2	1993	18,830	40.9
令和5年度	警察本部本庁舎	2002	118,200	11.9
令和6年度	新別館（北館・南館）	1997/1995	46,846	9.1
令和6年度	なにわ北府税事務所外3件(4)	1968～1973	14,725	17.7

※1 計画期間（平成27～令和6年度）にESCOサービス開始した施設

※2 設備更新型ESCO事業

※3 ( )は2以上の場合の施設数を示す

以上のとおり、いずれも目標を上回っており、第1期計画にも増して大きな成果を挙げることができた。この主な要因としては、

- ・ 省エネ見込率が高く規模の大きな施設を中心として、順次ESCO事業の導入を図れたこと
- ・ 複数施設をまとめて公募し事業規模を確保することによる、対象施設の拡大
- ・ 民間資金活用型ESCOでは熱源機器の更新が費用面で難しい施設における、設備更新型ESCOの導入

といった観点から事業を実施できたことが挙げられ、第2期計画における推進方策を十分に反映してきた結果であることがうかがえる。

## ② 今回のプラン改定の経緯

これまで、平成13年度から20年以上の間に計画目標を上回る成果を達成できた一方で、府有施設においては、

- ・第2期計画策定時と比して、LED照明の普及に代表されるような大幅な省エネ技術革新は見込まれない状況下にあること
- ・ESCO事業の継続的な導入拡大により、未導入施設が大幅に減少していること  
(特に省エネ効果が見込みやすい大規模施設や設備稼働率の高い施設で多く導入済み)

等の理由から、今後もこれまでと同程度にESCO事業の導入効果、拡大を見込むことは難しい状況にある。

一方で、ESCO事業未導入の中小規模施設などでは設備改修需要は残っており、事業性を確保しながら更なる導入拡大を図ることが可能かについては、これからも検討していくことが必要である。

同時に、この間には、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、建築物の省エネルギー性能の向上による地球温暖化防止やヒートアイランド現象抑制といった環境負荷の低減は、より一層重要な課題となっている。

加えて、誰一人取り残さない持続可能な世界の実現というSDGs(Sustainable Development Goals)達成への貢献など社会情勢の変化への柔軟な対応が求められおり、CO<sub>2</sub>削減や省エネルギーに寄与するESCO事業の普及についても、引き続き必要と考えられる。

こうした状況を勘案して、今後も継続してESCO事業を推進し導入拡大していくため、第2期計画を改定することとする。

### 【3】新プラン「(仮称)第3期大阪府ESCOアクションプラン」の策定

#### (1) 新プランのポイント

本プラン策定に当たっては、学識経験者で構成する「大阪府ESCO提案審査会」の場を活用して、審議の結果、以下のポイントで策定を進めることとした。

#### 【主な検討ポイント】

##### ① 設備更新需要のある中小規模施設等における、対象施設の拡大手法の検討

⇒前プランと同様にESCO導入の可能性が高いとは言えない延床面積が6,000㎡未満の中小規模施設等においても事業性を確保して導入する手法を検討する。

##### ② ESCOの活用によるLED照明への更新の加速化を検討

⇒2027年に予定されている蛍光灯ランプの製造・輸出入の廃止を見据えて、ESCOの活用が可能な施設における蛍光灯からLED照明への更新の加速化を検討する。

##### ③ 民間資金活用型ESCOでは熱源機器の更新が難しい場合も省エネに配慮した改修が可能となるよう、設備更新型ESCO事業を活用した事業化を検討(第2期計画からの継続)

⇒空調等の設備機器の老朽化が進み、更新時期を迎えている施設は年数の経過とともに出てくるものの、更新するには多額の費用が必要となり省エネルギー化による光熱水費削減分で改修費用を賄

う従来の民間資金活用型E S C O手法では、事業採算性の確保が難しい。

そこで、老朽化した設備機器の改修とE S C O事業を一体的に発注する「設備更新型E S C O事業」の手法等を活用し、E S C O契約が満了した施設のさらなる省エネルギー化を検討する。

**【設備更新型E S C O事業とは】**

省エネルギー化による光熱水費の削減額に機器の更新費用を別途加算し、その範囲内で工事費を償還する「設備更新型E S C O事業」が国土交通省大臣官房官庁営繕部の「官庁施設におけるE S C O事業導入・実施マニュアル」に位置付けられている。

熱源機器の老朽化で更新時期を迎えている施設では、通常の改修工事より実質負担額が低減できることから（図-3）、まずは府民センター等E S C O実施済施設を対象とした再E S C Oの手法として「設備更新型E S C O事業」の導入検討を図り、これをモデルとしたE S C O事業の効果的な推進を目指す。

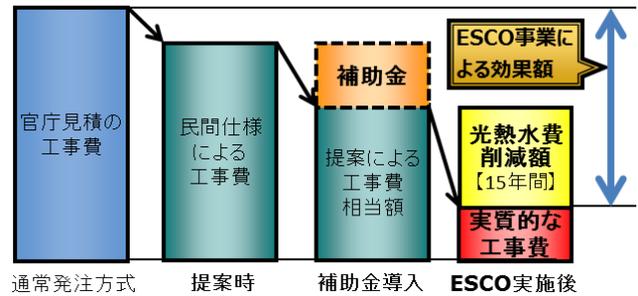


図-3：設備更新型E S C O事業の導入効果

**【参考：前プラン期間における設備更新型E S C O事業の実績】**

表-2

契約年度	施設名	省エネ率 (%)
平成28年度	三島・南河内府民センタービル (2)	35.8
平成29年度	泉南府民センタービル	33.4
令和3年度	教育センター	40.9

※( )は2以上の場合の施設数を示す

**④ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けたE S C O事業の活用検討**

⇒2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、公共建築物における率先した取組が求められていることから、中長期的な視点も含めたE S C O事業の活用について検討する。

**(2) 推進目標**

**①【計画期間】 2025（令和7）年度～2034（令和16）年度（10年間）**

本プランにおける取組み期間は、前プランにおける事業化の達成実績等を踏まえ、10年間とする。

**②【E S C O事業導入目標施設数】 60施設 暫定値**

E S C O事業導入目標施設数は、施設条件（E S C O未導入施設を主として、建物の残存耐用年数や光熱水費、施設所管部局における需要等から勘案）の他、(1)の主な検討ポイントを踏まえ、LED照明への更新を控える施設を中心に、複数施設をまとめて公募する等の手法を用いることで事業性を確保しつつ、60施設への導入を目標とする。

また、今後、省エネルギー技術開発の進展があった場合等においては、さらなる上積みについても検討していく。

### ③【省エネ目標】

暫定値

- ・ 平均省エネ率\*：10%（\*省エネ率は各年度における総量平均）
- ・ 光熱水費削減額：今後10年でさらに35億円の効果額を見込む
- ・ エネルギー削減量：原油換算で今後10年の累計で48,000キロリットル
- ・ 二酸化炭素排出削減総量：今後10年の累計で89,000トン



上記の推進目標は、E S C O導入済施設\*に加え、本プランの目標となる60施設の全てにE S C O事業を導入した場合の計画期間における実施効果の試算に基づき、上記のとおり設定するものとし、これまでの本府E S C O事業の効果から更に上積みを目指すものである。

(※導入済施設でE S C Oサービス開始後15年が経過するまでの間は、累積して効果を見込めるものとして試算)

#### 【大阪府E S C OアクションプランとSDGsの関係】

大阪府は、全庁一丸となってSDGsの推進を図り、SDGs先進都市を目指している。

本取組みは、SDGsに掲げる17のゴールのうち以下のゴールの達成に寄与するものである。



### (3) 推進方策

(2) 推進目標の達成に向けて、第2期計画からの取組を継承しつつ、次の方策によりE S C O事業を推進していく。

#### ①事業採算性の比較的低い中小規模施設であっても、学校等の同種建物を中心に、さらに他用途施設であっても可能な場合は、複数施設一括して事業規模を確保しながら事業を実施

これまで、まずは大規模施設や設備稼働率の高い施設で多くE S C O事業を導入してきた。

次に、第2期計画では、施設単独では事業化が困難な中小規模施設においても一部、同種建物は複数をもとめて公募することで事業化を図ることができた。

中小規模施設をまとめることで事業規模の確保につながる一方で、民間事業者からは、施設所在地等の観点から配置技術者の確保が困難となったり、総事業費に比して管理工数が多くなる等のデメリットも指摘されており、事業化に向けてはより慎重な対応が求められている。

そこで、本プランでは、複数の用途が異なる施設であっても設備更新時期、対象設備の種類や所在地等を勘案して可能な場合には、一括して事業性を確保しながらより多くの施設での導入を図る。

#### ②民間資金活用型E S C Oの活用による、蛍光灯ランプを使用している施設におけるLED照明への更新

前プランの期間において、民間資金活用型E S C O事業の導入により、相当数の施設で照明のLED化を実施してきた。

この経験を活かして、各施設に蛍光灯の利用状況調査を行った上で、蛍光灯ランプを使用している施設の実態と更新需要量を把握し、2027年に控える蛍光灯ランプの製造・輸出入の廃止を見据えて、E S C O事業を活用したLED照明への更新を加速させる。

また、2027 年以降は徐々に蛍光灯ランプの在庫についても入手が困難になることが予想されることから、今後、概ね5年以内で取り組む。

### ③民間資金活用型E S C Oでは事業化が困難な施設等における、設備更新型E S C Oによる手法等を活用した取組の継続

老朽化した設備機器の改修とE S C O事業を一体的に発注する「設備更新型E S C O事業」は、第2期計画の推進方策として位置付けられ、府民センタービルと教育センターの計4施設において採用した実績がある。

現在、本府では『大阪府ファシリティマネジメント基本方針』（大阪府公共施設等総合管理計画）に基づき、施設の長寿命化を推進、施設維持管理にて予防保全型の修繕を進めているところであるが、これらの目的と建築物の省エネルギー化及びカーボンニュートラルの推進を兼ね備えることができる手法である「設備更新型E S C O事業」の更なる活用を検討していく必要がある。

そこで、施設管理者と調整を図り可能な施設においては、予備調査会\*等も積極的に活用しながら、設備更新型E S C Oの手法による事業化に取り組む。

#### 【予備調査会】

予備調査会とは、E S C O事業の導入を検討している施設において、事業として成立するかどうかの判断を行うため、民間事業者（E S C O事業者等）から希望をつのり、最新の光熱水費データや機器リスト等を提示したうえで現地調査を実施、アンケート形式で意見を求めるものである。事業としての成立性だけでなく、公募における要望（補助金の活用や施工条件等）を直接確認ことができ、公募条件の参考にもすることができる。

### ④2050年カーボンニュートラルの実現に向けたE S C O事業導入による貢献

2050年カーボンニュートラルの実現に寄与するべく、E S C O事業による初の試みとして、令和7年度には「大阪府西大阪治水事務所E S C O事業」においてZ E B基準（R e a d y相当）の水準を目指した設備改修を予定しており、計画期間中にノウハウを蓄積し、より大幅な省エネルギー化や先進的な取組の実現についても検討しながら本プランを進めていく。

また、既存施設で省エネルギー化を推進するほど、CO<sub>2</sub>排出量の削減に貢献できることから、これまでのE S C O事業の取組を継続することも非常に有効である。

なお、提案公募施設の最終的な決定は、施設所管課で構成する庁内連絡会議「府有建築物E S C O事業推進会議」の場において、承認を得るものとする。

E S C O事業の導入を効果的、継続的に実施していくためには、省エネ技術の最新動向や社会情勢等、E S C Oを取り巻く状況の変化を的確に把握して対応していく必要がある。

そこで、学識経験者で構成するE S C O提案審査会などの場も活用し、本プランの進捗管理を行い

ながら、P D C Aサイクルに基づく取組みのフォローアップを実施する。

#### (4) 府内市町村・民間へのE S C O普及促進

府内市町村に対しては、E S C O事業の進め方、公募資料、事業者選定の方法、契約方法等について随時、相談を受け付け、要望に応じて出前講座にも対応している他、「大阪府市町村E S C O会議」の開催等を通じ、積極的にE S C O事業の導入を働きかけた結果、第2期計画策定時（平成26年度末）の7市町26施設から増え続けており、これまでに24市町村567施設で事業化が実現した。（令和5年度末時点）

本府におけるE S C O導入事例は令和6年度までにE S C Oサービスを開始したもので延べ116施設に達するなど全国的にも類を見ない実績を誇っている。E S C O事業に係る様々なノウハウの蓄積を活かし、市町村や民間事業者を対象とした説明会の場なども活用しつつ、引き続き府内の市町村や民間にもE S C O事業の普及促進に努めていく。

#### (5) 大阪府E S C O提案審査会 委員一覧（敬称略・五十音順）

.....  
.....



都市整備部住宅建築局公共建築室設備課  
TEL：06-6941-0351（内線：4639） 令和7年 月発行
