

# 八尾市災害廃棄物処理計画の 策定事例について



令和2年(2020年)8月28日  
八尾市経済環境部資源循環課

# 内容

1. 八尾市の概況
2. 平成30年台風21号の対応
3. 災害廃棄物処理計画の策定

# 1. 八尾市の概況

**総人口** 265,765人  
**世帯数** 126,087世帯  
(R2.7.31現在)

## 特徴

- 中核市
- 河内音頭  
(世界記録)
- 中小企業が多い
- 歴史がある  
(古墳や古い街並み)



# 1. 八尾市の概況

## 八尾市のごみ処理体制

収集→家庭系ごみ 直営(約40台)

事業系ごみ 許可業者(28社)

処理→大阪広域環境施設組合八尾工場(焼却)

八尾市立リサイクルセンター(破碎、リサイクル)


八尾市立一般廃棄物最終処分場(埋立)

ごみ処理の流れは別紙参照



## 2. 平成30年台風21号の対応

平成30年9月4日に近畿地方に大きな被害をもたらした「非常に強い」台風

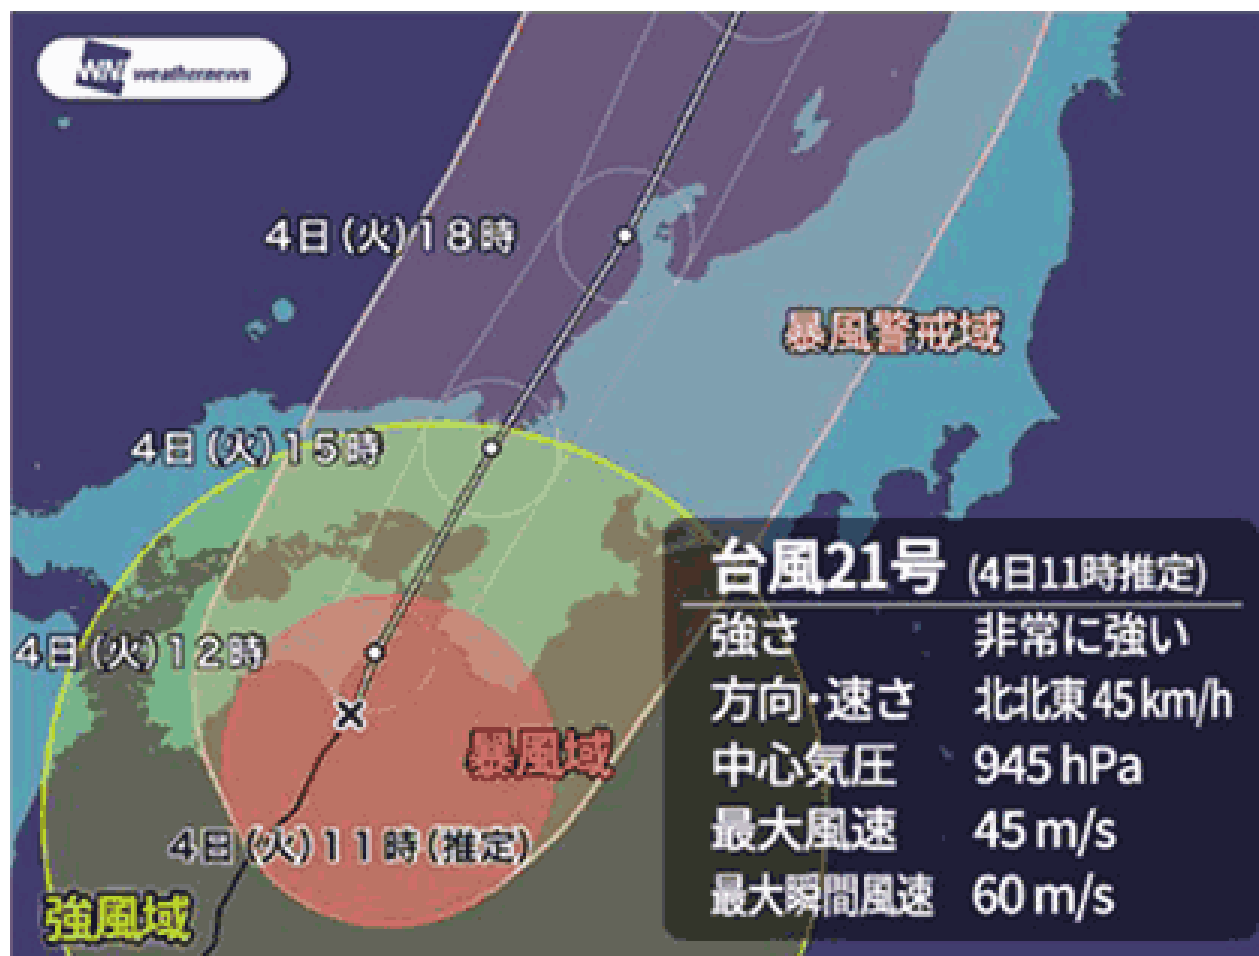

# 2. 平成30年台風21号の対応



| 人的被害 |     |     | 住家被害 |       |    |      | 停電     |
|------|-----|-----|------|-------|----|------|--------|
| 死者   | 軽傷者 | 重傷者 | 全壊   | 大規模半壊 | 半壊 | 一部半壊 |        |
| 0    | 10  | 1   | 0    | 0     | 6  | 419  | 約7,800 |
| 人    | 人   | 人   | 棟    | 棟     | 棟  | 棟    | 戸      |

## 2. 平成30年台風21号の対応

- ① ごみの内容を聞き取る。
- ② 通常収集で出せるくらいの量か確認する。  
通常収集で出せる場合は通常収集を促す。
- ③ 収集連絡票を使って、排出物、量、大きさ等、できるだけ詳しく聞き取る。
- ④ 内容の確認を行い、詳細は後日、市から連絡することを伝える。
- ⑤ 収集担当の環境事業課に収集連絡票を渡し引き継ぐ。

### 収集件数

|             |        |
|-------------|--------|
| 全体の収集件数     | 1,792件 |
| (内、9月の収集)   | 1,681件 |
| (内、休日収集)    | 753件   |
| 最初の1週間の電話件数 | 819件   |

### 収集した災害廃棄物量

|           |        |
|-----------|--------|
| 可燃物       | 945t   |
| 粗大ごみ・トタン等 | 400t   |
| 瓦・植木鉢     | 65t    |
| 合計        | 1,410t |

# 3. 災害廃棄物処理計画の策定

## 想定される災害



### 生駒断層帯地震

市東部は山麓地帯にあたるため、地盤がゆるみやすく、土砂災害が発生しやすい。

他にも南海トラフ地震を想定

### 大和川の氾濫

やお防災マップ





# 3. 災害廃棄物処理計画の策定

## 担当課・関係部署

**資源循環課**・・・計画の立案、策定担当

**環境事業課**・・・ごみ収集担当

**環境施設課**・・・処理施設管理運営担当  
し尿収集担当

主に3課で策定。他にも・・・

**環境施設課**・・・環境対策(大気、水質、土壌等)

**産業廃棄物指導課**・・・PCB廃棄物等の有害廃棄物

# 3. 災害廃棄物処理計画の策定

## 策定までのスケジュール

| 時期              | 内容  |
|-----------------|---|
| 令和元年8月22日       | 入札(条件付一般競争入札)<br>・H26からH30までに2件以上の災害廃棄物処理計画を策定していること 等<br>該当登録業者23社→5社の参加 |
| 令和元年8月～12月      | 計画案作成(入札までに素案は完成させていた)<br>担当課打ち合わせ<br>関係部署との調整                            |
| 令和2年1月20日～2月19日 | パブリックコメント<br>・提出人数2名、意見3件   |
| 令和2年3月          | 議会報告・策定・公開  |

# 3. 災害廃棄物処理計画の策定

## 調整事項(廃棄物関係部署以外)

- 災害廃棄物処理業務の役割分担
- 仮置場の選定
- 損壊家屋の解体・撤去
- 思い出の品等の取り扱い

# 3. 災害廃棄物処理計画の策定 まとめ・ポイント

- 素案は完成させておいた方が望ましい
- 関係部署との調整は念入りに
- 担当者同士の足並みはできるだけ揃える
- 最悪の被害状況を想定した計画に
- 適宜見直し、次代に引き継げる計画に

ご清聴ありがとうございました。

八尾市災害廃棄物処理計画の全容はこちら

