

八尾富田林線の工事説明会

藤井寺市道堺街道線以北の区間

【小山西地区】 令和7年1月15日(水)

【丹北小山地区】 令和7年1月16日(木)

大阪府富田林土木事務所

事業の概要

○事業の名称

都市計画道路 八尾富田林線

○事業の延長、幅員

- ・延長: 1.6km
- ・幅員: 25.0m～43.2m

○施行期間

平成30年7月5日
～令和9年3月31日

○事業の名称

都市計画道路 堺大和高田線

○事業の延長、幅員

- ・延長: 0.1km
- ・幅員: 16.0m

○施行期間

平成30年7月5日
～令和9年3月31日



藤井寺市津堂四丁目
(府道大阪羽曳野線)

都市計画道路 八尾富田林線

羽曳野市島泉九丁目
(府道堺大和高田線)

都市計画道路 堺大和高田線

事業の概要

【参考情報】



○事業の区間

八尾市老原九丁目
～ 藤井寺市津堂四丁目
・延長: 2.2km
・幅員: 16.7m～38.7m


○事業期間

平成29年11月22日
～ 令和9年3月31日

事業の概要



広域緊急交通路

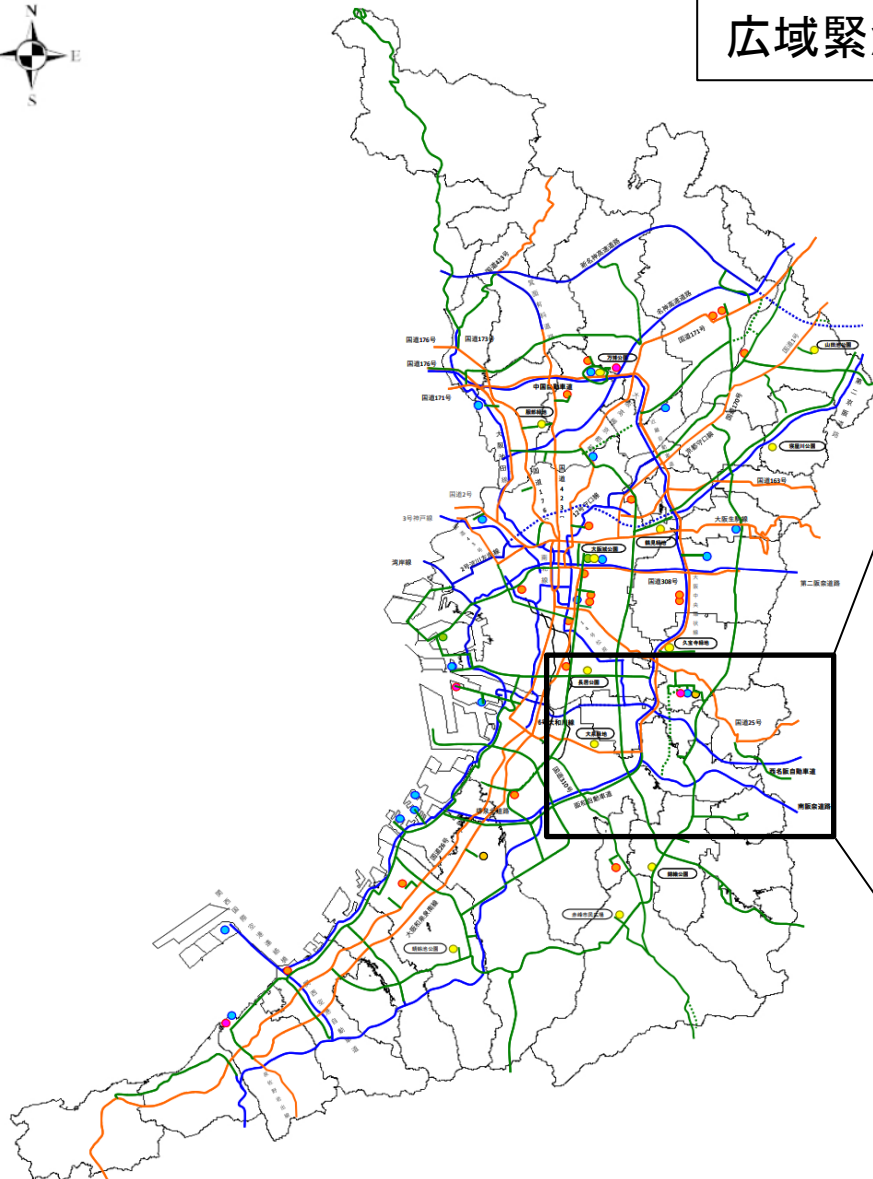


凡 例

広域 緊急交通路	緊急交通路	自動車専用道路	
		一般道路 重点14路線	
		一般道路 その他路線	
主要な 防災拠点	広域防災拠点		
	後方支援活動拠点		
	輸送基地		
	陸上自衛隊駐屯地		
	災害拠点病院		
	大阪府庁		


(注) 点線は、事業中路線を示す。

都市計画道路八尾富田林線

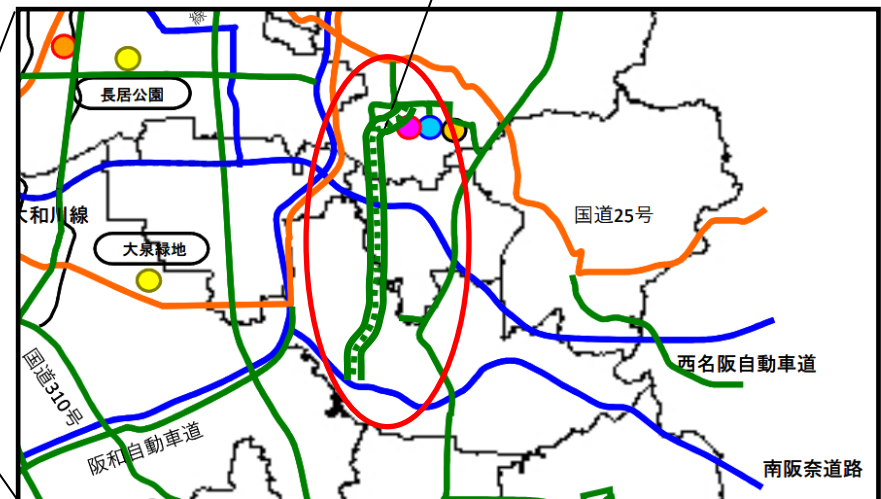

大阪府地域防災計画より

八尾富田林線(藤井寺工区) 全体図

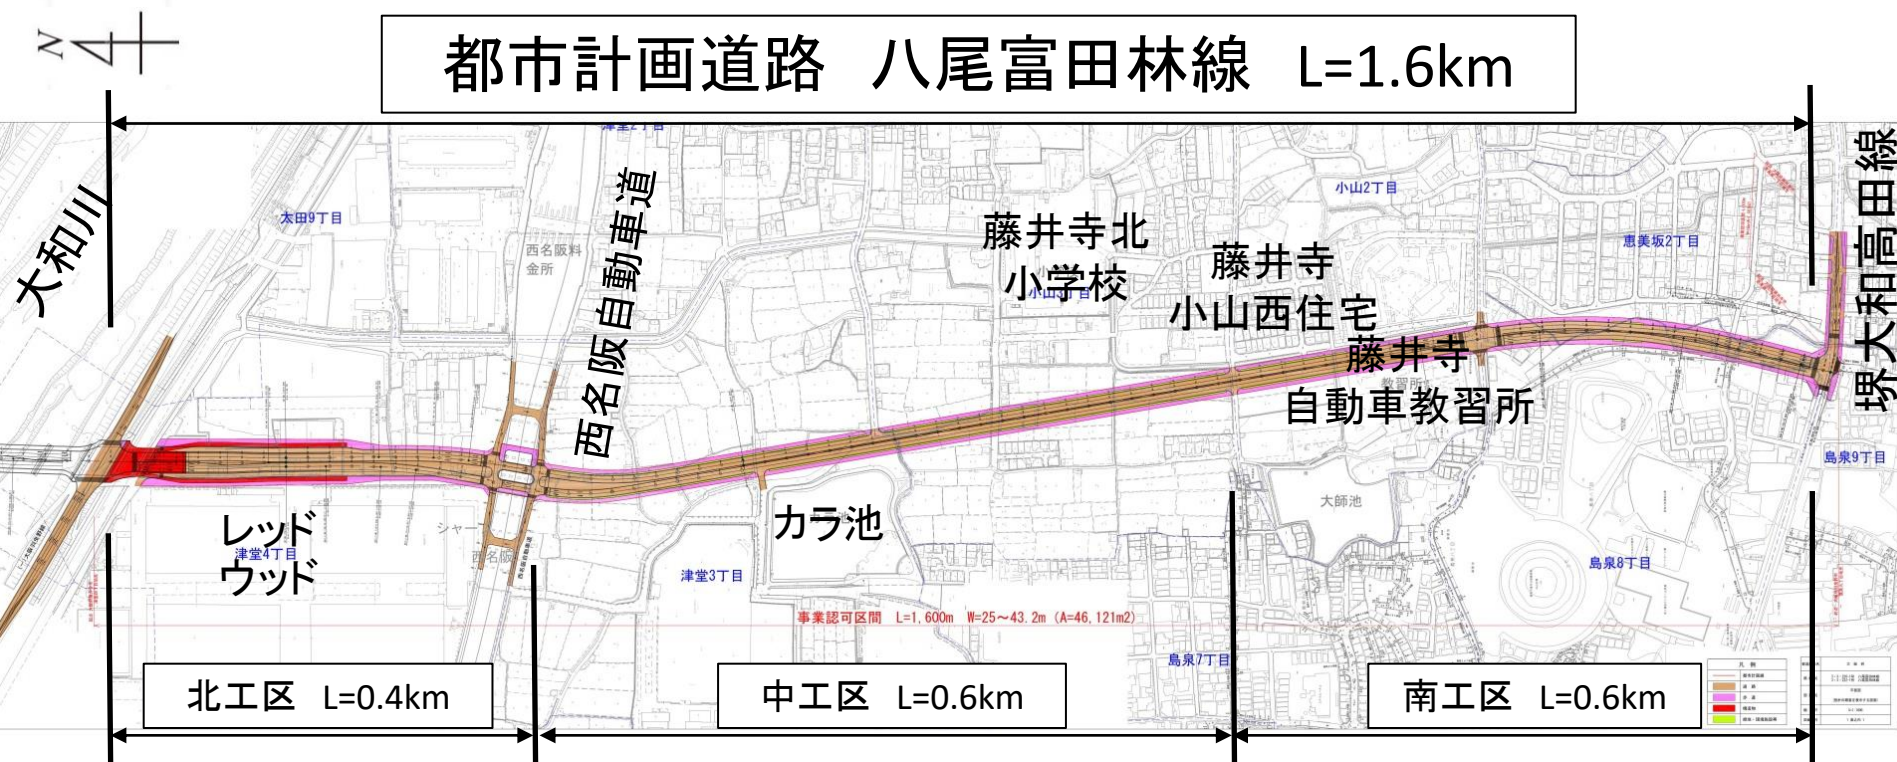


事業の概要

◇都市計画道路 八尾富田林線

- ・延長 : $L = 1.6\text{km}$
- ・幅員 : $W = 25.0 \sim 43.2\text{m}$
- ・道路規格 : 第4種 第1級
- ・設計速度 : 60km/h

◇八尾富田林線 ～標準横断図～

(単位:mm)

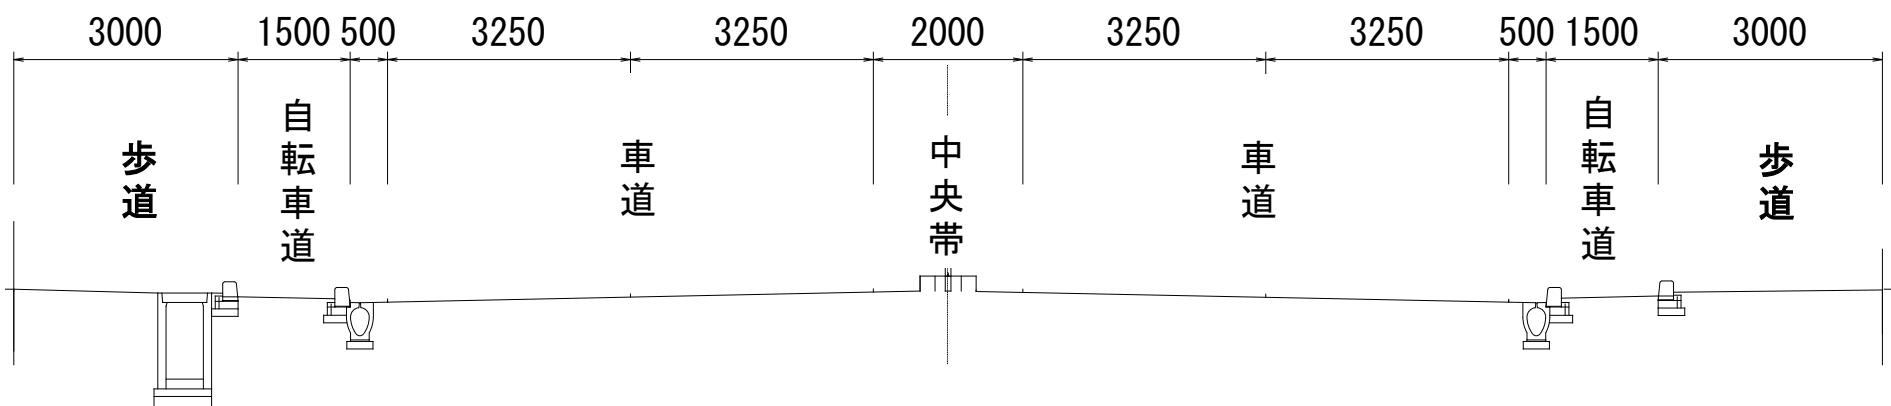

※今後の関係機関協議等により変更することがあります。


全体工程表

	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	備考
測量 調査・設計									現在		
境界立会											
用地買収 物件補償											
埋蔵文化 財調査											
道路築造・ 橋梁工事											

※予定の工程表であり変更になる場合があります。

今年度の事業内容

八尾富田林線(藤井寺工区) 全体図

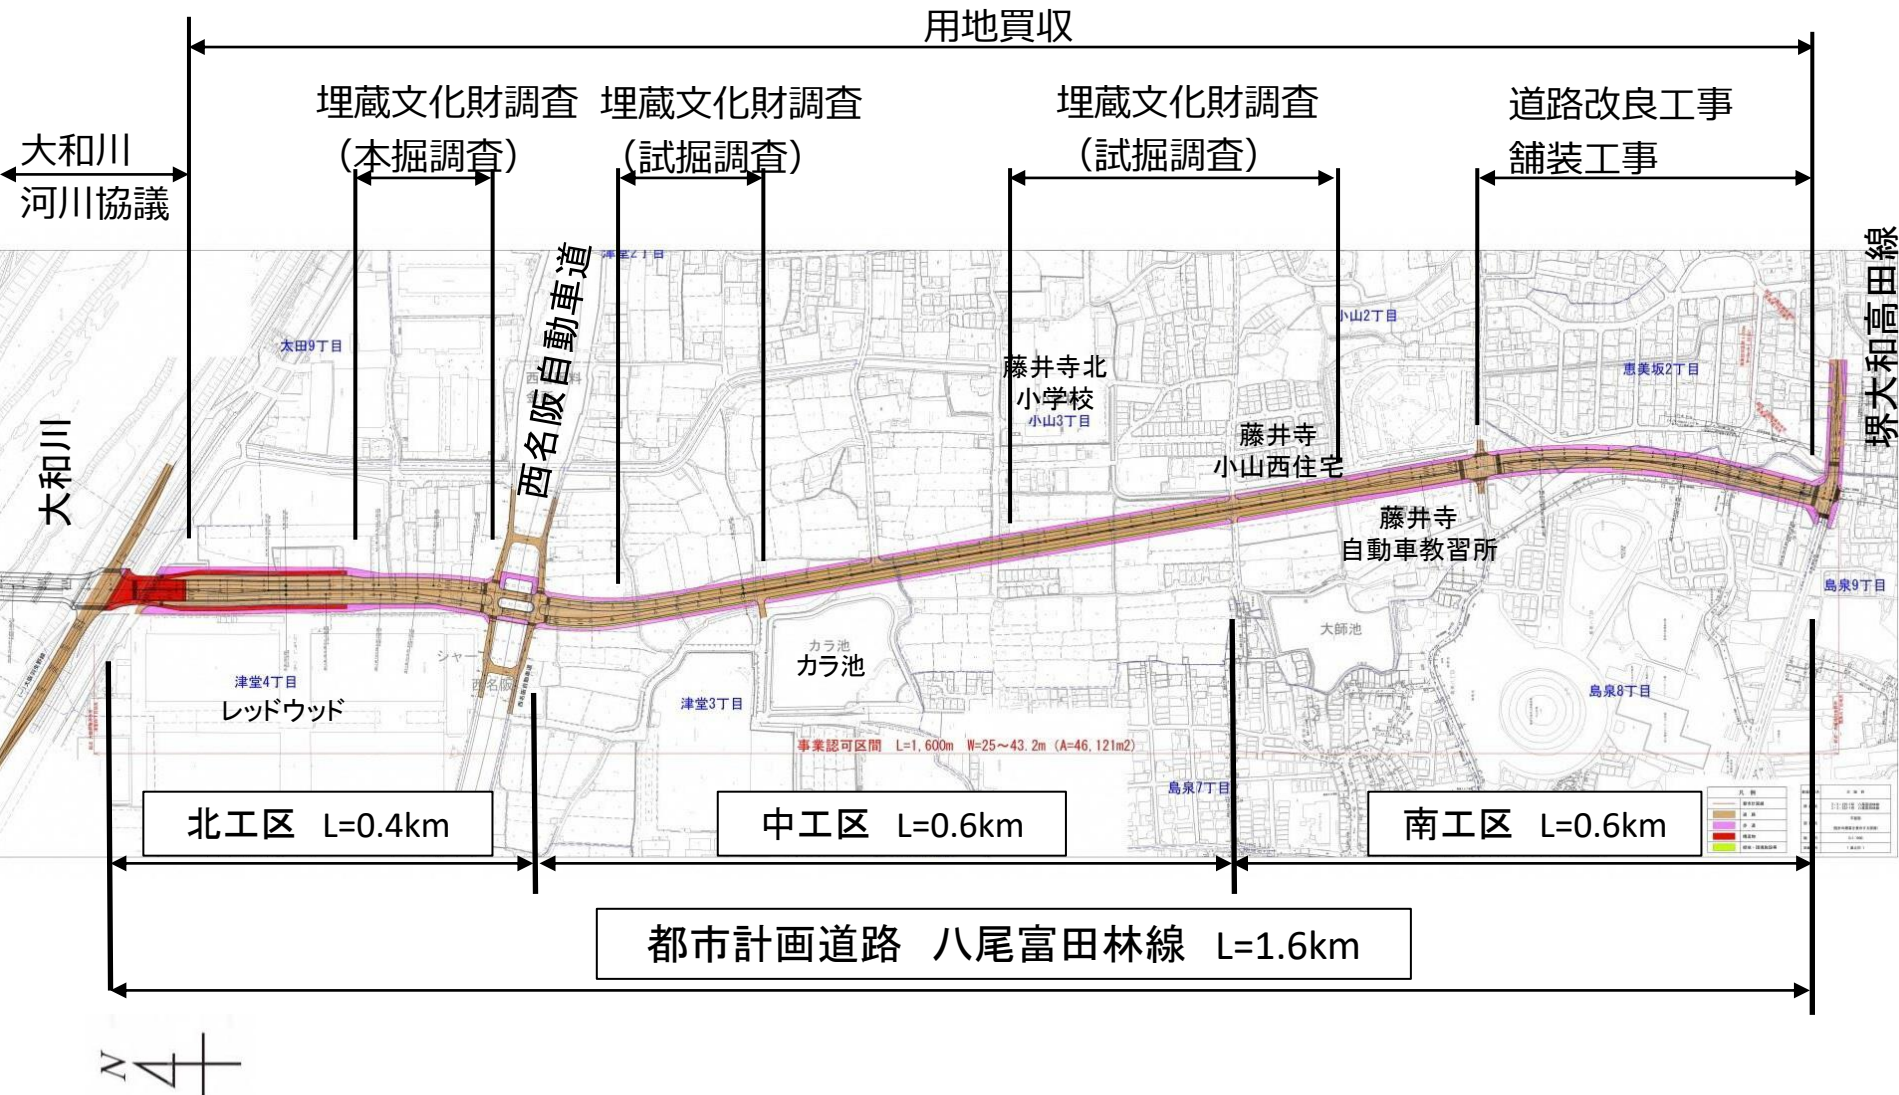

中工区

工程表

	H29	H30	R1 H31	R2 (H32)	R3 (H33)	R4 (H34)	R5 (H35)	R6 (H36)	R7 (H37)	R8 (H38)	備考
測量 調査・設計				(中工区)R2～ ■					現在		
境界確認 幅杭設置				(中工区)R2～ ■							
用地買収 物件補償						(中工区)R3～ ■					
埋蔵文化 財調査						(中工区)R4～ ■					
道路工事									(中地区)R7～ ■		

※予定の工程表であり変更になる場合があります。

交差点については現在交通管理者
(警察)との協議中

藤井寺
北小学校

府営藤井寺
小山西住宅

藤井寺
自動車教習所

交差点①

交差点②

交差点③

交差点①


交差点②

交差点③

※今後の協議等により変更になる場合があります。


位置図

市道堺街道線以北の区間

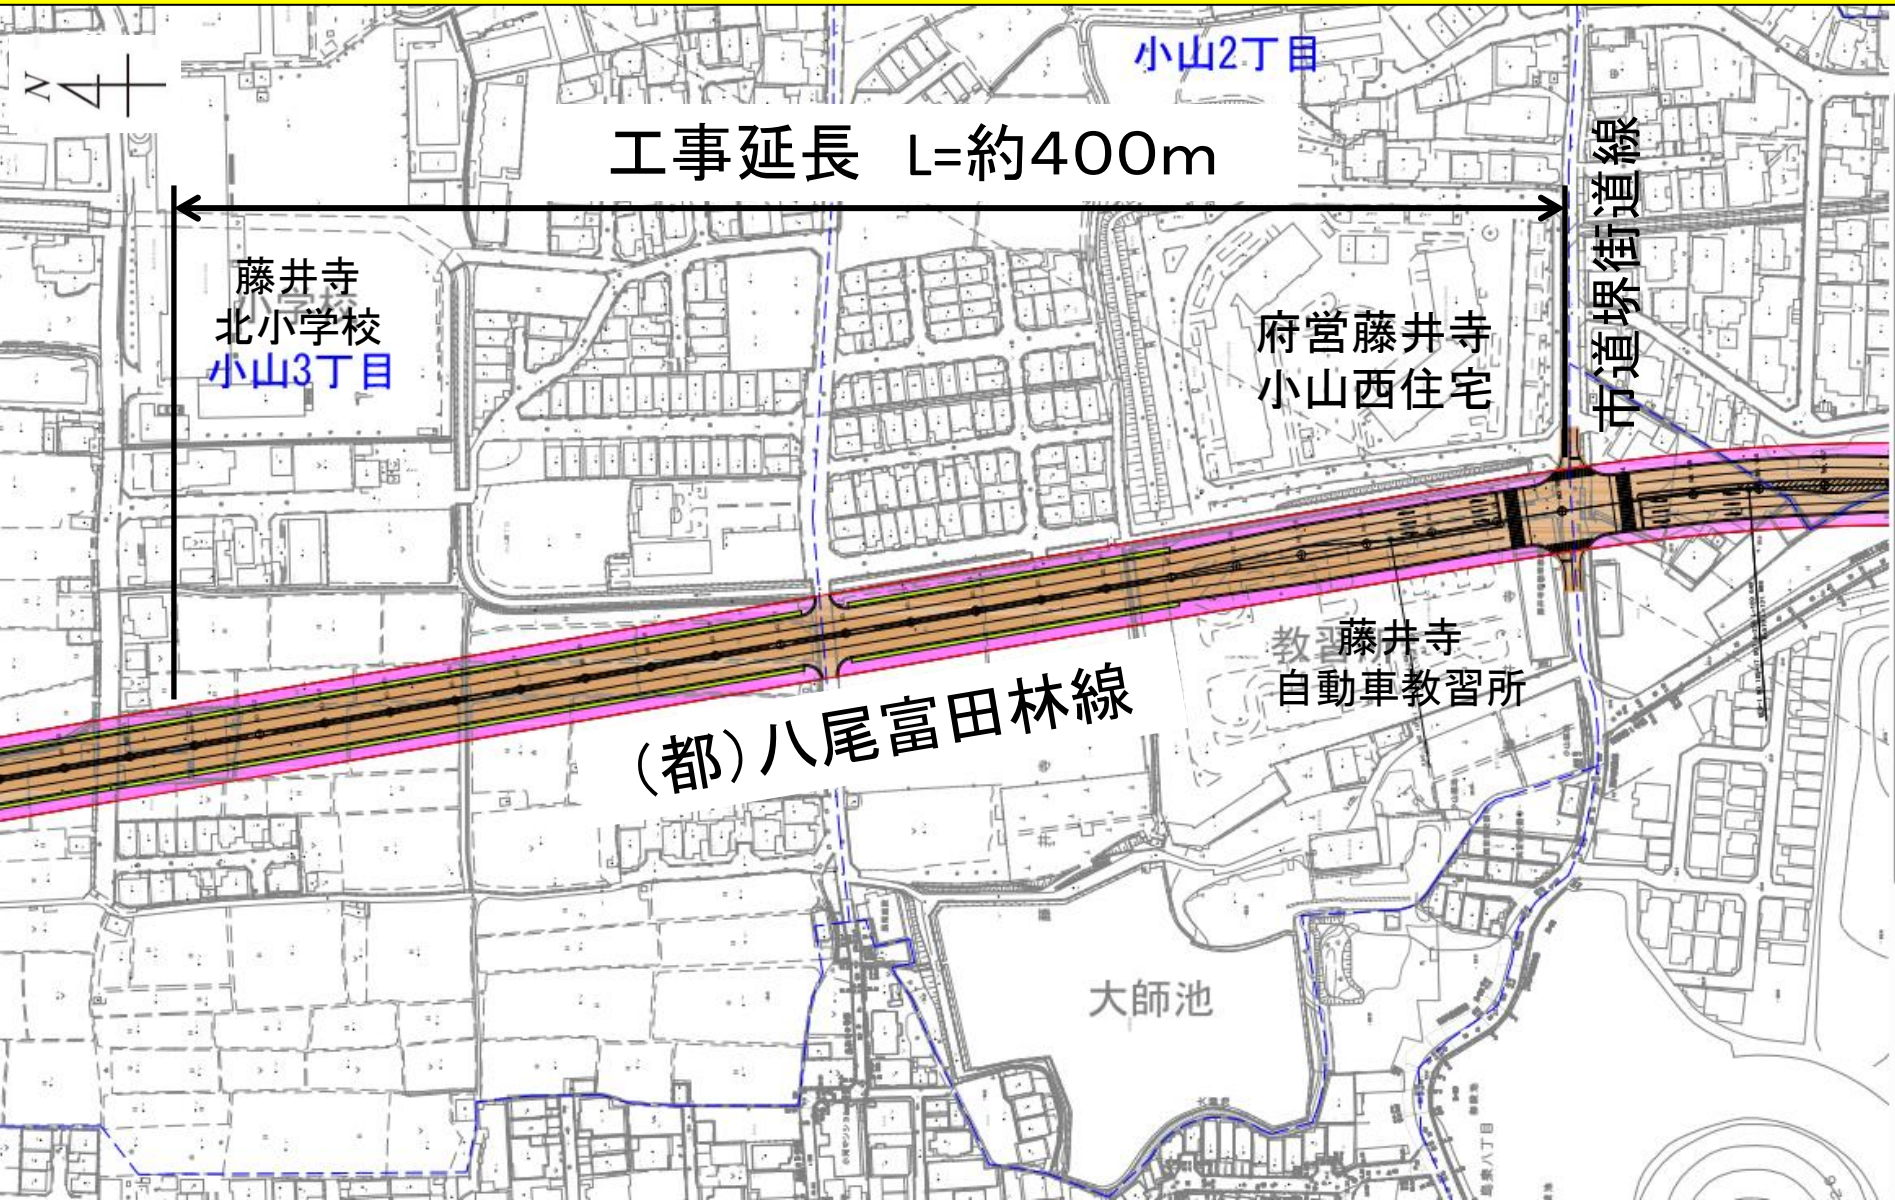

工事車両通行経路（計画）

工事延長 L=約400m

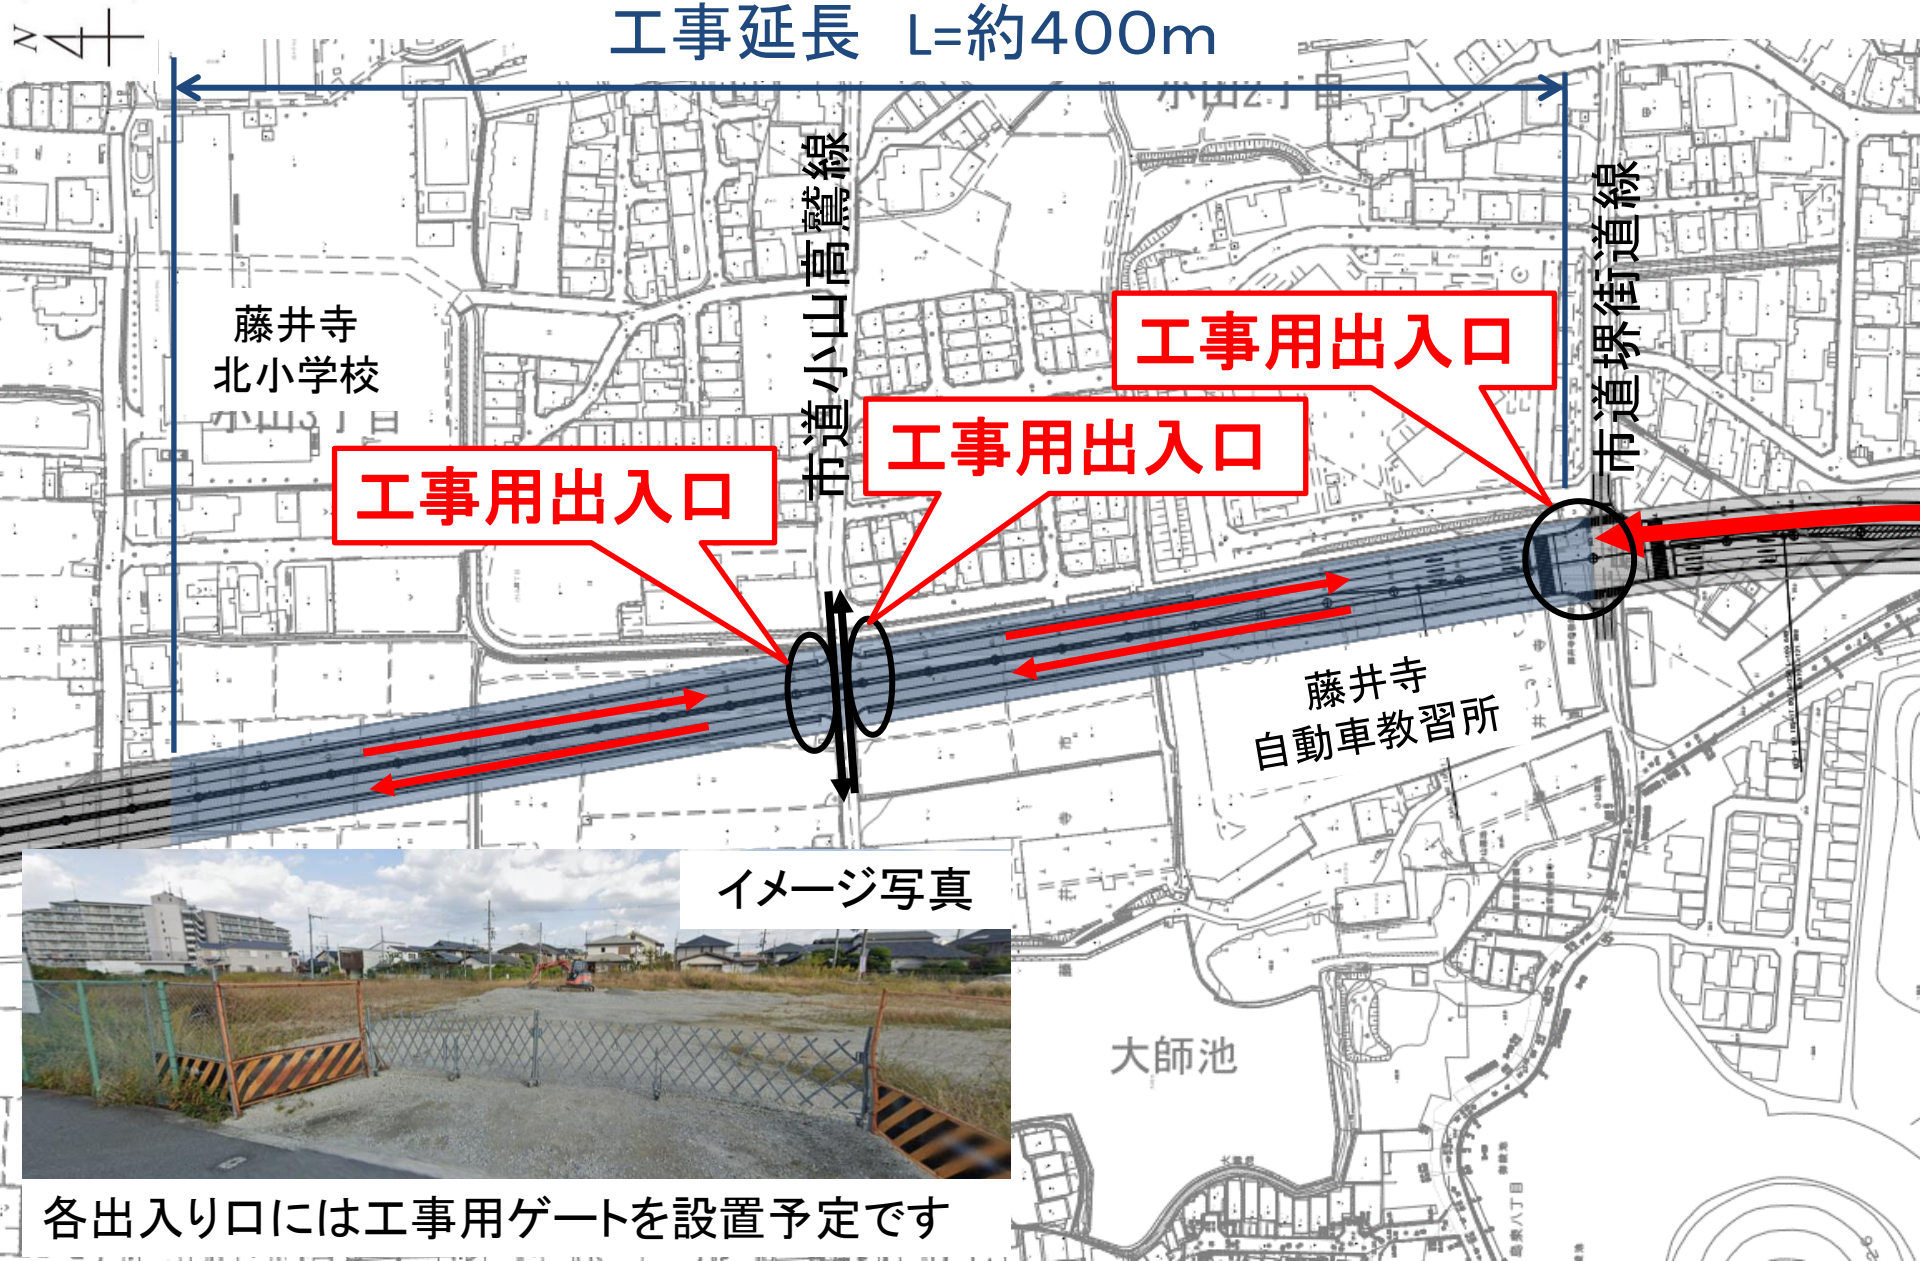

イメージ写真

各出入り口には工事用ゲートを設置予定です

埋蔵文化財調査について

◇試掘調査

掘削工




調査工



◇本掘調査

掘削工

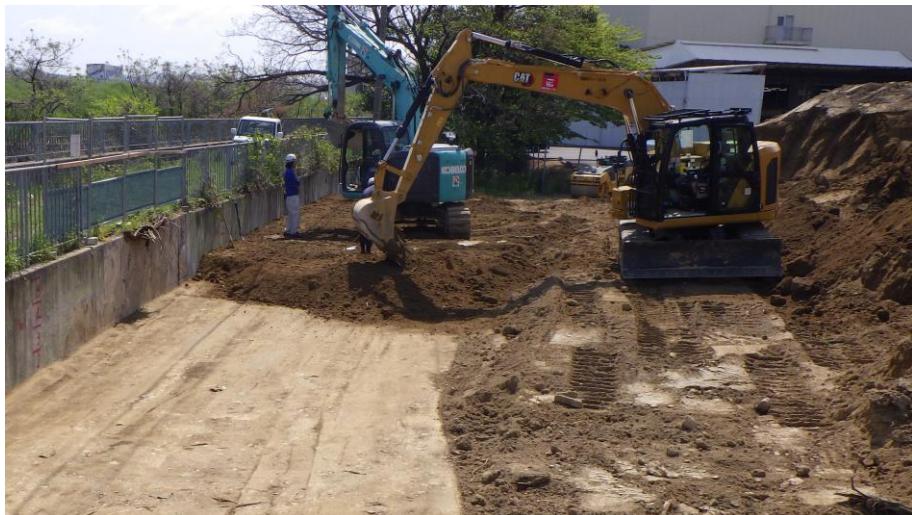


調査工



道路工事について

工事延長 L=約400m

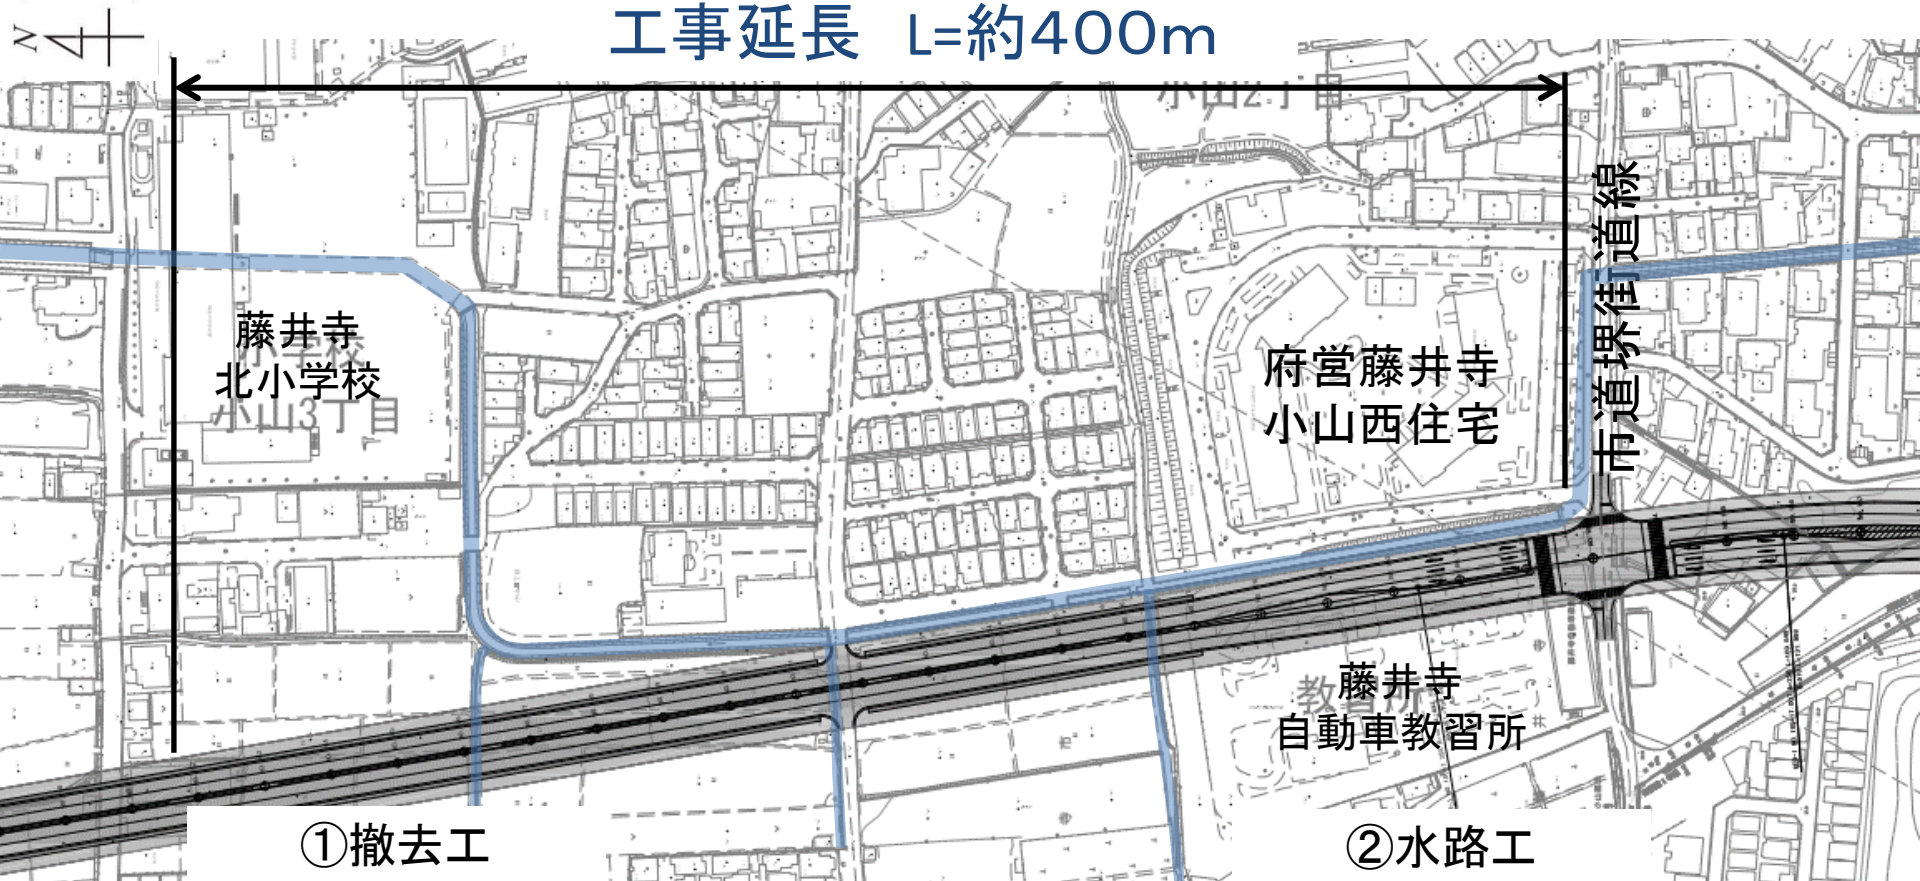


①撤去工

②水路工



道路工事について


工事延長 L=約400m

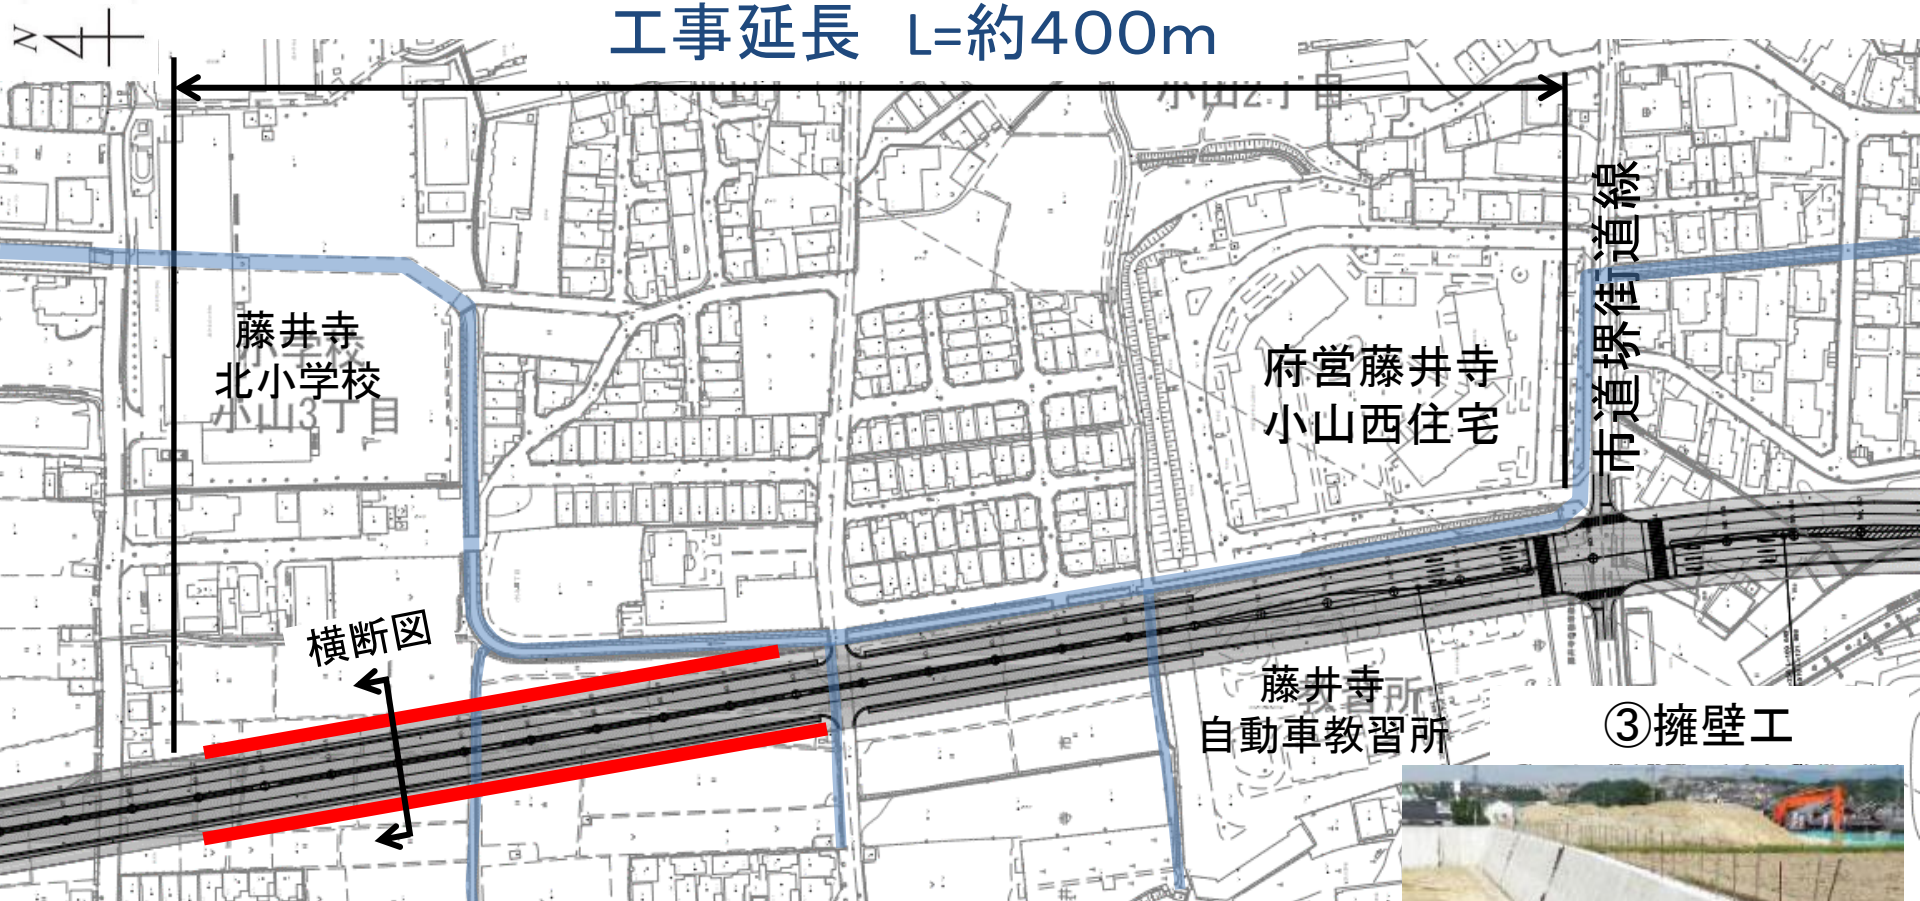






③擁壁工

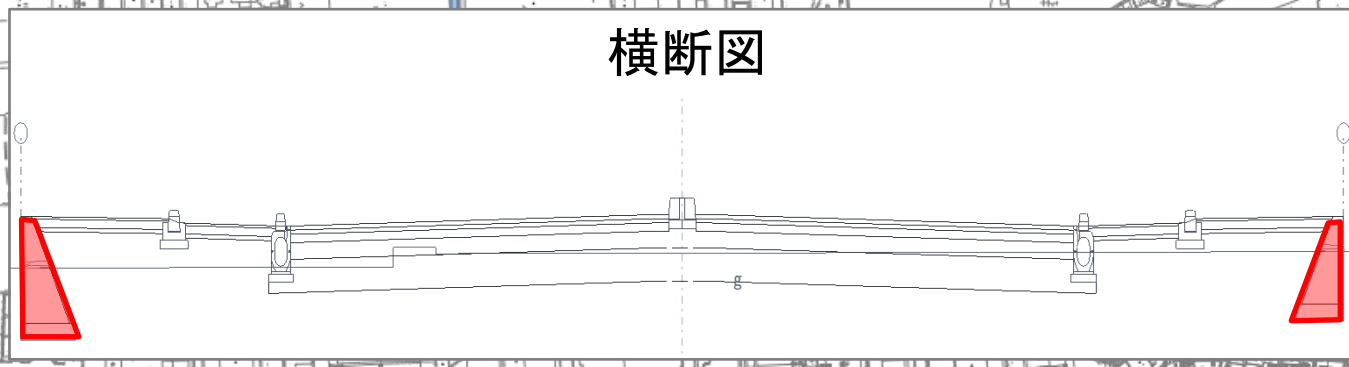

横断図



工 程 表

	R7年				R8年			
	4・5 ・6月	7・8 ・9月	10・11 ・12月	1・2 ・3月	4・5 ・6月	7・8 ・9月	10・11 ・12月	1・2 ・3月
埋蔵文化財 調査	試掘調査 		本掘調査 					
道路工事 (進入路工) (撤去工) (水路工) (構造物工)			準備工(進入路工・撤去工) 				※文化財調査完了後 に本体工事を実施 ↓ 本体工事 	
備考								

※予定の工程表であり変更になる場合があります。 16

工事中の対策について（環境対策【敷鉄板】）



※写真は施工例です


工事中の対策について（環境対策【騒音・振動調査】）

※道路端部で計測



その他の工区の工事状況について

藤井寺市道堺街道線～府道堺大和高田線

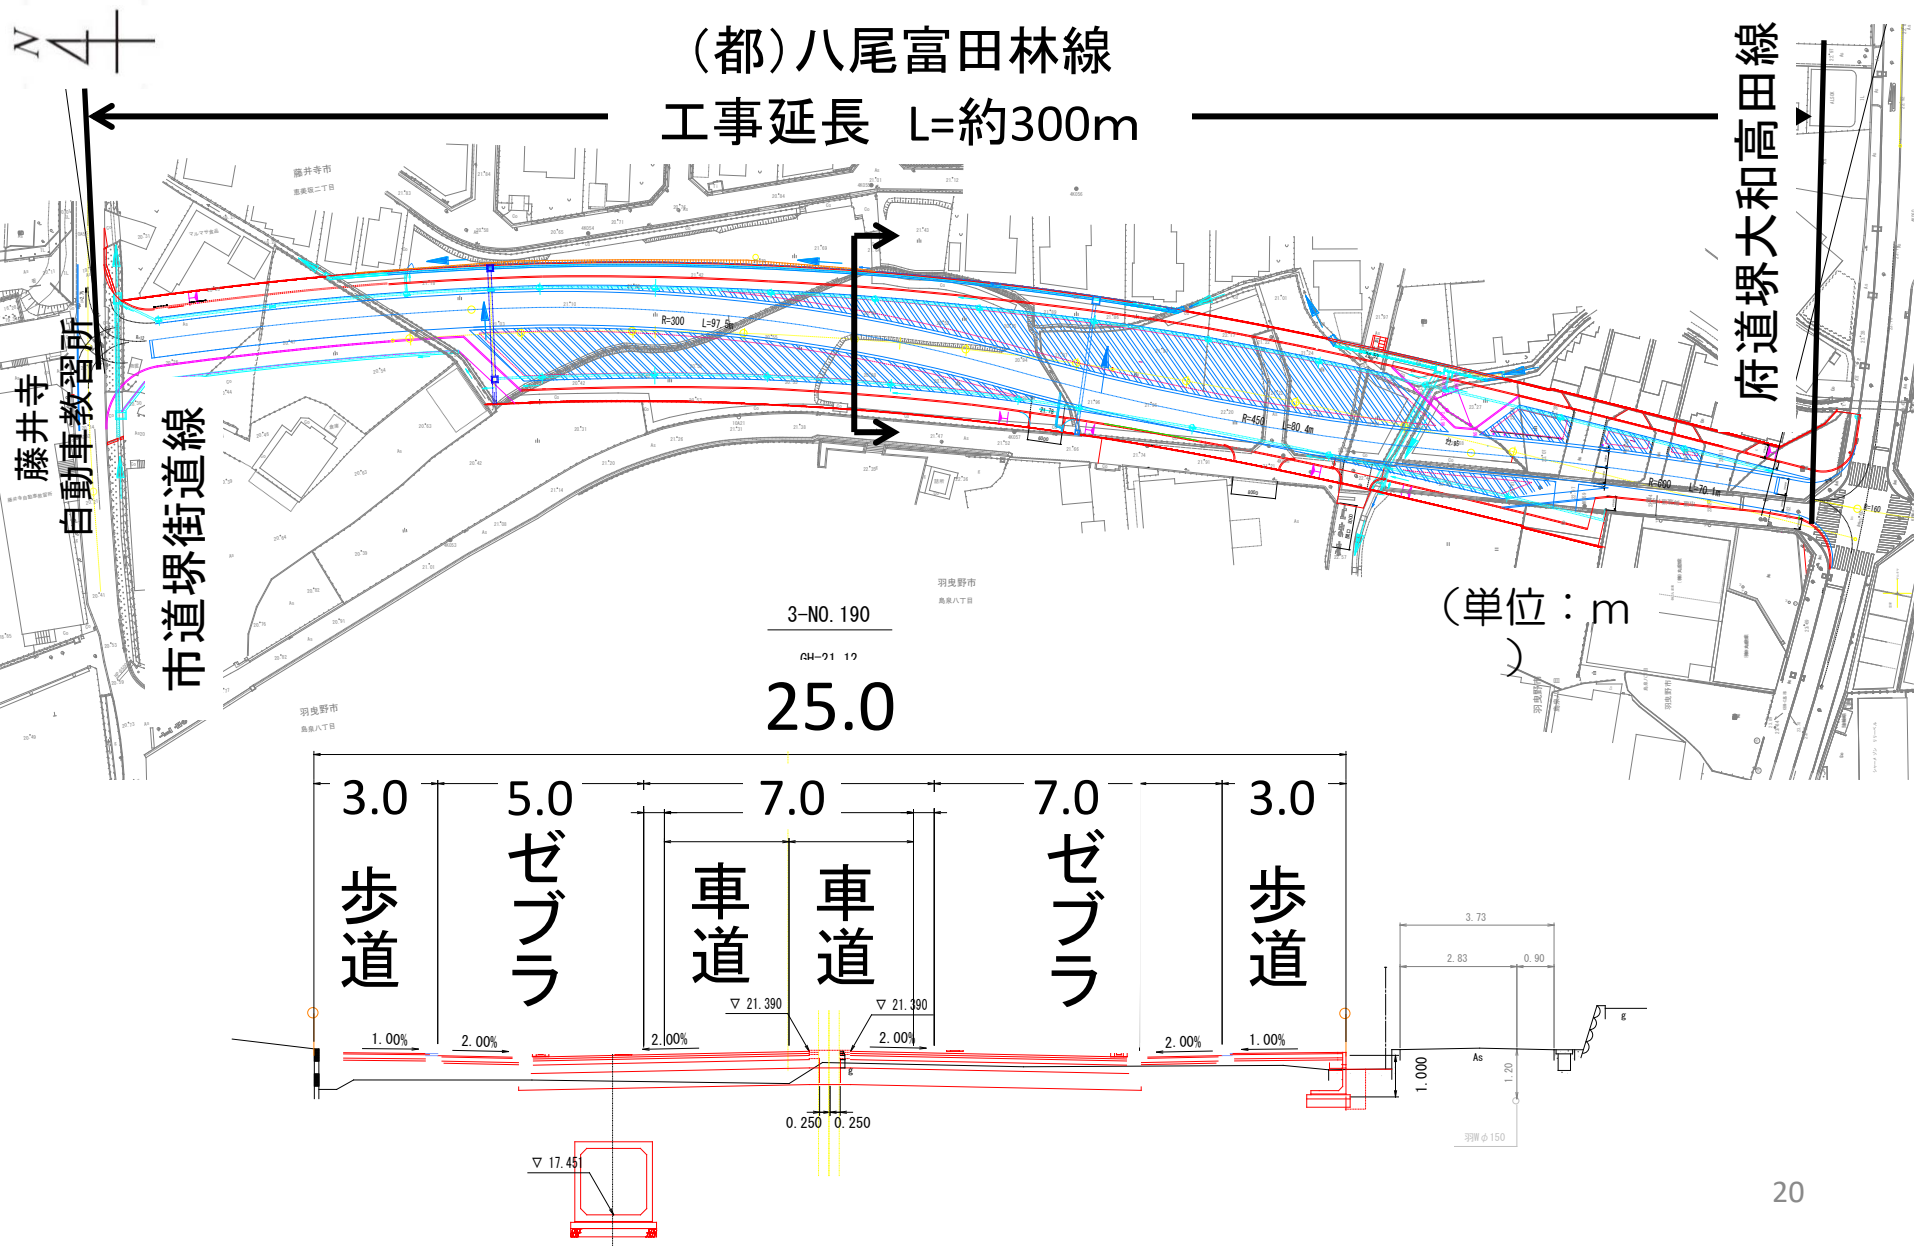

	R5年度				R6年度				R7年度			
	4・5・6 月	7・8・9 月	10・11・ 12月	1・2・3 月	4・5・6 月	7・8・9 月	10・11・ 12月	1・2・3 月	4・5・6 月	7・8・9 月	10・11・ 12月	1・2・3 月
道路 改良工事								現在				
舗装工事												
交通安全 施設工事												
備考												

おわり

ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

ご清聴ありがとうございました。
